# 平成26年度 敦賀市民間最終処分場環境保全対策協議会

一抜本対策事業の実施状況について一

平成27年3月22日

福井県・敦賀市

#### 抜本対策工事の概要(H24年度完了)

■キャッピングエ(舗装)

アスファルト舗装工:65,900m<sup>2</sup>

■鉛直遮水工 【カーテング ラウチング 工】 施工延長: 北側444m,東側504m, 南側555m,西側387m



■鉛直遮水工 【連続地中壁工】 施工延長:





### 遮水機能の維持管理状況

### キャッピングおよび雨水集排水設備等の点検・保守

#### ■ 点検の種類

点検の種類	実施者	点検内容	実施頻度	
日常点検	県・管理業者	目視による施設の異常の有無を確認する	1回/週* (*施設の状況による)	
定期点検	点検事業者	目視点検、計測等により施設の補修の必 要性を判定し、補修方法を検討する	4回/年	
臨時点検	県·管理業者	地震、台風、集中豪雨等による異常の有 無を目視により確認する	異常気象発生時	
詳細点検	県·専門業者	突発的な異常が発生した場合や補修のた めの詳細な点検を行う	異常が発生した時	

#### ■ 定期点検

#### ■実施状況

• 年4回[5月28,29日,6月3日、8月5,6日、11月13,14日、3月18,19日]

#### ■実施内容

- 各設備の変状等を点検シートに整理
- 異常箇所の変位、ドレーントンネルの区間湧水量等の計測
- 計測結果をグラフ化して進行速度等を把握
- 点検結果および補修履歴等は電子化して蓄積

# キャッピングおよび雨水集排水設備等の点検・保守

## ■点検の結果





# ■ 補修状況(キャッピング機能の維持)





- ・集排水路接合部の隙間をシール材で補修:総延長約950m
- ・アスファルトクラックをシール材で補修:総延長約770m

# |補修状況(遮水壁の保護)




川岸の浸食が確認された範囲に コンクリートブロックを積み上げ、 遮水壁を保護



### 遮水機能の確認状況


#### 遮水壁内外の地下水位の変動状況

- ・ 遮水工外側の地下水位は、降雨等の影響とみられる変動があるもののほぼ横ばい
- 遮水工内側の地下水位はEL110m付近で安定していることから遮水壁の健全性が維持されている

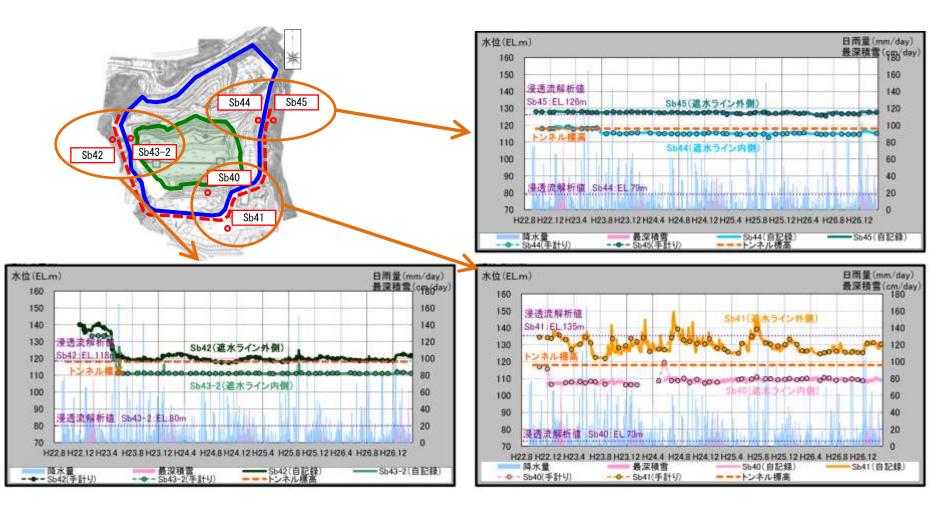

### 地下水位の変動状況(水位断面図)

- 鉛直遮水工完成後に地下水位が低下した。
- その後、安定して低い状態を維持している。

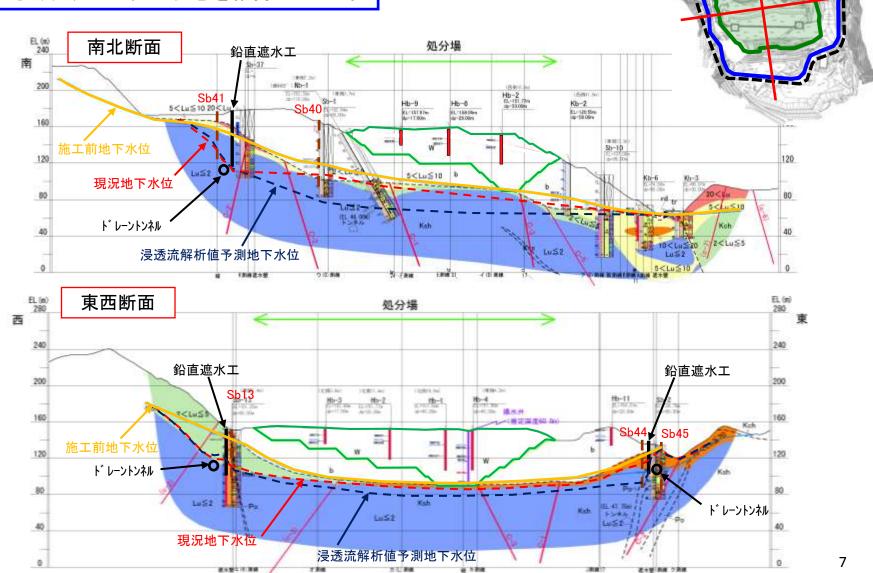


南北断面

#### ドレーントンネルの排水状況

- ドレーントンネルの排水量は、西側約200~500L/min、東側約100~200L/min。
- 解析結果(西側約200L/min、東側約180L/min)と同程度で、問題なく排水されている。
- H25年12月に排水孔のつまりの除去を行った結果、施工前に比べ排水効率が向上した。 (H26年はH25年に比べて春~夏の降水量が少なかったが、排水量がほぼ同等であった。)












排水量測定のための三角堰


### 水処理施設の処理状況

- 水処理施設の処理水質は常時排水基準を達成している。
- 処理水量は設計値を達成しており、順調に稼働している。






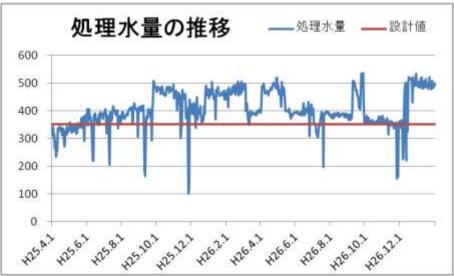

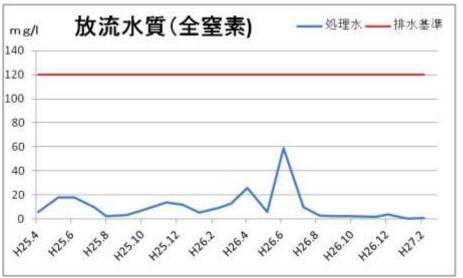

## 浄化促進工事の実施状況


### 工事の概要

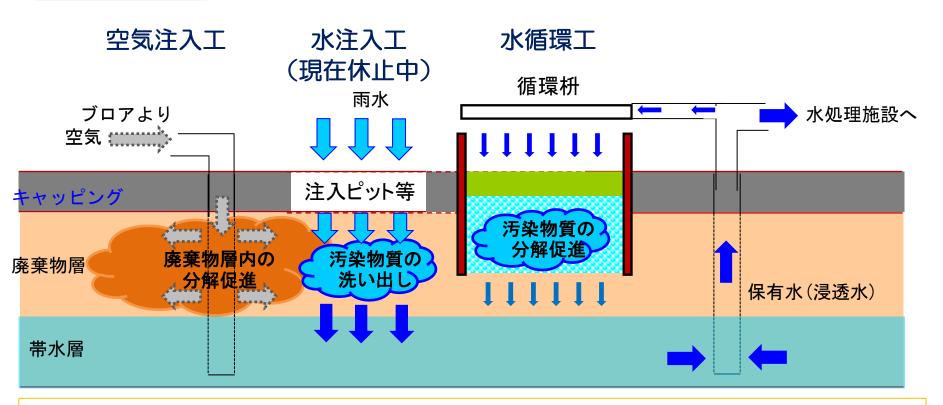

- 〇廃棄物層に空気を注入し、廃棄物の分解を促進する(空気注入工)
- 〇注入ピット等から雨水等を注入し、汚染物質を溶かして帯水層に移動させ、揚水井戸で 汲み上げて水処理施設で浄化する(水注入工)
- 〇揚水井戸で汲み上げた保有水の一部を循環枡に散水し、枡内で汚染物質を分解する (水循環工)

#### 施工状況平面図

- •H25年11月~浄化促進工事を順次再開
- ・H26年6月 保有水質の悪いエリアの対策強化のため、空気注入量を調整

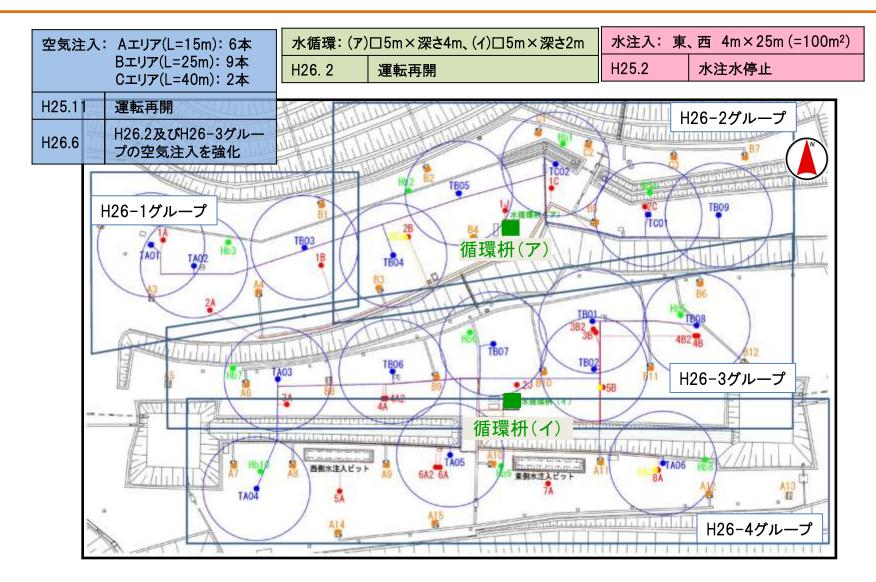

#### 水循環工の施工状況

#### (1) 目的

■ 生物分解による保有水の浄化を期待 (硝化作用による窒素の分解促進)



#### (2) 設備の運転状況


- 全窒素濃度が高い井戸の保有水を 循環桝に散水
- 散水量 循環桝(ア): 467m³


循環桝(イ): 1,003m<sup>3</sup>


(H26.2~H26.11)

■ 不具合等の発生なし





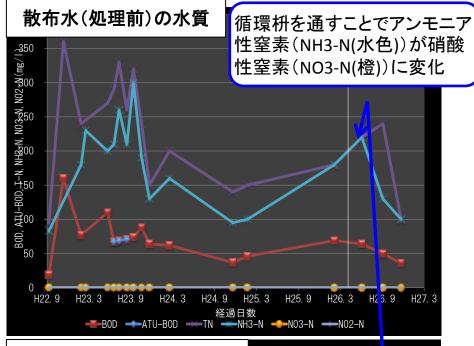


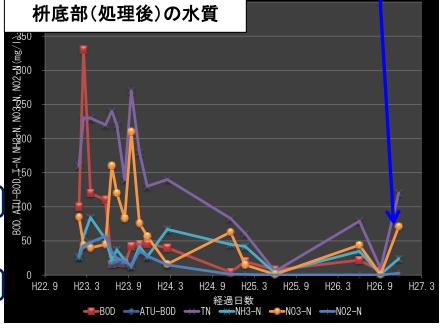

#### 空気注入工の施工状況


#### (1) 目的

■ 好気性微生物による廃棄物の分解 (微生物による廃棄物分解の活性化)



#### (2) 設備の運転状況

- 地中温度を監視しながら17箇所 の空気注入井戸から注入
- ■水質の悪いエリアは注入量を増加
- ■注入量: 5,499千m<sup>3</sup> (H25.11~H26.11)

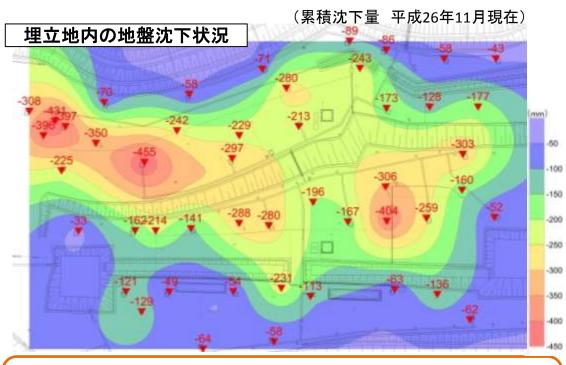


・施工とともに地盤沈下が継続して進行(最大455mm)しており、 空気注入による廃棄物の分解促進効果が認められる。

## 浄化効果確認モニタリング結果(水質)

- ■全窒素濃度が高い揚水井戸(分類③、④)が残っており、引き続き施工が必要
  - ・保有水位が低下したため、水注入を再開する。

(;	分 類 浄化の傾向)	①	2	3	4	⑤
水質	BOD	≦ 60mg/L	≦ 200mg/L		> 200mg/L	
	T-N	≦ 120mg/L	≦ 200mg/L	200 ~ 300mg/L	> 300mg/L	

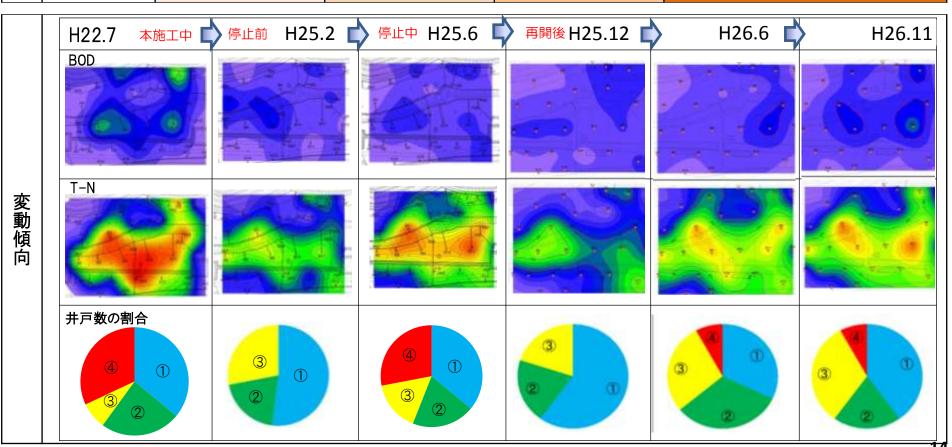

### H27年度の浄化対策について

- ・水注入を再開し、空気注入および水注入を中心に浄化エリアで対策を施工する。
- 保有水質の悪いエリアは重点的に施工する。
- 水注入は、雨水をクラックから自然注入することにより行う。 (注入エリア外はクラックの補修を行う。)
- 水質の良いエリアは、浄化促進工を休止しモニタリングを行う。
- 施工の範囲や方法は、浄化促進技術検討部会の意見を聞きながら 適宜変更を行う。

