


(1) 輪中堤整備【福井県】

施工中

- 南今庄地区、上新道地区において輪中堤整備が完了、下新道地区において施工中
- 引き続き、早期の完成に向け努めていく。

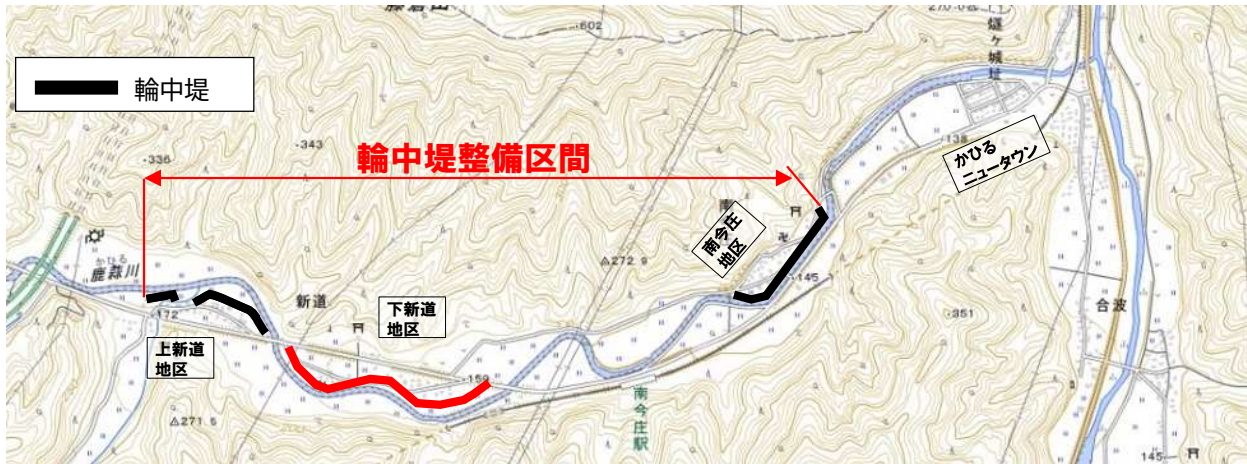

対策内容	工 程				
	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
計画策定 用地取得	[Black box]				
輪中堤			[Black box]		[Red box]

輪中堤整備(南今庄地区)



輪中堤整備(上新道地区)

