

平成11年 6 月 25 日
原子力安全対策課
(1 1 - 4 2)
<14時30分資料配布>

美浜発電所 1 号機復水器内部の清掃結果について

このことについて、関西電力株式会社から下記のとおり連絡を受けた。

記

美浜発電所 1 号機（加圧水型軽水炉；定格出力 3 4 . 0 万 k W）は、6 月 18 日より出力を約 45 % まで低下させて復水器内部の清掃を実施していたが、その結果、貝等の海生物約 90 k g を除去した。


なお、念のため、細管の渦流探傷検査を実施した結果、47 本（A 系 22 本、B 系 25 本）の細管が施栓基準に達していたことから施栓を行った。

今後、6 月 26 日 1 時頃より出力上昇を開始し、同日 19 時頃に定格出力に復帰する予定である。

表 1 . 美浜 1 号機の復水器細管の施栓状況

系統	細管設備数	既施栓数	今回施栓数	累計施栓数
A 系統	12760 本	206 本	22 本	228 本
B 系統	12760 本	402 本	25 本	427 本

系統概要図

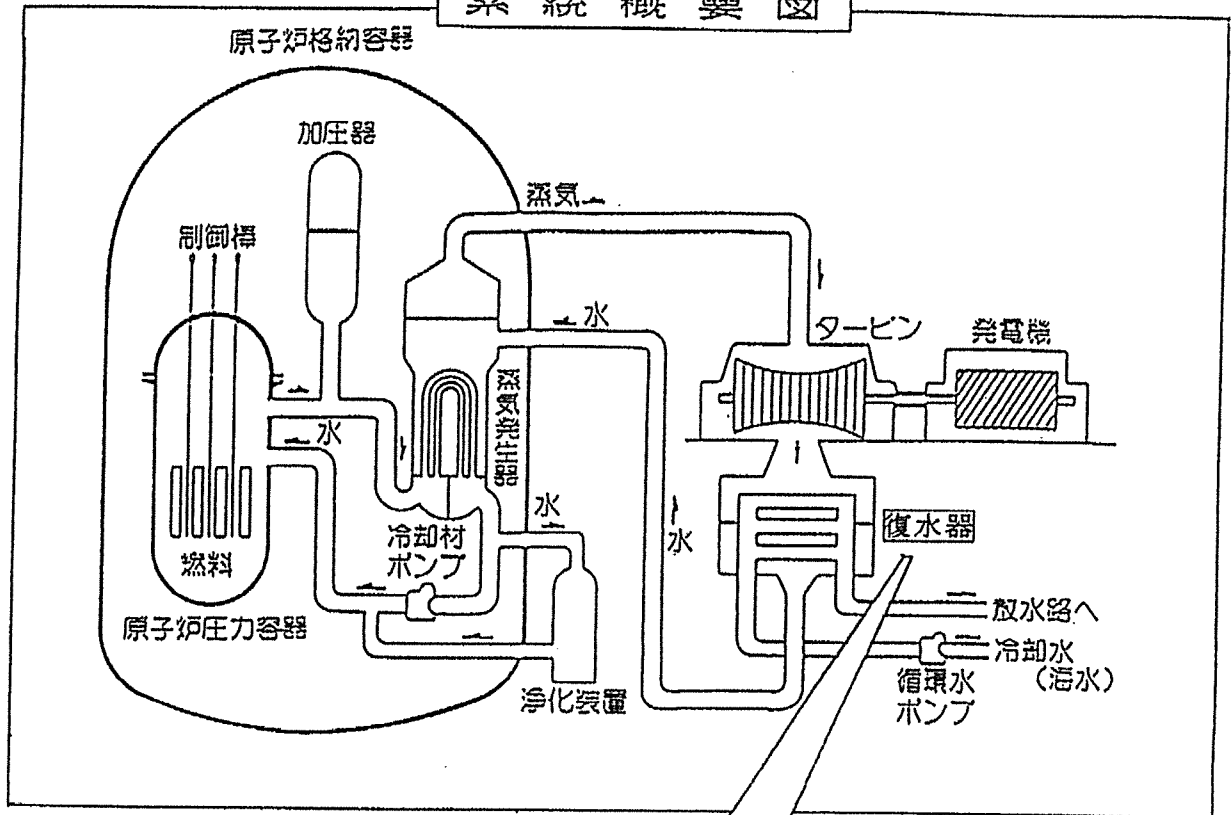

言羊 糸田

