令和８年度

道路雪対策基本計画


除雪状況
（拡幅除雪）


大雪対応合同訓練
（タイヤチェック）


除雪機械技術講習会


除雪状況
（拡幅除雪）


除雪機械園児見学会

福井県土木部

～表紙写真～

上段左　　敦賀停車場線の除雪状況（拡幅除雪）（R8.1）

上段右　　大雪対応合同訓練（タイヤチェック）の実施状況（R7.11）

中段右　　除雪機械技術講習会の実施状況（R7.11）

下段左　　国道１５８号の除雪状況（拡幅除雪）（R7.2）

下段右　　除雪機械園児見学会の実施状況（R7.11）

道路雪対策基本計画　目次

１．目的 …… p. 1
２．基本方針 …… p. 1
３．今年度の主な取り組み…… p. 1
４．基本計画 …… p. 4
　１）除雪体制 …… p. 4
　２）情報提供 …… p. 11
　３）連絡体制 …… p. 13
　４）渋滞対策 …… p. 13
　５）広報活動 …… p. 14
別表　１．指定雪量観測点および警戒積雪深 …… p. 15
別表　２．除雪連絡体制［平常体制］　福井県除雪対策本部 …… p. 18
別表　３．除雪連絡体制［警戒準備体制］　福井県除雪対策本部 …… p. 19
別表　４．除雪連絡体制［警戒体制］　福井県道路雪害対策本部 …… p. 20
別表　５．除雪計画路線総括表 …… p. 21
別表　６．最重点除雪路線総括表 …… p. 26
別表6－2．重点除雪路線総括表 …… p. 27
別表　７．代替路線総括表 …… p. 28
別表　８．一斉除雪路線総括表 …… p. 29
別表　９．消雪施設延長表 …… p. 30
別表１０．凍結防止剤散布延長表 …… p. 31
別表１１．歩道除雪延長表 …… p. 32
別表１２．早期歩道除雪路線表 …… p. 33
別表１３．除排雪を重点的に行う交差点 …… p. 35
別表１４．排雪指定箇所表 …… p. 36
別表１５．道路情報板設置箇所表 …… p. 40
別表１６．雪量観測点一覧表 …… p. 42
別表１７．道路状況確認カメラ設置箇所表 …… p. 46
別表１８．除雪機械配備一覧表（平常時）…… p. 58
別表１９．除雪機械配備一覧表（緊急時）…… p. 59
資料　１．福井県除雪対策本部および福井県道路雪害対策本部の事務分担内容　p. 60
資料　２．除雪情報連絡系統図 …… p. 66
資料　３．「福井県冬期道路情報連絡室」概要 …… p. 67
資料　４．「福井県冬期道路情報連絡会」概要 …… p. 70
資料　５．「福井県道路管理情報システム」概要 …… p. 71
資料　６．令和８年度 道路雪対策について（基本方針） …… p. 72
資料　７．最重点・重点除雪路線網図 …… p. 74

令和８年度　道路雪対策基本計画

１．目　的

本計画は、冬期間における主要道路の交通を確保するなど、雪に強い道路づくりを進めるための必要な事項を定める。

２．基本方針

生活圏の拡大や自動車交通量の増加などによる生活環境の変化、あるいは短期間の集中降雪による局地的大雪の発生等に柔軟に対応できる体制を備えるため、「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」および「福井県地域防災計画（雪害対策編）」に基づき、冬期間の道路交通確保や道路を取り巻く関連施設などの雪対策を計画する。

この計画では、除雪体制、情報提供、連絡体制、渋滞対策および広報活動について定め、道路などの除雪に万全を期する。

３．今年度の主な取り組み

令和３年１月の大雪を受け、以下の方針で令和８年度の道路雪対策を実施する。

１）北陸自動車道、国道８号、国道２７号、中部縦貫自動車道、舞鶴若狭自動車道については、短期間の集中的な大雪時には、「道路をできるだけ通行止めにしない」等の従来の考え方から、「人命を最優先に、幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避する」との考え方への国の方針転換を踏まえ、大規模な車両滞留を徹底的に回避する対策に加え、県内の社会経済活動等への影響を最小限にとどめるための取り組みを進める。

２）令和３年１月の大雪時に実施した応援機械の受入れやバス路線や物流拠点等へのアクセス道路の重点的な除雪について、より計画的かつ速やかに行えるよう、関係者と事前の取り決めを定める。さらに、除雪状況の見える化、除雪機械や除雪オペレータの一層の確保に向けた対策を進める。

①　車道除雪（別表５・６・６－２・７・８・１３）

・車道除雪延長　　約 1,869km（県管理道路延長　約 2,228km）

うち最重点除雪路線　約 463km

（積雪深 5cm を超え、気象情報等からさらに降雪が予想される時に除雪する路線）

うち重点除雪路線　約 426km

（短期間の集中的な大雪時に、バスの運行や物流・燃料配送等を確保するため、市町と連携して重点的に除雪する路線）

・代替除雪路線（効率的除雪を図る）

県が市町道を除雪　117 路線 120 区間　約 104km

市町が県道を除雪　 65 路線　78 区間　約 91km

・一斉除雪路線　　276 路線　約 360 km

市町が県と連携して、道路網の一斉除雪の実施

・市街地交差点における重点除排雪の取り組み　224 箇所

市町と連携して、交差する右左折レーンを含む除排雪の実施

・車道の除雪時間を短縮するための除雪体制を強化

大雪が予想される前の拡幅除雪・除排雪を徹底し、連続した降雪にも対応

隣接する土木事務所の境界を越えて相互に応援除雪を実施

短期間の集中的な大雪に備え、広域応援の円滑な受援体制を構築

② 歩道除雪（別表１１・１２）

・歩道除雪延長　　約 266km（歩道延長　約 688km）

・歩道の早期除雪を実施　約 35km（34 箇所）

・バス停、交差点における「みどりのスコップひとかき運動」の実施

交差点 106 箇所、バス停 68 箇所　　計 174 箇所

③ 消雪施設の整備（別表９）

消雪施設整備延長　約 373km

④ 倒木の未然防止対策

・降雪期前に「雪の重みで倒れる恐れがある立木」のパトロールを実施し、他部局、電力事業者、市町と連携して所有者や森林組合の協力を得て事前に伐採を実施

⑤ 除雪技術力の維持・向上

・道路管理者、除雪機械運転者の技術力向上を目的に除雪車の運転実地講習会を開催

・除雪機械の運転に必要な免許取得および技能講習に係る費用の補助を実施

⑥ 除雪作業の効率化

・積雪前の道路状況をタブレットに表示する除雪作業支援システムを導入し、応援除雪等におけるオペレータの除雪作業を効率化

⑦ 情報共有・提供体制の強化

・県内の主要幹線道路において、大雪に関する緊急発表や大雪警報が発令され、大雪により交通事故や立ち往生等が発生し、大規模な交通障害の発生が懸念される場合に、国土交通省福井河川国道事務所長が福井県冬期道路情報連絡室を開設し、各管理者間の詳細な情報共有、調整

・加えて、県民および道路利用者への定期的な情報提供を図るため、ＳＮＳやＬアラートなど多様な手段を活用し、関西・中京・北陸方面を含めた広域的な範囲のドライバー、運送事業者、荷主企業等を対象として、関係機関の協力を得ながら、出控えや広域迂回等を繰り返し呼びかけ

・日本道路交通情報センターと連携し、ラジオ等で県内の大雪情報を関西・中京・北陸圏に情報提供

・「みち情報ネットふくい」上で最重点除雪路線や消雪区間を表示するとともに、県民に県管理道路や市町の幹線道路の除雪状況を分かりやすく提供

・「みち情報ネットふくい」のスマホ対応および交通状況の表示
・大雪時には不要不急の外出を抑制するため、コネクティッドカーのデータを活用した路面凸凹情報を提供
・５Ｇタブレットを土木事務所に配備し、県民に対する情報発信の早期化や除雪業者や消雪業者との情報共有体制を構築

『福井県冬期道路情報連絡室』
構成　：　国土交通省福井河川国道事務所、福井県、福井県警察本部、
中日本高速道路㈱金沢支社、西日本高速道路㈱関西支社、
福井地方気象台、自衛隊福井地方協力本部
※　必要に応じて、市町等のオブザーバー参加が可能

⑧　沿道施設の待避所利用

・大雪時に、短時間の通行止めにより集中的な除雪を行う場合や交通障害が発生した際に覚書を締結した沿道施設の駐車場を車両の一時待避所や一次堆雪場として利用し、早期の交通確保を図る。

覚書締結施設　：　福井県立図書館、アピタ福井大和田店、ピアゴ丸岡店、福井新聞社福井県産業会館、サンドーム福井、道の駅越前たけふ、きらめきスタジアム、コメリパワー武生店、ムゼウム前駐車場

⑨　冬期道路通行止め運用

・高速道路や国管理道路（上位路線）が通行止めとなる場合、県管理道路の交通集中による車両滞留や大規模な立往生の発生を防ぐため、積雪状況等を踏まえて、県管理道路の通行止めを実施する可能性がある路線を事前に公表する。

４．基本計画

１）除雪体制

（１）除雪機構

① 道路保全課に除雪対策本部を、各土木事務所に除雪対策実施部を設け、その構成は下記のとおりとする。

除雪対策本部長	土木部長
〃　副本部長	道路保全課長
〃　実施部長	各土木事務所長、鯖江丹生土木部長

除雪対策本部長（以下本部長という。）は、各除雪対策実施部長（以下実施部長という。）を指揮するとともに、実施部相互間の連絡調整を行う。

実施部長は本部長および隣接実施部長と緊密な連絡の上、本計画に基づき、適切な除雪を実施する。（別表２）

② 豪雪災害時に備える準備段階として、県内の指定雪量観測点（別表１）がおおむね警戒準備積雪深に達した場合を目安に、除雪対策本部および該当する除雪実施部は平常体制から警戒準備体制に移行し、土木部各課の連携体制を整え、警戒体制への移行を円滑に行えるよう除雪対策に当たる。（別表３）

③ 豪雪災害時においては、県内の指定雪量観測点（別表１）の２分の１以上がおおむね警戒積雪深に達した場合を目安に、降雪状況その他を勘案の上、知事が近畿地方整備局長と協議して警戒体制への移行を決定する。この際、道路交通確保が十分行われるよう除雪対策本部は、知事を本部長とする道路雪害対策本部に移行する。（別表４）

④ 福井県地域防災計画に基づく福井県災害対策本部が設置された場合には、除雪対策本部又は道路雪害対策本部を廃止し、その事務および業務は災害対策本部で処理する。

［災害対策本部　設置箇所：総合防災センター(10 階)］

⑤ 除雪体制の各事務分担を資料１に示す。

（２）除雪対策本部設置期間

令和８年１１月　６日から令和９年３月３１日まで（１４６日間）

（３）除雪実施路線

除雪を実施する道路は除雪計画路線表（別表５）のとおりとする。

（４）除雪体制設置基準

各除雪体制の設置基準は次表のとおりとする。

- 「警戒体制」は、「豪雪災害時における道路交通確保のための緊急措置要領」(道企発第 70 号　昭和 51 年 12 月 27 日　道路局長通達)に基づき、知事と近畿地方整備局長が協議の上、移行する。
- 福井県地域防災計画に基づく「災害対策本部」が設置された場合は、除雪対策本部または道路雪害対策本部を廃止し、その事務及び業務は「災害対策本部」で処理するも

のとする。

組　　織	体　　制	降　積　雪　の　状　況
除雪対策本部	除雪準備体制	気象情報等により降雪が１０㎝以上予想される場合。ただし、最重点除雪路線に関しては、降雪５㎝を目安とし、気象情報等から、さらに降雪が予想される場合。
	平常体制	道路上の積雪深が１０㎝以上（ただし、最重点除雪路線に関しては５㎝以上）ある場合で、警戒準備体制に移行するまでの除雪作業を平常体制として実施する。
	警戒準備体制	県内の指定雪量観測点の１箇所以上で、おおむね警戒準備積雪深に達した場合を目安に、除雪対策本部および該当する除雪実施部は、除雪作業を警戒準備体制として実施する。
道路雪害対策本部	警戒体制	県内の指定雪量観測点の２分の１以上が、おおむね警戒積雪深に達した場合を目安に、降雪状況その他を勘案の上、知事と近畿地方整備局長が協議して警戒体制への移行を決定する。
	緊急体制	県内の指定雪量観測点の大部分が、警戒積雪深を大幅に超え、かつ、主要路線における除雪状況、積雪強度その他から緊急事態に陥る恐れがあると判断される場合に、知事と近畿地方整備局長が協議して緊急体制への移行を決定する。

（５）除雪出動基準

各除雪作業における出動基準は、原則として次表のとおりとする。

ただし、その他特別の事由等により対策本部長、実施部長が特に必要と認めた場合にも出動するものとする。

除雪作業	出　　動　　基　　準
新雪除雪	道路上の積雪深が１０㎝（ただし、最重点除雪路線に関しては５㎝）を超え、気象情報等からさらに降雪が予想されるとき。
路面整正	１．路面に残雪等があり、放置すると交通困難な状態となる恐れのあるとき。 ２.連続降雪による圧雪の成長防止や、路面の平坦性を確保する必要のあるとき。 ３．気温の変化や通行車のかく乱作用などで圧雪の性質が変わり、極端な不陸が生じ交通障害の原因となる恐れのあるとき。
拡幅除雪	連続した除雪作業により、路側の雪（雪堤）が大きくせり出し、必要幅員の確保が困難になり、交通障害を引き起こすと判断されるとき。 大雪が予想される場合には、必要に応じて、堆雪帯を確保するために事前に拡幅除雪を行う。
運搬排雪	拡幅除雪が特に難しい人家連担部や交差点等で、交通可能な幅員確保が困難になると判断されるとき。 大雪が予想される場合には、必要に応じて、堆雪帯を確保するために事前に運搬排雪を行う。
凍結防止剤散布	降雪の有無にかかわらず、気象情報等により気温が０℃以下になると予想され、路面が凍結し交通障害の発生が予想されるとき。

（６）除雪区分

①　交通量を基準とし、路線の性格を勘案して除雪実施路線を次の３種類に区分するほか、最重点除雪路線（資料７）を設定する。

最重点除雪路線	区分の目安	・県内外へのアクセス路線として、北陸自動車道の各ＩＣと国道８号、中部縦貫自動車道の各ＩＣと国道４１６号、舞鶴若狭自動車道の各ＩＣと国道２７号を結ぶ路線を指定する。 ・県内通過交通を対象とした路線として、日交通量１５，０００台以上の路線を基本に、南北に連なる路線を指定、さらにこれらの路線を結ぶ主要東西路線を指定し、梯子状の道路網を形成する。 ・中部縦貫自動車道を補完する路線として、国道４１６号等を指定する。 ・国道８号や国道２７号の予防的通行規制区間を補完する路線として、小浜上中線等を指定する。 ・北陸新幹線駅へのアクセス道路を指定する。 ・バスなどの公共交通路線や物流拠点へのアクセス道路を指定する。 ・病院群輪番制参加病院および周産期母子医療センター等にアクセスする幹線道路および市町道路を指定する。 以下の１１病院 （福井県立病院、福井県済生会病院、福井赤十字病院、福井大学医学部附属病院、福井愛育病院、福井総合病院、（独）地域医療機能推進機構・福井勝山総合病院、公立丹南病院、市立敦賀病院、敦賀医療センター、公立小浜病院） ・原子力発電所の周辺地域と国道２７号を結ぶ幹線道路を指定する。 以下の５施設 （高速増殖炉もんじゅ、敦賀原子力発電所、美浜原子力発電所、大飯原子力発電所、高浜原子力発電所）
	目標	異常降雪時※においても２車線以上の幅員を確保し、常時交通を確保する。

区　分	区分の目安 （日交通量）	除　　雪　　目　　標
第１種	1,000 台／日以上	２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は常時交通を確保する。
第２種	500～999 台／日	２車線確保を原則とするが、状況によって、１車線幅員で待避所を設ける。
第３種	500 台／日未満	１車線幅員で必要な待避所を設けることを原則とする。

※異常降雪時とは、３８豪雪・５６豪雪・１８豪雪・平成３０年豪雪・令和３年大雪のような状況を指す。

②　「顕著な大雪に関する福井県気象情報」が発表されるような短期間の集中的な大雪時に、バス路線や物流拠点、警察署、消防署、医療機関等へのアクセス道路への影響を最小限にとどめるため、市町と連携して重点的に除雪を行い、常時交通を確保するよう努める重点除雪路線（資料７）を設定する。

［除雪出動基準：道路上の積雪深が１０㎝を超え、さらに降雪が予想されるとき］

（７）除雪準備

各実施部は次の各項に留意し、いつでも除雪を実施できるよう体制を整えておく。

①　実施部の組織化

実施部長の指揮の下、円滑に除雪作業を行えるよう部内の組織化を図る。

②　除雪実施計画の作成

本計画に基づき、実施部においては、職員の業務分担、配車計画（民間借上げ機械含む)、情報連絡体制、その他必要事項を定めた除雪実施計画を作成する。計画に当たっては、警戒準備体制をはじめ、警戒時や緊急時に十分対応できるよう留意する。

③　除雪路線の整備

積雪時における道路状況の確認困難による事故を防止するため、脆弱箇所、危険個所等の補修および構造物表示板、スノーポール等の設置を行う。

④　除雪機械の整備

除雪機械の車体、機関および付属品等の点検整備を行う。

⑤　職員、委託契約関係者への啓蒙

本部長は関係職員、委託契約関係者に除雪に必要な事項を周知させるとともに、特にオペレータを対象に、法規、機械操作、作業手順等について講習を行うなど、技術向上に必要な措置を講ずる。

除雪機械の安全管理や操作技術の向上を図るため、実施部長は管内の除雪オペレータに「除雪機械技術講習会」を受講させるよう努める。

⑥　関係機関との調整

除雪作業を能率的かつ適切に遂行できるよう各関係機関と十分協議をしておく。特に、隣接する実施部、国、中日本高速道路(株)金沢支社、西日本高速道路(株)関西支社（以降、「各高速道路管理者」という)、管内各市町と主要な道路網の連携、除雪待機・作業状況の相互連絡体制について調整を図り、連携した除雪に努める。

また、踏切箇所を有する実施部においては、その除雪に関し各鉄道事業者と相互連絡を徹底し、踏切部の円滑な交通を確保する。

特に、県内の主要幹線道路において、大雪により交通事故や立ち往生等が発生し、大規模な交通障害の発生が懸念される場合に、国土交通省福井河川国道事務所長は「福井県冬期道路情報連絡室」の開設を指示するとともに、各道路管理者、交通管理者、福井地方気象台、自衛隊福井地方協力本部を福井河川国道事務所へ招集し、各管理者間の詳細な情報共有を行い、積極的な連携調整を図る。（資料３）

各土木事務所と管内の市町が、寒波到来前に「冬期道路情報連絡会」を開催し、情報の共有および対応の確認を行い、連携を強化する。（資料４）

（８）除雪作業

除雪作業は作業の形態から除雪工、運搬排雪工、消雪工、凍結防止剤散布工および歩道除雪工に分類して行う。

①　除雪工

道路上の積雪を除雪機械により路側に排除する作業で、次の３種類に分類する。

ア　新雪除雪

降雪後、高速除雪車により出来るだけ早期に行い、新雪を遠くへ飛散させ、次回除雪作業を有利にする。最重点除雪路線については、特に、早期の除雪をすることに留意する。

イ　路面整正

圧縮された雪を日中の気温の上昇を見計らい、または凍結防止剤の散布を併用して整正除去する作業で、パトロールにより早期着手の徹底を図る。

ウ　拡幅除雪

路肩に堆積した雪堤（雪崩を含む）を除去する作業で、幅員の確保と次の除雪を有利に進める。

②　運搬排雪工　（別表１３・別表１４）

市街地、幅員狭小な道路、交差点、橋梁、トンネルの出入口等において運搬排雪工を行う場合には、交通量、沿道条件、気象条件、雪捨場、住民の協力体制、その他条件を調査の上、特に次の各項に留意する。

ア　排雪時期の選択

イ　積込運搬機械の機種および台数の決定

ウ　雪捨場の整備

市町と十分協議の上、排雪場を開設する。

エ　所轄警察署への交通整理の依頼

オ　沿道住民、一般通行車（人）への広報と協力要請

③　消雪工　（別表９）

消雪工は、地下水または河川水を散水施設によって散水し、雪を融かす方法である。稼働させるに当たり、次の各項に留意する。

ア　降雪期前に十分な整備・点検を実施しておく。点検の際、散水した水が凍結する恐れがある場合は、凍結防止剤を散布するなど適切な措置を行い十分注意する。

イ　降雪状況、気温等を十分考慮の上、稼働させる。

ウ　特に地下水については水資源の確保に留意する。

④　凍結防止剤散布工　（別表１０）

交通安全の確保を図ることを目的として、降雪の有無にかかわらず、低温にて路面凍結が予測される場合に凍結防止剤を散布する作業である。

原則として、交差点、踏切、橋梁、坂道、カーブ、日中日陰となる箇所のうち道路管理者として必要性が認められる場所を指定し散布する。散布指定箇所以外で、他機関（住

民を含む）から散布要請があった場合は、現場状況を考慮の上、対応する。橋梁、坂道等の必要箇所には、散布の他に凍結防止剤を現地に常備して緊急時に備える。

⑤　歩道除雪工　（別表１１）

ア　歩道上の積雪を小型除雪機械等により排除する作業である。歩道除雪は地域的な課題であることから、地区住民の協力を得ながら、降積雪状況に応じて適宜実施するよう努める。

イ　歩道除雪作業は、連続する降雪期を避け、ほぼ安定した天候が良い時に実施するものとし、各地域で一連の歩行者通行ネットワークが組めるよう市町と連携する。また、小学校から半径 500ｍの範囲における通学路にかかる、県管理道路の歩道除雪および主要駅（北陸新幹線 各駅、ハピラインふくい 芦原温泉駅、春江駅、福井駅、鯖江駅、武生駅、ＪＲ北陸本線　敦賀駅、ＪＲ小浜線　小浜駅）の半径 500ｍ以内の歩道除雪を実施する。

ウ　病院群輪番制参加病院および周産期母子医療センター等周辺の歩道除雪を実施する。

エ　積雪による交差点部の横断の不便さや、バス停留所における乗降の危険性がある箇所にスコップを配置する。通行者およびバス待合者、スコップ設置箇所周辺の企業の方々に「みどりのスコップひとかき運動」の協力を依頼して、冬期歩道の交通安全を図る。

オ　歩道のない通学路区間は、車道の拡幅除雪に努める。

カ　企業や病院、大学などに周辺の歩道除雪の協力を要請する。

キ　作業の実施は、原則として歩道上の積雪深が 20 ㎝を上回っている場合を標準とし、小型除雪機械を使用して昼間作業で行い、長靴・防寒靴で歩行可能な状態を確保する。なお、連続降雪時には車道除雪の進捗などを検討の上、実施する。ただし、車道に消雪装置がある通学路で歩道が広い場合は、早朝除雪の実施に努める。（別表１２）

ク　水溜まりなどにより横断歩道の歩行が困難な交差点について、パトロールにより早朝に確認し、優先的に排水、排雪作業を実施する。

（９）応援除雪

「顕著な大雪に関する福井県気象情報」が発表されるような短期間の集中的な大雪時には、管内応援除雪（除雪業者による除雪作業が８時間以内に完了しないことを目安として実施）および広域応援除雪（管内除雪業者による除雪作業が２４時間以内に完了しないことを目安として実施）を行い、早期の交通確保を図る。

なお、広域応援除雪の実施手順については、「広域応援除雪の運用マニュアル」および各土木事務所の除雪計画に基づくものとする。

（１０）倒木対策

降雪期前に「雪の重みで倒れる恐れがある立木」のパトロールを実施し、他部局、電力事業者、市町と連携して所有者や森林組合の協力を得て事前伐採を実施する。

（１１）除雪形態　（別表５・別表１８・別表１９）

除雪は、県有除雪機械を民間企業に貸与して行う貸与除雪、および民間企業より除雪機械を借上げして行う委託除雪に区分して行う。

（１２）春除雪路線

山間部の積雪が多く冬期間の利用度が著しく低い路線や道路構造上冬期間の交通が著しく危険な路線は、冬期間閉鎖し、融雪期を待ち除雪を行う。その路線は（別表５）春除雪欄のとおりとする。除雪実施時期に関しては、天候、残雪状況を十分調査し、安全性を確認した上で決定する。

（１３）記録または報告

実施部長は下記により除雪実施計画の報告と、各種の記録を整備する。

なお、除雪業務の効率化を図るものとする。

項　　目	記　録　ま　た　は　報　告　の　要　請
気象状況の報告	毎日　７時　各観測点の降雪、積雪、気温の報告
除雪実績の報告	毎日　７時　前日除雪車の実績報告（前日とは７時００分～２４時の間）
	毎日　７時　当日除雪車の実績報告（当日とは０時～７時００分の間）
	毎日１６時　除雪待機の連絡、除雪状況
	随　　時　道路状況（交通止、交通不能、通行規制等）
除雪事業実施確認調書等の整備	雪量日誌
	雪量月報
	除雪作業実績一覧表
	除雪建設機械管理実績報告書
	自動車運転日誌
	積雪状況
写真の整理	降雪状況
	その他（消雪、防雪施設が必要な箇所）

２）情報提供

（１）情報の収集　（別表１６・別表１７）

①　「福井県道路雪情報システム」により、主要地点の観測情報および除雪機械の位置情報を随時入手する。

また、県の観測情報の他、近畿地方整備局、各高速道路管理者、気象台、各市町と連携し、それぞれの持つ情報の共有に努める。

○県管理の観測箇所数
- 降積雪計、気温計　　定点観測３７箇所、路面観測２０箇所　計５７箇所
- 道路状況確認カメラ　　２１４箇所
- 路中温計　　３８箇所

○県の除雪機械に装備したＧＰＳ数
- 貸与機械　２４２台、委託機械　３１５台　　計　５５７台

○除雪機械（車道）にＧＰＳを装備した市町数
- １７市町（県内市町すべて）

② 実施部長は、除雪オペレータに携帯電話の携帯を義務付け、除雪の進捗状況等の把握に努める。さらに、関係市町、町内会長等に協力を要請し、除雪路線の状況、除雪機械の運行状況等を常に把握する。また、近畿地方整備局、各高速道路管理者、各市町と連絡を密にし、それぞれの除雪状況を把握する。（資料２）

ＧＰＳを装備した除雪機械において、日報や精算調書等の作成を半自動化した。なお、現場管理写真においてはTeams等を用い、施工者の報告資料作成の効率化を図る。

また、市町の除雪機械（車道）にＧＰＳを装備し、除雪機械の位置情報を把握することで、市町との除雪の連携強化を図る。

③ 実施部長は、バス事業者や市町の協力を得て、バスの運転手から提供される事故やスリップによる通行止め情報、路面の積雪や凍結状況を把握する。

④ 本部長および実施部長は、近畿地方整備局、各高速道路管理者、各市町、県警および道路交通情報センターと連携し、通行止め、渋滞情報等の交通情報の把握に努める。併せて、「福井県道路管理情報システム」（資料５）を活用し、県管理道路の通行規制情報を遅滞なく入力する。

（２）情報の提供

① 実施部長は県内主要地点６６箇所に設置してある道路情報提供装置等を通じて雪情報を提供し、主要幹線道路の冬期交通の円滑化を図る。（別表１５）

② 県内２１４箇所の道路状況画像を１０分毎または３０分毎に更新、３８箇所の路中温度（舗装面下）の情報、３７箇所の降積雪深の情報を１時間毎に更新して県ホームページ「みち情報ネットふくい」で、情報提供する。その際、国土交通省、中日本高速道路（株）金沢支社、鯖江市、南越前町、越前町、高浜町、近隣各県、マスコミ等のホームページとリンクし、広範囲から情報を提供して利用者の利便性を図る。（別表１７）

③ 「みち情報ネットふくい」で、除雪状況や道路情報、交通状況を表示し、交通需要の抑制を図る。

④ 「みち情報ネットふくい」のスマホ対応を行い、注意喚起の強化を図る。

⑤ 災害時に「みち情報ネットふくい」へのアクセス集中によって閲覧ができなくなることを防止するため、災害時にはヤフー株式会社との災害協定に基づく専用ページを公開する。
災害時専用ＵＲＬ https://www-hozen-pref-fukui-lg-jp.cache.yimg.jp/hozen/yuki/

路面状況静止画提供箇所数

福井県	国土交通省	高速道路㈱	その他機関	合 計
214	102	16	25	357

⑥　県内２１箇所の道の駅に設置されている道路情報提供端末等において、上記と同様の道路情報を提供する。

⑦　テレビ、ラジオ等のマスメディアとの連携により、道路交通状況や異常事態発生の情報を速やかに提供する。（資料２）

３）連絡体制

本部長ならびに実施部長は、除雪作業を円滑、かつ合理的に遂行するため、次の条項に留意し、他の機関との協力体制を確立する。

（１）本部長ならびに実施部長は、近畿地方整備局、各高速道路管理者、隣接土木事務所（隣接県含む)、関係市町と待機の有無、除雪開始・終了等の連絡を密にし、最重点除雪路線をはじめとする道路網の連携のとれた除雪作業を行う。また、「福井県道路管理情報システム」を活用し、情報共有に努める。

（２）本部長は、警戒準備体制に移行した場合、土木部各課に役割を分担し、相互連絡の徹底を図る。

（３）実施部長は、除雪実施計画に基づき、所轄警察署と協議の上、路上放置物件の取締、除雪機械の運行に対する交通整理、その他の協力を要請する。

（４）実施部長は、関係市町を通じ、必要に応じて住民の協力を要請する。

（５）実施部長は、鉄道事業者と踏切部の除雪に関する相互連絡を徹底し、踏切部の円滑な通行を確保する。緊急時において鉄道事業者による除雪が困難な場合は、申し合わせ事項に基づき、鉄道事業者の立ち会いを得て道路管理者が除雪協力する。

（６）実施部長は、短期間の集中的な大雪時における重点除雪路線の除雪の際は、関係市町と相互に連絡の上、協力し合う。

（７）実施部長は、県管理道路とネットワークを構成する市町道について、県の出動基準に合わせて同時除雪できるよう関係市町と連携を図る。

（８）実施部長は、国道、市町道との交差点部の除雪の際は、相互に連絡の上、協力し合う。

（９）実施部長は、交通管理者等関係機関と連携し、交通渋滞や通行不能状況等の早期解消に努める。

（１０）本部長は、県内の主要幹線道路において、大雪により交通事故や立ち往生等が発生し、大規模な交通障害の発生が懸念される場合、「福井県冬期道路情報連絡室」（資料３）の国の招集指示に従い、福井河川国道事務所へ連絡室員を１名以上派遣する。

４）渋滞対策

（１）県のホームページ「みち情報ネットふくい」を通して除雪状況や道路状況画像、コネクティッドカーのデータを活用した路面凸凹情報を提供することにより、積雪等で路面状況が悪化している場合に、不要不急の外出を控え、また公共交通機関の利用等により、交通需要を抑制させる。また、ＡＩを活用した音声による自動対応サービスにより、２４時間いつでも道路情報の案内を行う。

（２）降雪時の市街地渋滞を緩和させるため、パークアンドライド駐車場およびアクセス道路の除雪を始発に合わせ優先的に行う。

■県営駐車場等

えちぜん鉄道　　：　西長田

福井鉄道　　：　北府、浅水、ハーモニーホール

■市町が設置する大規模駐車場

ＪＲ北陸本線　　：　新疋田

ハピラインふくい　：　湯尾、今庄

ＪＲ越美北線　　：　大野、北大野

えちぜん鉄道　　：　勝山、三国、三国港

福井鉄道　　：　水落

５）広報活動

（１）実施部長は、除雪についての作業や協力・注意事項（冬用タイヤの適正な装着など）を県民等へ広く周知させるため、降雪期前にチラシの配布や市町広報誌への掲載により啓発する。また、本部は県のホームページ、テレビやラジオ、新聞等により、降雪期前の啓発および冬期間の情報提供を広く行う。


（２）本部長は、国土交通省、気象台、県警察本部、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱と協力し、トラック協会および運送会社等に、県内における冬期間通行の注意事項、遵守事項の広報を実施する。また、隣接府県の道路管理者に注意喚起を要請するとともに、道の駅等で広報を要請することにより、他県の一般ドライバーに対しても冬期間の道路交通に対する啓発を広く行う。

別表１　指定雪量観測点および警戒積雪深

番号	観測点名	観　測　地　点	警戒準備 積雪深	警戒 積雪深
1	福　井	福井市豊島２丁目	７０cm	９０cm
2	武　生	越前市村国	７０cm	９０cm
3	大　野	大野市蛇塚	１１０cm	１５０cm
4	敦　賀	敦賀市松栄町	７０cm	８０cm
5	小　浜	小浜市遠敷	５０cm	６０cm


図－１


警戒準備体制移行地域割

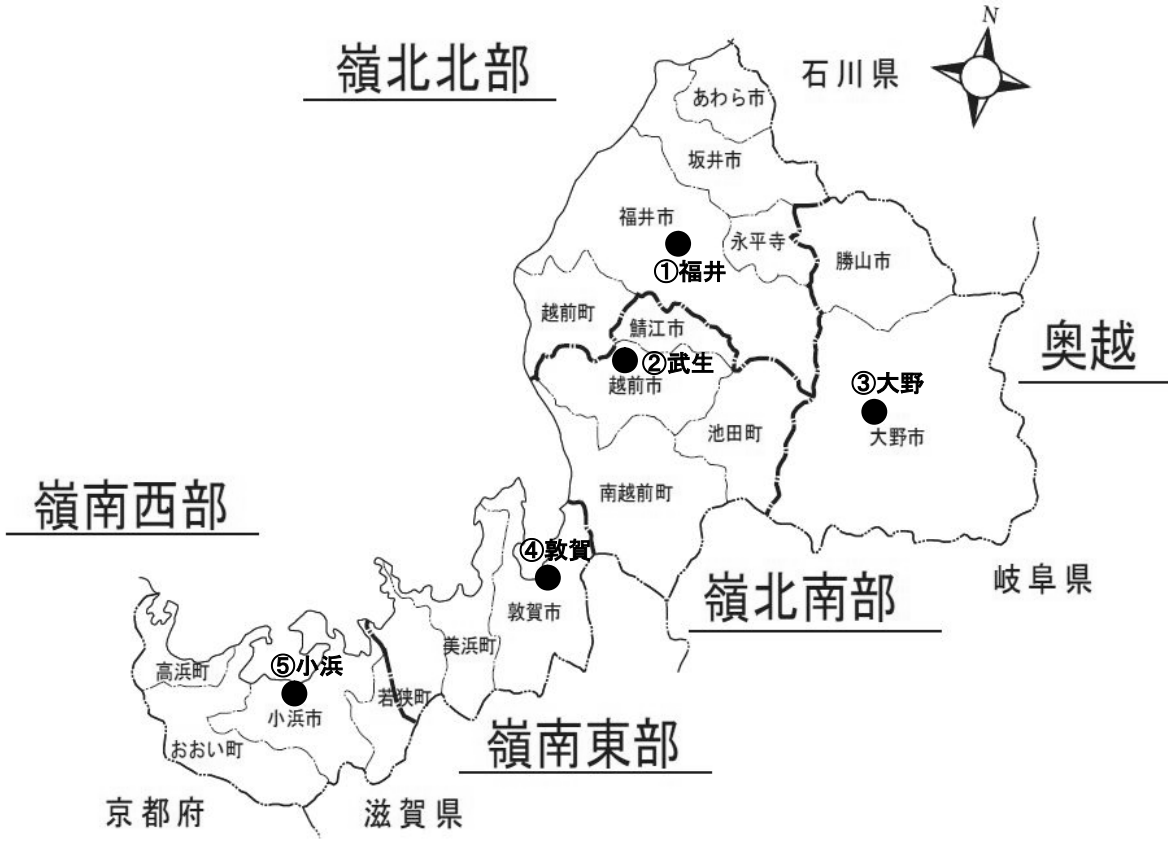


●：指定観測点


指定雪量観測点に最寄りの土木事務所における最大積雪深(S55～R7)

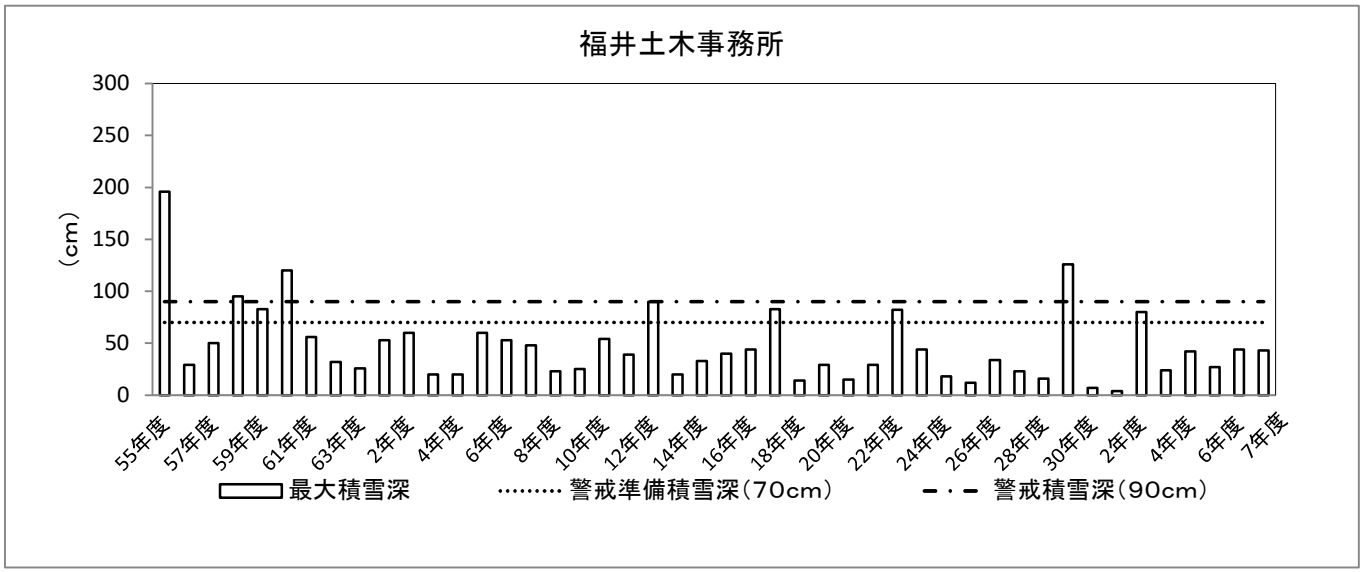


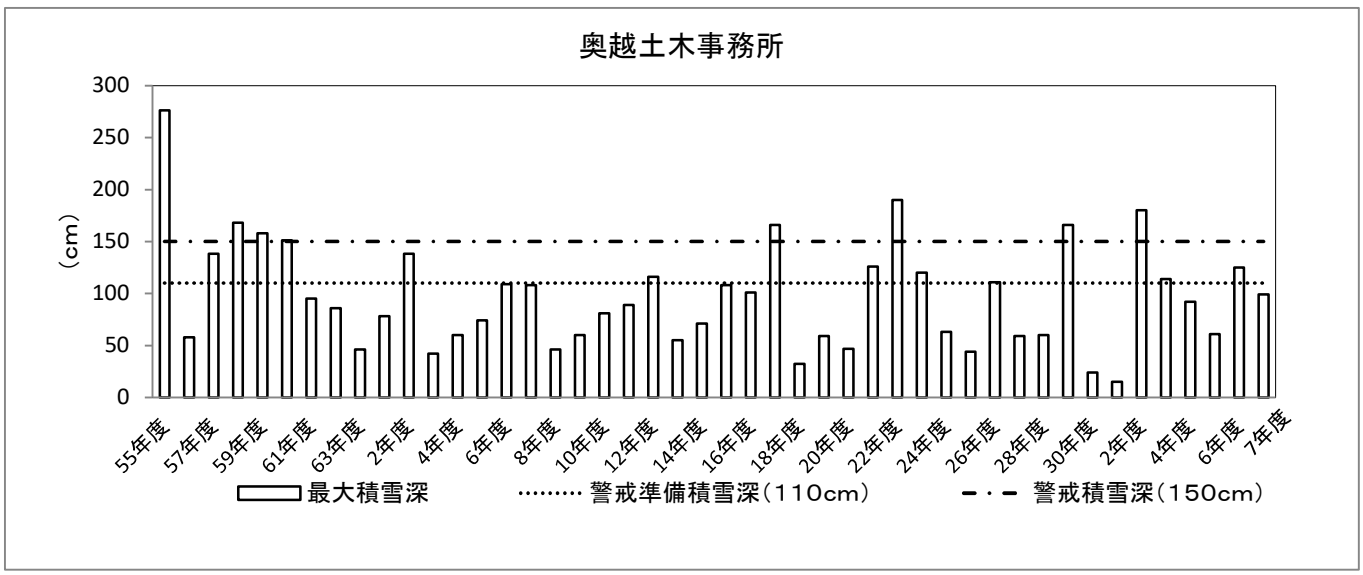

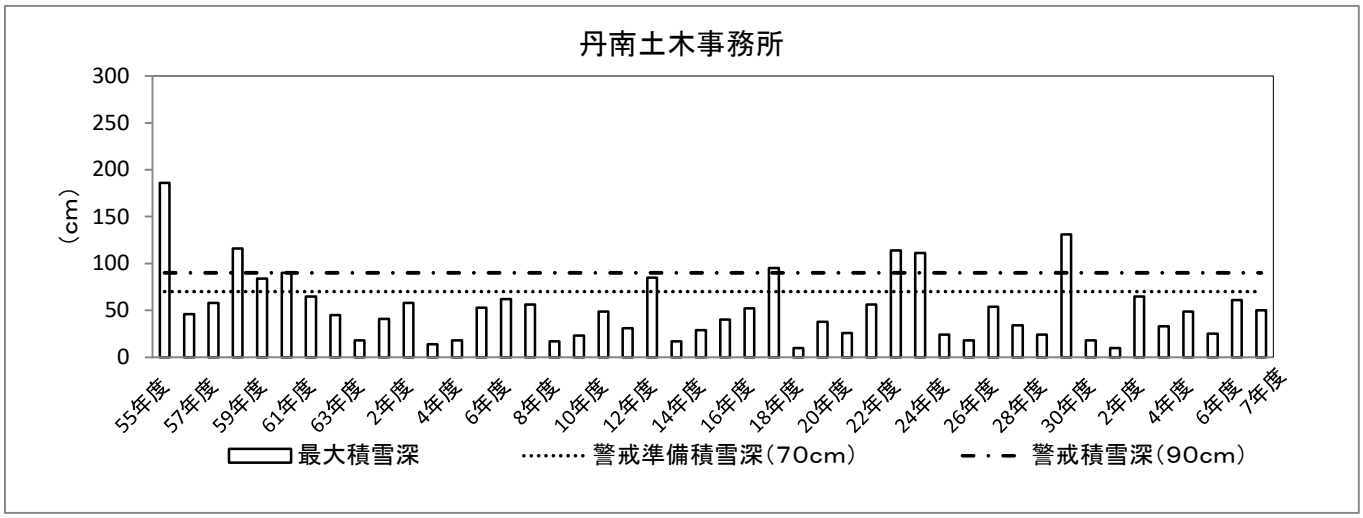


指定雪量観測点に最寄りの土木事務所における最大積雪深(S55～R7)

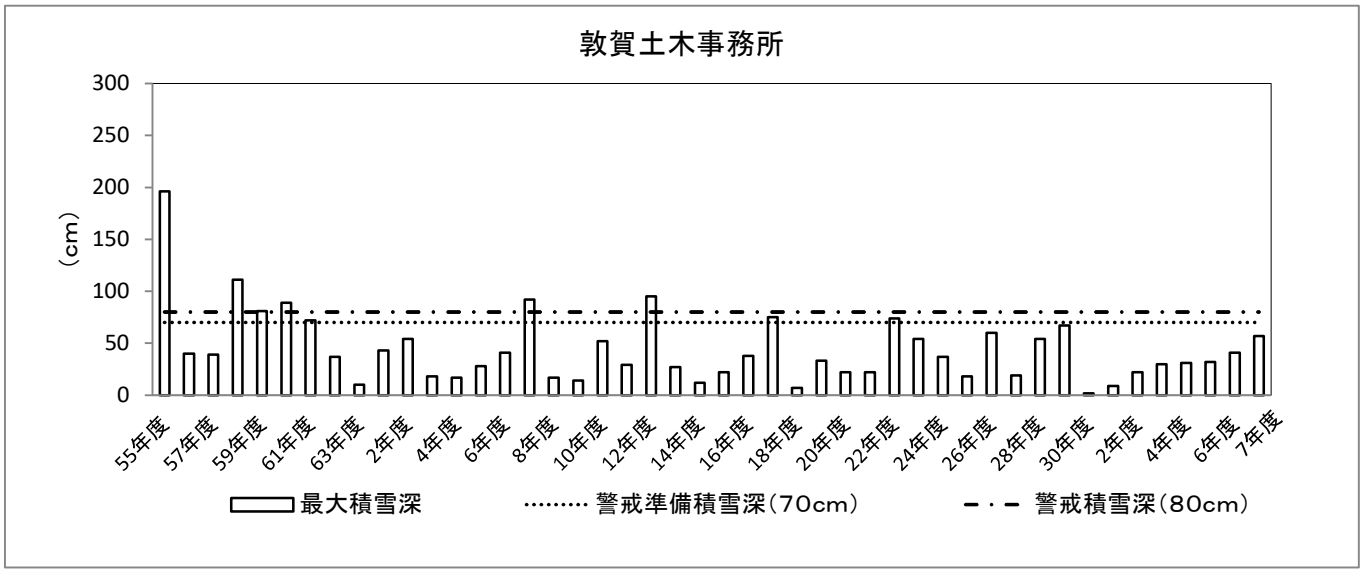

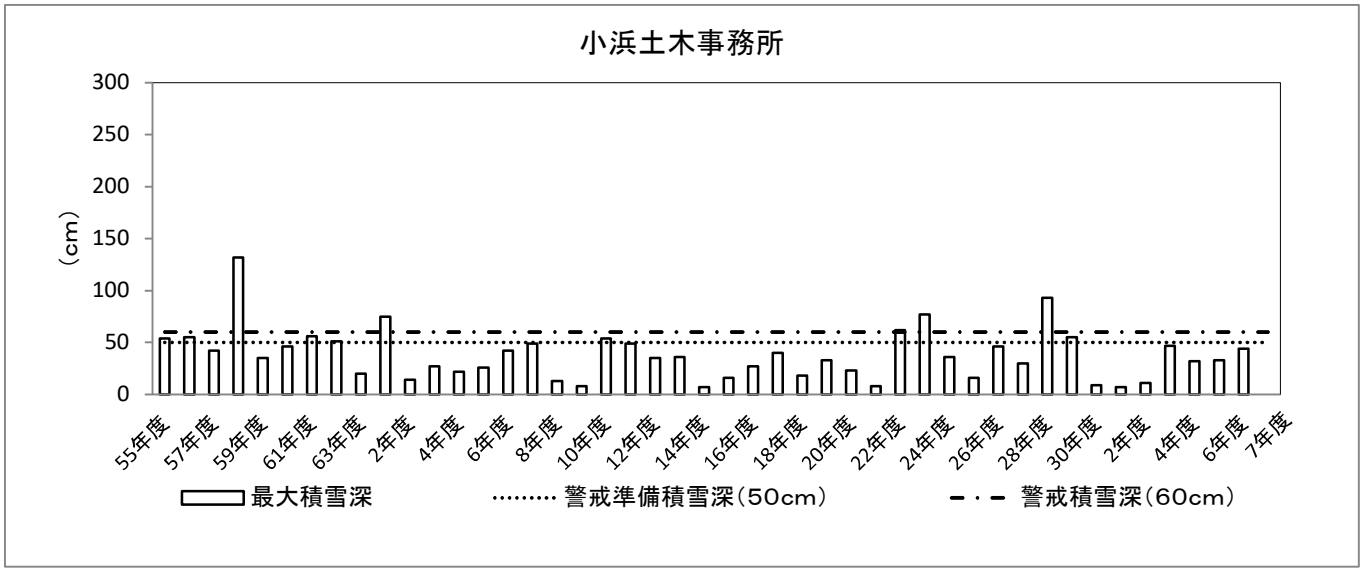

別表２　除雪連絡体制［平常体制］　福井県除雪対策本部


※R8.11.6～R9.3.31 設置
※危機管理監が室長である福井県災害対策連絡室と調整あり

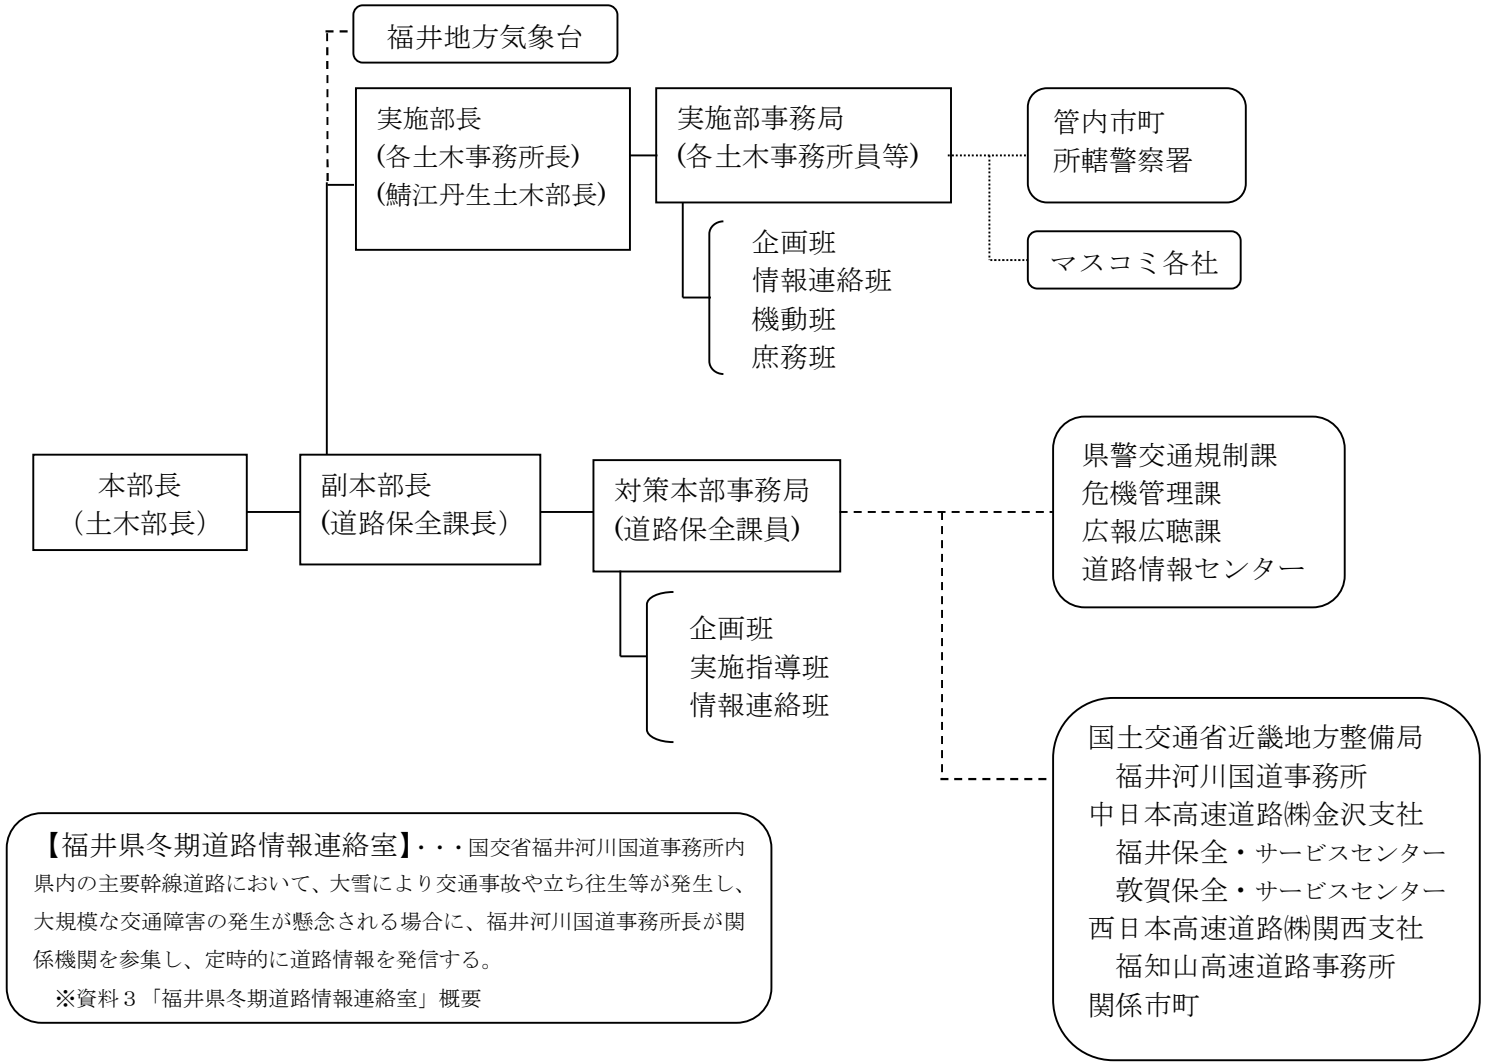

【福井県冬期道路情報連絡室】・・・国交省福井河川国道事務所内
県内の主要幹線道路において、大雪により交通事故や立ち往生等が発生し、大規模な交通障害の発生が懸念される場合に、福井河川国道事務所長が関係機関を参集し、定時的に道路情報を発信する。
※資料３「福井県冬期道路情報連絡室」概要


別表３　除雪連絡体制［警戒準備体制］　福井県除雪対策本部

※指定観測点５箇所のうち１箇所以上で警戒準備積雪深を超えた場合に移行する

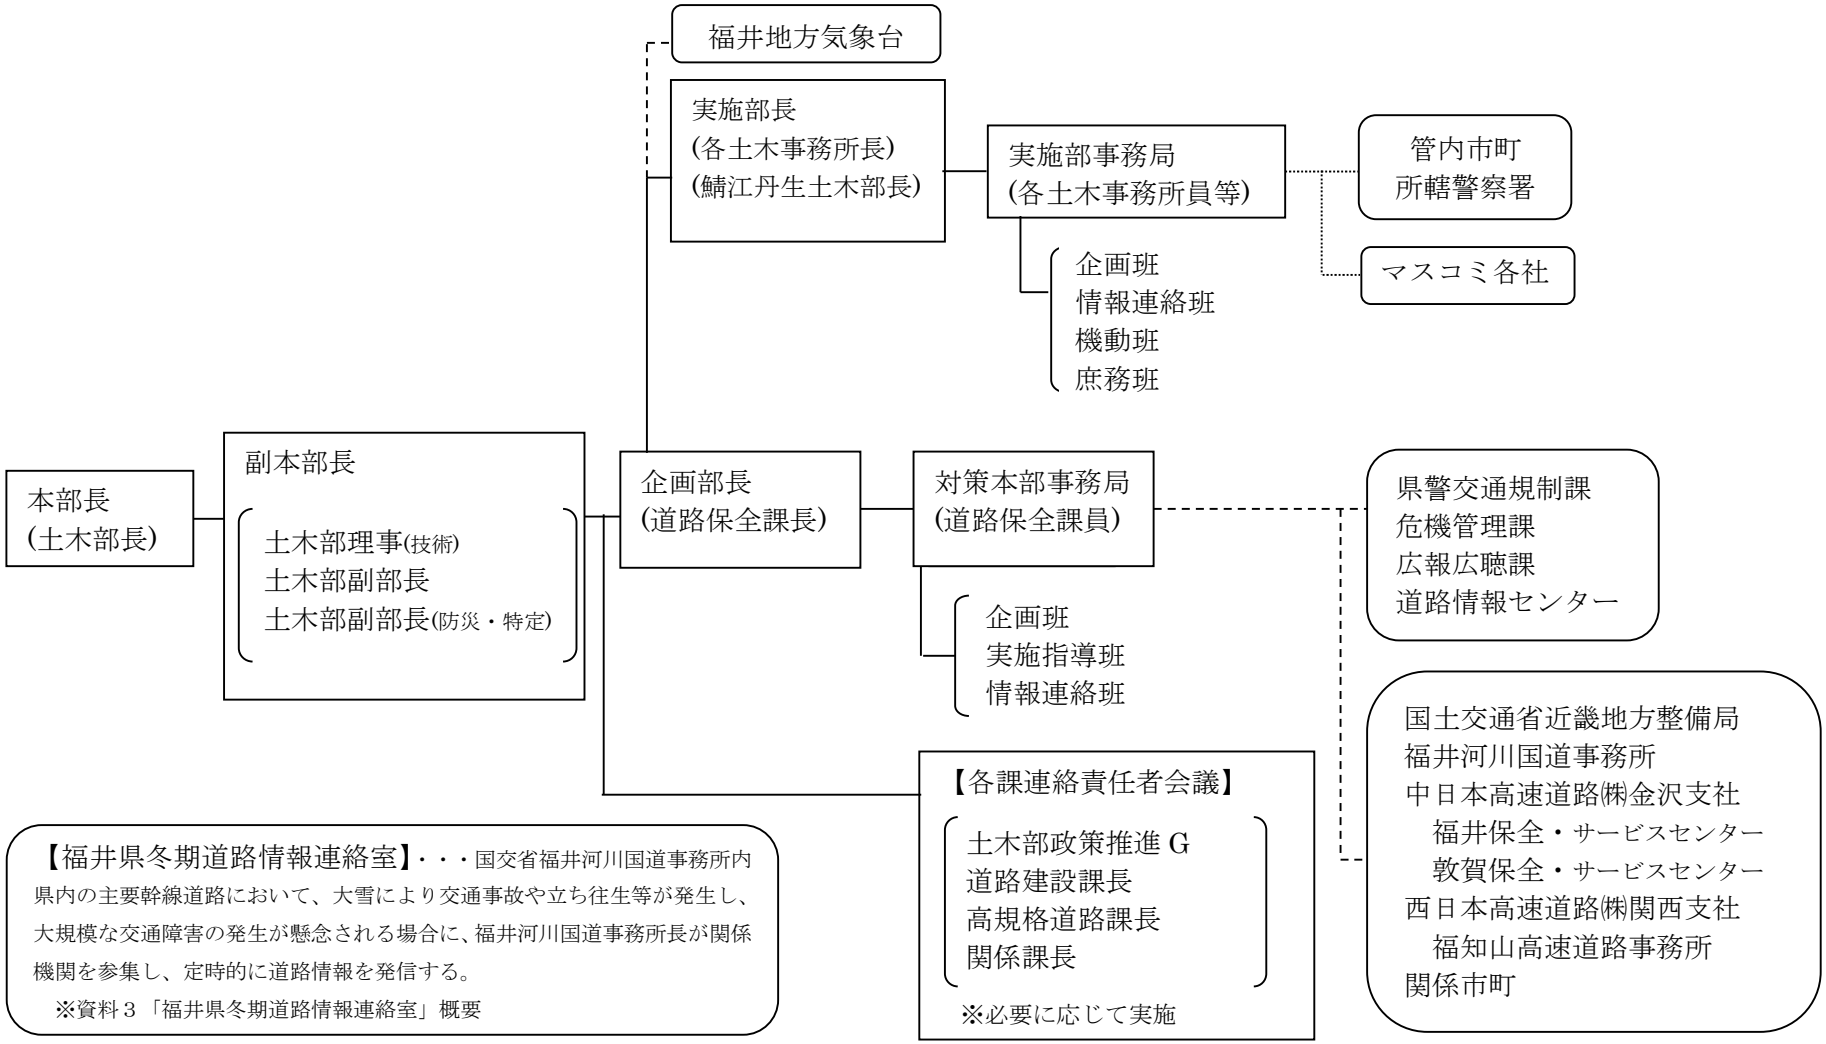

別表４　除雪連絡体制［警戒体制］　福井県道路雪害対策本部

※指定観測点５箇所のうち３箇所が警戒積雪深を超えた場合、
**　知事が近畿地方整備局長と協議したうえで移行する**
※県知事が本部長の福井県災害対策本部との調整あり

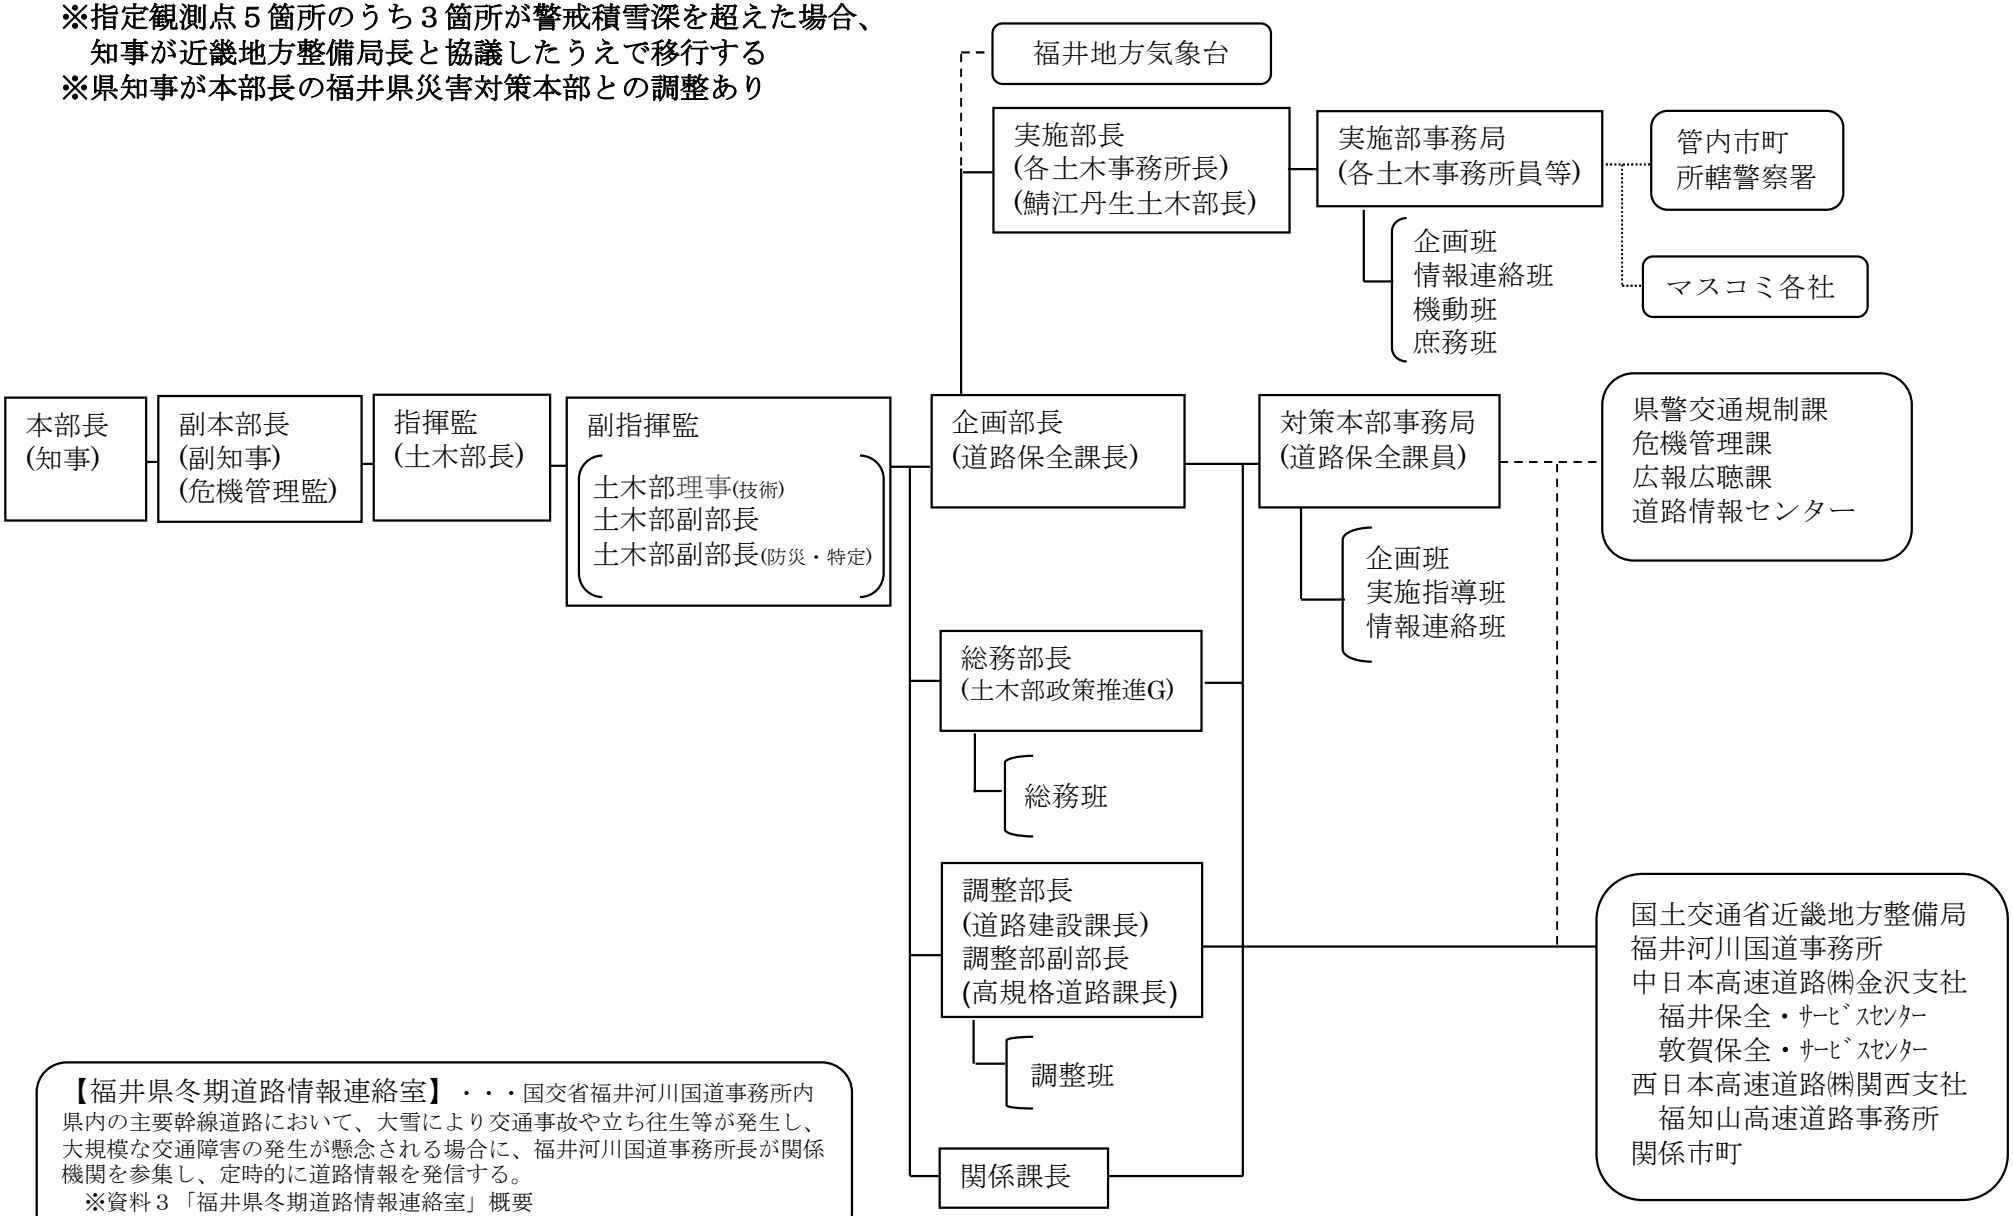

【福井県冬期道路情報連絡室】・・・国交省福井河川国道事務所内
県内の主要幹線道路において、大雪により交通事故や立ち往生等が発生し、大規模な交通障害の発生が懸念される場合に、福井河川国道事務所長が関係機関を参集し、定時的に道路情報を発信する。
※資料３「福井県冬期道路情報連絡室」概要

別表５　　除雪計画路線総括表

(1)除雪区分別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	除雪計画路線数	除雪計画延長 第１種	第２種	第３種	第１～３種 計	春除雪	計
一般国道	10	479.2	32.2	6.7	518.1	9.4	527.5
主要地方道	38	406.4	88.2	12.6	507.2	13.1	520.3
一般県道	167	613.2	151.3	79.1	843.6	10.5	854.1
計	215	1,498.8	271.7	98.4	1,868.9	33.0	1,901.9

※自転車道約41.6kmは除く

(2)除雪形態別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	機械除雪計画延長 貸与(※1)	委託(※2)	小計	消雪工	春期除雪	計
一般国道	298.0	122.8	420.8	97.3	9.4	527.5
主要地方道	262.7	120.5	383.2	124.0	13.1	520.3
一般県道	402.9	289.4	692.3	151.3	10.5	854.1
計	963.6	532.7	1,496.3	372.6	33.0	1,901.9

※1.貸与：県が除雪機械を委託業者へ貸与して除雪する延長
※2.委託：委託業者が除雪機械を準備して除雪する延長

別表５　　除雪計画路線総括表

福井土木事務所

(1)除雪区分別延長総括表

道路種別	除雪計画路線数	除雪計画延長 第１種	第２種	第３種	第１～３種 計	春除雪	計
一般国道	5	119.4	14.8	0.0	134.2	0.0	134.2
主要地方道	14	123.9	4.8	11.6	140.3	0.0	140.3
一般県道	42	155.6	0.0	9.8	165.4	0.0	165.4
計	61	398.9	19.6	21.4	439.9	0.0	439.9

(2)除雪形態別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	機械除雪計画延長 貸与	委託	小計	消雪工	春除雪	計
一般国道	50.7	40.2	90.9	43.3	0.0	134.2
主要地方道	75.7	23.2	98.9	41.4	0.0	140.3
一般県道	70.7	42.3	113.0	52.4	0.0	165.4
計	197.1	105.7	302.8	137.1	0.0	439.9

三国土木事務所

(1)除雪区分別延長総括表

道路種別	除雪計画路線数	除雪計画延長 第１種	第２種	第３種	第１～３種 計	春除雪	計
一般国道	2	36.4	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
主要地方道	10	87.4	9.6	0.0	97.0	0.0	97.0
一般県道	32	125.0	21.0	1.5	147.5	1.7	149.2
計	44	248.8	30.6	1.5	280.9	1.7	282.6

(2)除雪形態別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	機械除雪計画延長 貸与	委託	小計	消雪工	春除雪	計
一般国道	29.0	4.7	33.7	2.7	0.0	36.4
主要地方道	60.3	14.2	74.5	22.5	0.0	97.0
一般県道	52.7	66.7	119.4	28.1	1.7	149.2
計	142.0	85.6	227.6	53.3	1.7	282.6

別表５　　除雪計画路線総括表

奥越土木事務所

(1)除雪区分別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	除雪計画路線数	除雪計画延長 第１種	第２種	第３種	第１～３種 計	春除雪	計
一般国道	4	95.9	5.7	6.7	108.3	9.4	117.7
主要地方道	4	29.9	16.5	0.0	46.4	0.0	46.4
一般県道	18	17.5	44.3	42.0	103.8	8.8	112.6
計	26	143.3	66.5	48.7	258.5	18.2	276.7

(2)除雪形態別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	機械除雪計画延長 貸与	委託	小計	消雪工	春除雪	計
一般国道	76.6	28.4	105.0	3.3	9.4	108.3
主要地方道	15.3	15.3	30.6	15.8	0.0	46.4
一般県道	23.7	71.3	95.0	8.8	8.8	112.6
計	115.6	115.0	230.6	27.9	18.2	276.7

別表５　　除雪計画路線総括表

丹南土木事務所

(1)除雪区分別延長総括表

道路種別	除雪計画路線数	除雪計画延長 第１種	第２種	第３種	第１～３種 計	春除雪	計
一般国道	4	93.6	11.7	0.0	105.3	0.0	105.3
主要地方道	8	52.9	9.9	1.0	63.8	6.4	70.2
一般県道	31	70.7	56.2	5.5	132.4	0.0	132.4
計	43	217.2	77.8	6.5	301.5	6.4	307.9

(2)除雪形態別延長総括表　(単位:km)

道路種別	機械除雪計画延長 貸与	委託	小計	消雪工	春除雪	計
一般国道	72.6	7.8	80.4	24.9	0.0	105.3
主要地方道	37.9	1.7	39.6	24.2	6.4	70.2
一般県道	55.3	58.6	113.9	18.5	0.0	132.4
計	165.8	68.1	233.9	67.6	6.4	307.9

鯖江丹生土木部

(1)除雪区分別延長総括表　(単位:km)

道路種別	除雪計画路線数	除雪計画延長 第１種	第２種	第３種	第１～３種 計	春除雪	計
一般国道	3	56.5	0.0	0.0	56.5	0.0	56.5
主要地方道	8	35.1	11.4	0.0	46.5	6.7	53.2
一般県道	21	69.0	9.5	2.2	80.7	0.0	80.7
計	32	160.6	20.9	2.2	183.7	6.7	190.4

(2)除雪形態別延長総括表　(単位:km)

道路種別	機械除雪計画延長 貸与	委託	小計	消雪工	春除雪	計
一般国道	24.3	17.9	42.2	14.3	0.0	56.5
主要地方道	15.6	23.9	39.5	7.0	6.7	53.2
一般県道	49.4	8.8	58.2	22.5	0.0	80.7
計	89.3	50.6	139.9	43.8	6.7	190.4

別表５　　除雪計画路線総括表

敦賀土木事務所

(1)除雪区分別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	除雪計画路線数	除雪計画延長 第１種	第２種	第３種	第１～３種 計	春除雪	計
一般国道	2	21.9	0.0	0.0	21.9	0.0	21.9
主要地方道	3	15.9	0.0	0.0	15.9	0.0	15.9
一般県道	22	85.4	10.5	16.5	112.4	0.0	112.4
計	27	123.2	10.5	16.5	150.2	0.0	150.2

(2)除雪形態別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	機械除雪計画延長 貸与	委託	小計	消雪工	春除雪	計
一般国道	9.1	7.7	16.8	5.1	0.0	21.9
主要地方道	12.1	0.7	12.8	3.1	0.0	15.9
一般県道	83.6	13.7	97.3	15.1	0.0	112.4
計	104.8	22.1	126.9	23.3	0.0	150.2

小浜土木事務所

(1)除雪区分別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	除雪計画路線数	除雪計画延長 第１種	第２種	第３種	第１～３種 計	春除雪	計
一般国道	2	55.5	0.0	0.0	55.5	0.0	55.5
主要地方道	9	61.3	36.0	0.0	97.3	0.0	97.3
一般県道	23	90.0	9.8	1.6	101.4	0.0	101.4
計	34	206.8	45.8	1.6	254.2	0.0	254.2

(2)除雪形態別延長総括表　　(単位:km)

道路種別	機械除雪計画延長 貸与	委託	小計	消雪工	春除雪	計
一般国道	35.7	16.1	51.8	3.7	0.0	55.5
主要地方道	45.8	41.5	87.3	10.0	0.0	97.3
一般県道	67.5	28.0	95.5	5.9	0.0	101.4
計	149.0	85.6	234.6	19.6	0.0	254.2

別表６

最 重 点 除 雪 路 線 総 括 表

（単位:km）

実施機関	一般国道	主要地方道	一般県道	代替路線	市町道	計
福井土木	57.8	35.3	26.6	11.1		130.8
三国土木	2.7	49.5	3.3			55.5
奥越土木	18.0		5.8	1.7		25.5
丹南土木	48.4	24.7	13.8	0.7		87.6
鯖丹土木部	22.5	4.6	5.5	2.2		34.8
敦賀土木	12.2	15.2	36.7	14.2		78.3
小浜土木	5.4	45.3	29.8	2.5		83.0
福井市					30.9	30.9
あわら市					7.5	7.5
越前市					4.3	4.3
鯖江市					6.4	6.4
永平寺町					1.7	1.7
若狭町					4.6	4.6
計	167.0	174.6	121.5	32.4	55.4	550.9

最重点除雪路線	一般国道		主要地方道		一般県道		代替路線		市町村道		計	
路線数・区間数計	9 路線	38 区間	22 路線	51 区間	38 路線	50 区間	18 路線	18 区間	18路線	18区間	105路線	175区間

県道	463.1
市町道	87.8

別表６－２

重 点 除 雪 路 線 総 括 表

（単位:km）

実施機関	一般国道	主要地方道	一般県道	代替路線 (県が市町道除雪)	市町道	代替路線 (市町が県道除雪)	計
福井土木	37.5	3.6	19.8	1.0			61.9
三国土木	24.1	21.6	28.1				73.8
奥越土木	73.7	11.9	17.1	4.0			106.7
丹南土木	15.8	16.4	10.4				42.6
鯖丹土木部	15.8	1.2	17.4	1.9			36.3
敦賀土木	10.3		13.8				24.1
小浜土木	48.2	24.2	7.9				80.3
福井市					41.6		41.6
敦賀市					10.7		10.7
小浜市					21.2		21.2
大野市					18.6		18.6
勝山市					7.4		7.4
鯖江市					6.7		6.7
あわら市					8.3		8.3
越前市					20.2		20.2
坂井市					20.1	1.3	21.4
池田町					3.0		3.0
南越前町						5.9	5.9
越前町					11.1	0.3	11.4
高浜町					6.5		6.5
おおい町					12.3		12.3
若狭町					2.3		2.3
他機関					0.6		0.6
計	225.4	78.9	114.5	6.9	190.6	7.5	623.8

重点除雪路線	一般国道		主要地方道		一般県道		代替路線 (市町→県)		市町村道		代替路線 (県→市町)		計	
路線数・区間数計	10 路線	54 区間	19 路線	42 区間	59 路線	83 区間	7 路線	8 区間	209 路線	221 区間	5 路線	5 区間	309 路線	413 区間

県道	426.3
市町道	197.5

別表７　　代 替 路 線 総 括 表

土木事務所等	県道→市町 (市町が県道を除雪)		市町道→県 (県が市町道を除雪)	
	路線数	延長 (km)	路線数	延長 (km)
福　井	19	21.8	17	20.9
三　国	4	2.8	3	2.6
奥　越	3	3.6	8	5.8
丹　南	15	29.3	60	33.2
鯖　丹	7	7.4	7	8.1
敦　賀	6	14.1	7	17.4
小　浜	11	12.2	15	16.2
計	(78 区間) 65 路線	91.2 km	(120 区間) 117 路線	104.2 km

※(　)内は各土木事務所毎の区間合計で延べ数。

別表８　　一 斉 除 雪 路 線 総 括 表

【土木事務所等別】　　(単位:km)

土木事務所等	路 線 数	延　　長
福　井	191 路線	177.7
三　国	21 路線	51.5
奥　越	11 路線	17.4
丹　南	31 路線	41.5
鯖　丹	1 路線	6.0
敦　賀	11 路線	34.9
小　浜	10 路線	31.4
計	276 路線	360.4

【市町別】

市 町	路 線 数	延　　長
福井市	188 路線	171.9
永平寺町	3 路線	5.8
あわら市	8 路線	16.7
坂井市	13 路線	34.8
大野市	5 路線	9.2
勝山市	6 路線	8.2
越前市	27 路線	32.2
池田町	4 路線	9.3
鯖江市	1 路線	6.0
敦賀市	9 路線	18.1
美浜町	1 路線	6.4
若狭町	3 路線	17.3
小浜市	2 路線	17.0
おおい町	4 路線	3.7
高浜町	2 路線	3.8
計	276 路線	360.4

※順不同

別表９　　消 雪 施 設 延 長 表

【設置延長】　　（単位:km）

土木事務所等	一般国道	主要地方道	一般県道	計
福　井	43.3	41.4	52.4	137.1
三　国	2.7	22.5	28.1	53.3
奥　越	3.3	15.8	8.8	27.9
丹　南	24.9	24.2	18.5	67.6
鯖　丹	14.3	7.0	22.5	43.8
敦　賀	5.1	3.1	15.1	23.3
小　浜	3.7	10.0	5.9	19.6
計	97.3	124.0	151.3	372.6

【設置箇所】　　（単位:箇所）

土木事務所等	一般国道	主要地方道	一般県道	計
福　井	52	53	62	167
三　国	4	31	49	84
奥　越	10	19	19	48
丹　南	24	15	24	63
鯖　丹	23	16	46	85
敦　賀	3	4	22	29
小　浜	3	20	10	33
計	119	158	232	509

別表１０　　凍 結 防 止 剤 散 布 延 長 表

(単位:km)

土木事務所等	一般国道	主要地方道	一般県道	計
福　井	38.1	26.6	25.6	90.3
三　国	9.0	16.2	8.4	33.6
奥　越	24.0	7.1	7.2	38.3
丹　南	39.5	12.8	22.2	74.5
鯖　丹	17.0	13.3	26.8	57.1
敦　賀	8.0	3.9	18.3	30.2
小　浜	13.1	17.5	6.9	37.5
計	148.7	97.4	115.4	361.5

別表１１　　歩 道 除 雪 延 長 表

（歩道除雪　全延長）　　（単位:km）

土木事務所等	一般国道	主要地方道	一般県道	計	代替路線 （県が市町道除雪）
福　井	5.6	25.7	30.5	61.8	0.6
三　国	3.1	11.6	17.2	31.9	0.0
奥　越	21.4	13.2	17.0	51.6	1.4
丹　南	8.6	20.1	16.6	45.3	0.3
鯖　丹	12.0	6.9	15.0	33.9	0.0
敦　賀	2.3	3.3	12.0	17.6	0.0
小　浜	12.9	6.5	4.7	24.1	0.0
計	65.9	87.3	113.0	266.2	2.3

県道	266.2
市町道	2.3

別表１２　　早朝歩道除雪路線表

土木事務所等	番号	道路種別	路線名	区　　間	延長(km)	沿道状況		実施形態
福　井	1	主要地方道	福井加賀	福井市　順化２丁目 照手１丁目	0.70	1	通	貸
	2	主要地方道	福井加賀	福井市　文京３丁目 大宮４丁目	1.80	1	通	貸
	3	主要地方道	福井四ヶ浦	福井市　つくも２丁目 桃園１丁目	1.70	1	通	貸
	4	主要地方道	福井朝日武生	福井市　毛矢２丁目 西木田１丁目	0.70	1	通	貸
	5	主要地方道	福井丸岡	福井市　松本４丁目 文京２丁目	1.70	1	通	貸
	6	一般県道	吉野福井	福井市　米松１丁目 四ツ井１丁目	1.30	1	通	貸
	7	一般県道	吉野福井	福井市　日之出５丁目 日之出４丁目	0.60	1	通	貸
	8	一般県道	吉野福井	福井市　日之出５丁目 大手１丁目	1.10	1	通	貸
	9	一般県道	吉野福井	福井市　宝永３丁目 大手３丁目	1.40	1	通	貸
	10	一般県道	殿下福井	福井市　光陽４丁目 学園３丁目	0.90	2	通	貸
	11	一般県道	殿下福井	福井市　光陽２丁目 花月４丁目	1.40	2	通	貸
	12	一般県道	福井停車場米松	福井市　中央１丁目 大手２丁目	1.10	1	通	貸
	13	一般県道	福井停車場米松	福井市　宝永２丁目 志比口３丁目	2.60	1	通	貸
	14	一般県道	福井停車場勝見	福井市　手寄１丁目 日之出３丁目	0.80	1	通	貸
福井土木　合計					17.80			
三　国	1	主要地方道	福井金津	坂井市　春江町中筋 春江町江留中	1.80	3	通	貸
	2	一般県道	板倉高江	坂井市　春江町田端	0.50	2	通	貸
	3	一般県道	芦原温泉停車場	あわら市　春宮	0.30	2	通	貸
	4	一般県道	磯部島西瓜屋	坂井市　丸岡町　寅国	0.13	2	通	貸
三国土木　合計					**2.73**			
奥　越	1	一般国道	１５８号	大野市　朝日	0.70	3	通	委
	2	一般県道	本郷大野線	大野市　中野３丁目 要町	0.60	1	通	貸
	3	一般国道	４７６号	大野市　日吉町 元町	0.90	1	通	貸
奥越土木　合計					**2.20**			

別表１２　　早朝歩道除雪路線表

土木事務所等	番号	道路種別	路線名	区　　間	延長(km)	沿道状況		実施形態
丹　南	1	一般国道	３６５号	南条郡南越前町　湯尾	0.86	2	通	貸
	2	一般国道	３６５号	南条郡南越前町　今庄 合波	2.30	2	通	貸
	3	一般国道	４１７号	越前市　粟田部町	0.10	2	通	貸
	4	主要地方道	武生美山	越前市　定友町	1.20	2	通	貸
	5	一般県道	小曽原武生	越前市　中央２丁目	0.50	2	通	貸
	6	一般県道	今庄停車場	南条郡南越前町　今庄	0.36	2	通	貸
	7	一般県道	池泉今立	越前市　粟田部町	1.00	2	通	貸
丹南土木　合計					**6.32**			
鯖　丹	1	一般県道	鯖江停車場	鯖江市　日ノ出 深江	0.70	2	通	貸
	2	一般県道	石田家久停車場	鯖江市　大倉町 吉田町	0.30	2	通	貸
鯖丹土木　合計					**1.00**			
敦　賀	1	主要地方道	佐田竹波敦賀	敦賀市　松島 津内町	1.47	2	通	貸
	2	一般県道	敦賀美浜	敦賀市　白銀町 野神	2.20	2	通	貸
敦賀土木　合計					**3.67**			
小　浜	1	主要地方道	久坂中ノ畑小浜	小浜市　遠敷	0.20	2	通	委
	2	一般県道	東小浜停車場	小浜市　遠敷	0.70	2	通	委
小浜土木　合計					**0.90**			
合　計				34 箇所	**34.62**			

※沿道状況欄は　１…市街地（ＤＩＤ）、２…市街地（その他）、３…平地部、４…山地部、 通…通学路

別表１３　　除排雪を重点的に行う交差点

土木事務所等	交差点
福　井	38　箇所
三　国	9　箇所
奥　越	81　箇所
丹　南	49　箇所
鯖　丹	34　箇所
敦　賀	8　箇所
小　浜	5　箇所
計	224　箇所

別表１４　排雪指定箇所表

土木事務所	番号	排雪箇所			摘要
		地係	橋梁名	河川名	平常時・緊急時の別
福井	1	福井市　上野本町		九頭竜川　右岸	平常時
	2	福井市　篠尾町	［天神橋］	足羽川　右岸下流	平常時
	3	福井市　久喜津町	［久喜津橋］	日野川　右岸下流	緊急時
	4	福井市　西方	［板垣橋］	足羽川　右岸下流	緊急時
	5	福井市　小宇坂町	［小宇坂橋］	足羽川　左岸下流	緊急時
	6	福井市　下市町	［日光橋］	日野川　左岸下流	緊急時
	7	福井市　東下野町	［狐橋］	狐川　左岸下流	緊急時
	8	福井市　水越	［水越橋］	足羽川　左岸下流	緊急時
	9	福井市　馬垣町	［板垣橋］	足羽川　左岸上流	緊急時
	10	福井市　勝見	［木田橋］	足羽川　右岸上流	緊急時
	11	福井市　朝宮町	［朝宮橋］	日野川　左岸下流	緊急時
	12	福井市　布施田町	［布施田橋］	九頭竜川　左岸下流	緊急時
	13	福井市　稲多浜町	［九頭竜橋］	九頭竜川　右岸下流	（福井市管理） 緊急時
	14	福井市　有楽町	［花月橋］	足羽川　左岸下流	（福井市管理） 緊急時
	15	福井市　つくも２丁目	［九十九橋］	足羽川　左岸下流	（福井市管理） 緊急時
	16	福井市　郡町	［高屋橋］	九頭竜川　左岸下流	（福井市管理） 緊急時
	17	福井市　安田町	［不死鳥大橋］	日野川　左岸上流	（福井市管理） 平常時
	18	福井市　大森町	［明寺橋］	志津川　左岸下流	（福井市管理） 緊急時
	19	福井市　大瀬町	［大瀬橋］	足羽川　左岸下流	（福井市管理） 緊急時
	20	福井市　江守の里	［江守橋］	江端川　左岸下流	（福井市管理） 緊急時
	21	永平寺町　松岡上合月	［松岡河川公園］ ［五松橋］	九頭竜川　右岸下流	（永平寺町管理） 平常時
	22	永平寺町　谷口	［永平寺河川公園］	九頭竜川　左岸	（永平寺町管理） 平常時
	23	永平寺町　中島	［上志比中島河川公園］ ［市荒川大橋］	九頭竜川　左岸下流	（永平寺町管理） 平常時
三国	1	坂井市　丸岡町長畝	［長畝橋］	竹田川　左岸下流	（坂井市隣接） 平常時
	2	坂井市　春江町布施田新	［布施田橋］	九頭竜川　右岸上流	（坂井市隣接） 平常時
	3	坂井市　三国町池見	［九頭竜川浄化ｾﾝﾀｰ敷地］		緊急時
	4	坂井市　三国町錦	［旧三国土木事務所敷地］		緊急時
	5	坂井市　丸岡町宇随		九頭竜川　右岸	（坂井市隣接） 平常時(市)緊急時(県)

別表１４　排雪指定箇所表

土木事務所	番号	排雪箇所			摘要
		地係	橋梁名	河川名	平常時・緊急時の別
三国	6	坂井市　坂井町下兵庫	［新清永橋］	兵庫川　右岸下流	緊急時
	7	坂井市　丸岡町松川	［旧城東分校跡グラウンド］		（坂井市共有） 緊急時
	8	あわら市　下番	［芦原橋］	竹田川　左岸下流	平常時
	9	あわら市　御簾尾	［桑原橋］	竹田川　右岸下流	平常時
	10	あわら市　北金津	［金津橋］	竹田川　右岸下流	緊急時
奥越	1	大野市　中保	［富田大橋］	真名川　左岸200m下流	平常時
	2	大野市　菖蒲池	［君ヶ代橋］	真名川　左岸上流	平常時
	3	大野市　城町	［亀山橋］	赤根川　右岸上流	（大野市管理） 平常時
	4	勝山市　立川町	［勝山橋］	九頭竜川　右岸上流	（勝山市管理） 平常時
	5	勝山市　荒土町新保	［新保橋］	滝波川　左岸下流	平常時
	6	勝山市　下高島	［勝山南大橋］	九頭竜川　右岸上流	平常時
	7	勝山市　遅羽町比島	［勝山橋］	九頭竜川　左岸下流	平常時
	8	勝山市　北郷町坂東島	［市荒川大橋］	九頭竜川　右岸下流	緊急時
丹南	1	越前市　帆山町	［帆山橋］	日野川　右岸下流	（越前市管理） 緊急時
	2	越前市　松森町	［日野大橋］	日野川　左岸下流	（越前市管理） 平常時
	3	越前市　瓜生町	［府中大橋］	日野川　右岸下流	（越前市管理） 緊急時
	4	越前市　粟田部町	［今立大橋］	鞍谷川　左岸下流	（越前市管理） 平常時
	5	越前市　中津山町	［鴨子橋］	鞍谷川　右岸下流	（越前市管理） 平常時
	6	越前市　粟田部町	［桜大橋］	鞍谷川　左岸下流	（越前市管理） 緊急時
	7	越前市　西庄境町	［西庄境橋］	服部川　右岸上流	（越前市管理） 緊急時
	8	越前市　山室町	［山室第２橋］	月尾川　右岸　上流	（越前市管理） 緊急時
	9	越前市　中津山町	［学校橋］	鞍谷川　右岸上流	（越前市管理） 緊急時
	10	越前市　粟田部町	［富永橋］	鞍谷川　右岸下流	（越前市管理） 緊急時
	11	越前市　岩本町	［岡本橋］	岡本川　左岸下流	（越前市管理） 緊急時
	12	越前市　大滝町	［神郷橋］	岡本川　左岸下流	（越前市管理） 緊急時
	13	越前市　新堂町	［中山橋］	鞍谷川　右岸上流	（越前市管理） 緊急時
	14	南条郡南越前町　東大道	［南条大橋］	日野川　右岸下流	（南越前町管理） 平常時
	15	南条郡南越前町　今庄	［新河原橋］	日野川　左岸下流	（南越前町管理） 緊急時

別表１４　排雪指定箇所表

土木事務所	番号	排雪箇所			摘要
		地係	橋梁名	河川名	平常時・緊急時の別
丹南	16	南条郡南越前町　今庄	［大鶴目橋］	日野川　右岸上流	（南越前町管理） 平常時
	17	南条郡南越前町　今庄	［鹿蒜橋］	鹿蒜川　右岸上流	（南越前町管理） 緊急時
	18	南条郡南越前町　長沢	［長沢橋］	田倉川　左岸上流	（南越前町管理） 平常時
	19	今立郡池田町　藪田	［寺谷橋］	足羽川　右岸上流	（池田町管理） 緊急時
	20	今立郡池田町　稲荷	［新橋］	足羽川　右岸上流	（池田町管理） 平常時
	21	今立郡池田町　谷口	［谷口ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ（上流）］	足羽川　右岸上流	（池田町管理） 緊急時
	22	今立郡池田町　稲荷	［稲荷ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ（上流）］	足羽川　右岸上流	（池田町管理） 緊急時
	23	今立郡池田町　稲荷	［親水広場］	足羽川　右岸	（池田町管理） 平常時
鯖丹	1	鯖江市　石田上町	［石田橋］	日野川　左岸上流	平常時
	2	鯖江市　北野町	［吉川橋］	日野川　右岸上流	（鯖江市管理） 平常時
	3	鯖江市　平井町	［丹南橋］	日野川　左岸下流	（鯖江市管理） 緊急時
	4	鯖江市　鳥井町	［鯖江大橋］	日野川　左岸下流	平常時
	5	鯖江市　中河	［曲木橋］	浅水川　右岸下流	（鯖江市管理） 緊急時
	6	鯖江市　下河端町	［石切橋］	浅水川　左岸下流	（鯖江市管理） 緊急時
	7	鯖江市　東鯖江	［－］	穴田川　左岸	（鯖江市管理） 緊急時
	8	丹生郡越前町　気比庄	［七房橋］	天王川　右岸	（越前町管理） 緊急時
	9	丹生郡越前町　宝泉寺	［徳万橋］	天王川　右岸	緊急時
	10	丹生郡越前町　気比庄	［徳万橋］	天王川　右岸	（越前町管理） 緊急時
	11	丹生郡越前町　野末	［野末橋］	越知川　左岸	（越前町管理） 緊急時
	12	丹生郡越前町　江波	［－］	－	（越前町管理） 緊急時
敦賀	1	敦賀市和久野	［和久野橋］	黒河川　左岸下流	（敦賀市管理） 緊急時(4t車以下)
	2	敦賀市　和久野	［新和久野橋］	黒河川	緊急時
	3	敦賀市　昭和町１丁目	［三島橋］	笙の川　左岸上流	平常時
	4	敦賀市　公文名	［ふるさと黒河橋］	黒河川　左岸下流	平常時
	5	三方郡美浜町　和田	［和田橋］	耳川　下流左岸	（美浜町管理） 緊急時
	6	三方郡美浜町　南市	［藤ノ木橋］	耳川　右岸	平常時
	7	三方郡美浜町　早瀬	［早瀬橋］	早瀬漁港内	緊急時
	8	三方上中郡若狭町　井崎	［井崎橋］	はす川　右岸	緊急時
	9	三方上中郡若狭町　鳥浜	［はす川橋］	はす川　右岸	平常時
	10	三方上中郡若狭町　成出	［三方湖］	三方湖	緊急時

別表１４　排雪指定箇所表

土木事務所	番号	排雪箇所			摘要
		地係	橋梁名	河川名	平常時・緊急時の別
小浜	1	小浜市南川町		南川　左岸	（小浜市管理） 平常時（緊急時は県管理）
	2	小浜市川崎３丁目		小浜港	（小浜市管理） 緊急時
	3	大飯郡高浜町	［町有地］	若宮海水浴場前	（高浜町管理） 緊急時
	4	三方上中郡若狭町市場		市姫グラウンド駐車場	（若狭町管理） 緊急時
	5	三方上中郡若狭町麻生野		麻生野残土処分場	（若狭町管理） 緊急時
	6	大飯郡おおい町鹿野		きのこの森駐車場	（おおい町管理） 緊急時
	計	92 箇所			

別表１５

道路情報板設置箇所表(電光掲示板)

No.	路線名	地点名	設備種別
1	国道１５７号	勝山市　谷	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
2	国道１５７号	勝山市　栃神谷	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
3	国道１５７号	勝山市　寺尾	Ｂ形透光式表示板
4	国道１５７号	大野市　南新在家	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
5	国道１５７号	大野市　中据	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
6	国道１５７号	大野市　五条方	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
7	国道１５７号	大野市　中島	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
8	国道１５８号	福井市　天神	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
9	国道１５８号	福井市　薬師	ＢＬ１２型ＬＥＤ式表示板
10	国道１５８号	福井市　東川上町	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
11	国道１５８号	大野市　牛ヶ原	ＢＬ１２型ＬＥＤ式表示板
12	国道１５８号	大野市　犬山	ＢＬ１２型ＬＥＤ式表示板
13	国道１５８号	大野市　菖蒲池	ＢＬ３型ＬＥＤ式表示板
14	国道１５８号	大野市　下山	Ｂ５形透光式表示板
15	国道１５８号	大野市　板倉	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
16	国道１５８号	大野市　下半原	Ａ３形電光式表示板
17	国道１６２号	若狭町　鳥浜	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
18	国道１６２号	小浜市　和久里	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
19	国道１６２号	小浜市　湯岡	Ｂ形透光式表示板
20	国道１６２号	小浜市　甲ヶ崎	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
21	国道１６２号	おおい町　口坂本	ＢＬ３型ＬＥＤ式表示板
22	国道３０３号	若狭町　大杉	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
23	国道３０３号	若狭町　三宅	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
24	国道３０５号	あわら市　牛山	Ａ形電光式表示板
25	国道３０５号	福井市　両橋屋	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
26	国道３０５号	福井市　大味１	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
27	国道３０５号	福井市　大味２	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
28	国道３０５号	越前町　梅浦１	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
29	国道３０５号	越前町　梅浦２	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
30	国道３０５号	南越前町　河野	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
31	国道３６４号	坂井市　丸岡町鳴鹿	Ａ形電光式表示板
32	国道３６４号	坂井市　上久米田	ＢＬ１２形ＬＥＤ式表示板
33	国道３６４号	福井市　高田	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
34	国道３６４号	永平寺町　寺本	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
35	国道３６５号	越前町　江波	Ｂ形透光式表示板

別表１５

道路情報板設置箇所表(電光掲示板)

No.	路線名	地点名	設備種別
36	国道３６５号	越前市　四郎丸	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
37	国道３６５号	越前市　関ヶ鼻	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
38	国道３６５号	南越前町　孫谷	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
39	国道４１６号	勝山市　田名部	ＢＬ３形ＬＥＤ式表示板
40	国道４１７号	鯖江市　横越	Ａ形電光式表示板
41	国道４１７号	鯖江市　糺町	Ａ３形電光式表示板
42	国道４１７号	越前町　鎌坂	ＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
43	国道４１７号	池田町　板垣	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
44	国道４１７号	池田町　志津原	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
45	国道４７６号	敦賀市　余座１	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
46	国道４７６号	敦賀市　余座２	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
47	丸岡川西線	坂井市　丸岡町女形谷	ＢＬ１２形ＬＥＤ式表示板
48	丸岡川西線	坂井市　丸岡町舟寄	Ｂ形透光式表示板
49	福井四ヶ浦線	福井市　大森町	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
50	武生米ノ線	越前市　広瀬	Ｂ形透光式表示板
51	武生美山線	越前市　定友	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
52	武生美山線	池田町　野尻	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
53	大谷杉津線	敦賀市　大比田	ＢＬ１２形ＬＥＤ式表示板
54	敦賀柳ヶ瀬線	敦賀市　麻生口	Ｂ形透光式表示板
55	佐田竹波敦賀線	敦賀市　櫛川	Ｂ形透光式表示板
56	佐田竹波敦賀線	敦賀市　縄間	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
57	佐田竹波敦賀線	美浜町　北田	Ｂ形透光式表示板
58	佐田竹波敦賀線	美浜町　竹波	ＮＨＬ７形ＬＥＤ式表示板
59	三方五湖公園線	若狭町　気山	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
60	常神三方線	若狭町　海山	Ｂ形透光式表示板
61	常神三方線	若狭町　世久津	ＢＬ１３形ＬＥＤ式表示板
62	上中田烏線	小浜市　田烏	Ｂ形透光式表示板
63	小浜綾部線	おおい町　本郷	Ｂ形透光式表示板
64	小浜綾部線	おおい町　久保	Ｂ形透光式表示板
65	赤礁崎公園線	おおい町　犬見	Ｂ形透光式表示板
66	坂本高浜線	高浜町　薗部	Ｂ形透光式表示板
計	66 箇所		

別表１６　　雪 量 観 測 点 一 覧 表

土木事務所	番号	路線名	観測点地先名	観測者	摘　要	緯度	経度
福　井	1		福井市　豊島２丁目	福井地方気象台 地上気象観測所	気象台 積雪、気温		
	2		福井市　居倉町	越廼 地域気象観測システム	気象台 気温		
	3	１５８号	福井市　大宮	積雪センサー	路面 気温	36° 0′ 7.32″	136° 24′ 19.33″
	4	３６４号	吉田郡永平寺町　志比	積雪センサー	路面 気温	36° 3′ 39.42″	136° 20′ 49.92″
	5	４１６号	福井市　砂子坂	砂子坂 積雪センサー	定点 気温	36° 8′ 40.85″	136° 8′ 48.01″
	6	４１６号	吉田郡永平寺町　吉野堺	積雪センサー	路面 気温	36° 5′ 2.23″	136° 17′ 30.7″
	7	４１６号	吉田郡永平寺町　栗住波	山王 積雪センサー	定点 気温	36° 4′ 27.24″	136° 23′ 53.16″
	8	４７６号	福井市　折立	積雪センサー	路面 気温	35° 56′ 49.3″	136° 21′ 19.15″
	9	殿下福井	福井市　清水畑	積雪センサー	路面 気温	36° 1′ 58.17″	136° 6′ 4.79″
	10	篠尾勝山	福井市　皿谷	皿谷 積雪センサー	定点 気温	36° 1′ 37.93″	136° 25′ 39.61″
	11	渕上志比口	福井市　城東４丁目	福井土木事務所 積雪センサー	定点 気温	36° 3′ 28.14″	136° 14′ 27.85″
	12	上一光大丹生	福井市　上一光	上一光 積雪センサー	定点 気温	36° 4′ 1.05″	136° 5′ 28.39″
三　国	1		坂井市三国町平山	三国 地域気象観測システム	気象台 気温		
	2		坂井市春江町江留中	春江 福井航空気象観測所	気象台 気温		
	3	３６４号	坂井市丸岡町　山竹田	山竹田 積雪センサー	定点 気温	36° 10′ 16.5″	136° 19′ 54.16″
	4	３６４号	坂井市丸岡町　上久米田	積雪センサー	路面 気温	36° 7′ 7.78″	136° 19′ 4.62″
	5	三国丸岡停車場	坂井市坂井町　宮領	長畑 積雪センサー	定点 気温	36° 9′ 49.44″	136° 14′ 24.25″
	6	三国停車場桜谷	坂井市三国町　錦４丁目	旧三国土木事務所 積雪センサー	定点 気温	36° 12′ 51.25″	136° 9′ 12.6″
	7	牛の谷停車場	あわら市　下金屋	名泉郷 積雪センサー	定点 気温	36° 14′ 37.95″	136° 16′ 47.89″
奥　越	1		大野市93字蛇塚	大野 地域気象観測システム	気象台 積雪、気温		
	2		勝山市　平泉寺町	勝山 地域気象観測システム	気象台 気温		
	3		大野市貝皿	九頭竜 地域気象観測システム	気象台 積雪		
	4	１５７号	勝山市　北谷町谷	谷 積雪センサー	定点 気温	36° 7′ 29.3″	136° 34′ 51.92″
	5	１５７号	勝山市　北谷町五所ヶ原	積雪センサー	路面 気温	36° 7′ 7.46″	136° 34′ 59.66″
	6	１５７号	勝山市　村岡町暮見	積雪センサー	路面 気温	36° 5′ 2.37″	136° 31′ 22.08″
	7	１５７号	大野市　友江	奥越土木事務所 積雪センサー	定点 気温	35° 59′ 53.24″	136° 30′ 3.24″
	8	１５８号	大野市　坂戸	積雪センサー	路面 気温	35° 59′ 52.64″	136° 27′ 18.54″
	9	１５８号	大野市　西勝原	積雪センサー	定点 気温	35° 57′ 57.78″	136° 35′ 10″
	10	１５８号	大野市　下山	下山 積雪センサー	定点 気温	35° 55′ 23.23″	136° 38′ 42.5″


別表１６　　雪 量 観 測 点 一 覧 表

土木事務所	番号	路線名	観測点地先名	観測者	摘　要	緯度	経度
奥　越	11	１５８号	大野市　上半原	上半原 積雪センサー	定点 気温	35° 52′ 42.00″	136° 46′ 35.00″
	12	勝山丸岡	勝山市　滝波町１丁目	勝山維持管理課 積雪センサー	定点 気温	36° 4′ 8.91″	136° 29′ 37.54″
	13	勝山丸岡	勝山市　北郷町坂東島	積雪センサー	路面 気温	36° 5′ 16.41″	136° 23′ 26.27″
	14	大野勝山	大野市　南六呂師	南六呂師 積雪センサー	定点 気温	36° 0′ 58.06″	136° 34′ 18.62″
	15	大野勝山	勝山市　平泉寺町大矢谷	積雪センサー	路面 気温	36° 0′ 59.5″	136° 33′ 35.28″
丹　南	1		越前市　村国	武生 地域気象観測システム	気象台 積雪		
	2		南条郡南越前町　今庄	今庄 地域気象観測システム	気象台 積雪、気温		
	3	３６５号	南条郡南越前町　孫谷	積雪センサー	路面 気温	35° 44′ 39.77″	136° 10′ 34.75″
	4	４１７号	今立郡池田町　板垣	積雪センサー	路面 気温	35° 52′ 53.32″	136° 19′ 50.92″
	5	４１７号	今立郡池田町　田代	積雪センサー	定点 気温	35° 48′ 44.2″	136° 24′ 12.1″
	6	４７６号	今立郡池田町　谷口	谷口 積雪センサー	定点 気温	35° 53′ 54.82″	136° 21′ 14.58″
	7	武生米ノ	越前市　堀町	積雪センサー	路面 気温	35° 53′ 2.25″	136° 3′ 7.81″
	8	武生米ノ	越前市　千合谷町	丸岡町 積雪センサー	定点 気温	35° 53′ 19.82″	136° 1′ 38.42″
	9	武生美山	越前市　粟田部町	積雪センサー	定点 気温	35° 54′ 41.38″	136° 14′ 10.61″
	10	小曽原武生	越前市　上太田町	丹南土木事務所 積雪センサー	定点 気温	35° 54′ 5.65″	136° 9′ 4.97″
	11	菅生武生	越前市　中居	積雪センサー	路面 気温	35° 53′ 4.42″	136° 16′ 31.8″
	12	広野大門	南条郡南越前町　広野	広野 積雪センサー	定点 気温	35° 43′ 7.05″	136° 15′ 3.06″
鯖　丹	1	３６５号	丹生郡越前町　織田	織田 積雪センサー	定点 気温	35° 57′ 42.05″	136° 3′ 40.39″
	2	３６５号	丹生郡越前町　八田	積雪センサー	路面 気温	35° 55′ 21.31″	136° 7′ 18.48″
	3	４１７号	鯖江市　長泉寺町	西山 積雪センサー	定点 気温	35° 57′ 18.13″	136° 11′ 4.42″
	4	４１７号	丹生郡越前町　気比庄	丹南土木鯖江丹生土木部 積雪センサー	定点 気温	35° 58′ 35.58″	136° 8′ 15.54″
	5	別所朝日	丹生郡越前町　天谷	天谷 積雪センサー	定点 気温	36° 1′ 36.8″	136° 3′ 45.32″
	6	福井今立	鯖江市　上戸口町	上戸の口 積雪センサー	定点 気温	35° 58′ 34.35″	136° 15′ 14.44″
敦　賀	1		敦賀市　松栄	敦賀特別地域気象観測所 地上気象観測所	気象台 積雪、気温		
	2		三方郡美浜町　久々子	美浜 地域気象観測システム	気象台 気温		
	3	４７６号	敦賀市　葉原	積雪センサー	路面 気温	35° 41′ 28.43″	136° 7′ 2.42″
	4	４７６号	敦賀市　新保	積雪センサー	定点 気温	35° 42′ 20.91″	136° 7′ 55.78″
	5	敦賀美浜	敦賀市　中央町１丁目	敦賀土木事務所 積雪センサー	定点 気温	35° 38′ 34.56″	136° 3′ 23.62″
	6	敦賀柳ヶ瀬	敦賀市　刀根	刀根 積雪センサー	定点 気温	35° 36′ 16.78″	136° 8′ 51.86″
	7	松屋河原市	三方郡美浜町　新庄	新庄 積雪センサー	定点 気温	35° 33′ 54.68″	135° 58′ 19.85″
	8	三方五湖レインボーライン	三方上中郡若狭町　気山	気山 積雪センサー	定点 気温	35° 36′ 13.13″	135° 52′ 25.82″

別表１６　　雪 量 観 測 点 一 覧 表

土木事務所	番号	路線名	観測点地先名	観測者	摘　要	緯度	経度
小　浜	1		小浜市遠敷	小浜 地域気象観測システム	気象台 積雪、気温		
	2	１６２号	大飯郡おおい町　納田終	納田終 積雪センサー	定点 気温	35° 23′ 40.16″	135° 35′ 5.32″
	3	１６２号	大飯郡おおい町　久坂	積雪センサー	路面 気温	35° 23′ 56.7″	135° 40′ 54.52″
	4	３０３号	三方上中郡若狭町　熊川	積雪センサー	定点 気温	35° 26′ 14.9″	135° 54′ 42.84″
	5	小浜綾部	大飯郡おおい町　川上	川上 積雪センサー	定点 気温	35° 26′ 26.7″	135° 31′ 55.13″
	6	坂本高浜	大飯郡おおい町　福谷	積雪センサー	路面 気温	35° 27′ 15.75″	135° 33′ 8.93″
	7	舞鶴野原港高浜	大飯郡高浜町　山中	山中 積雪センサー	定点 気温	35° 31′ 0.3″	135° 27′ 29.81″
	8	上中田烏	三方上中郡若狭町　海士坂	積雪センサー	路面 気温	35° 31′ 37.09″	135° 51′ 7.27″
	9	岡田深谷	小浜市　岩井谷	上田 積雪センサー	定点 気温	35° 26′ 17.93″	135° 38′ 41.32″
計		積雪計　64 箇所（気象台観測所　7 箇所、定点（県管理）　37 箇所、路面ｾﾝｻｰ（県管理）　20 箇所） 気温計　67 箇所（気象台観測所　10 箇所、県管理　57 箇所）					

積雪センサー等設置箇所図

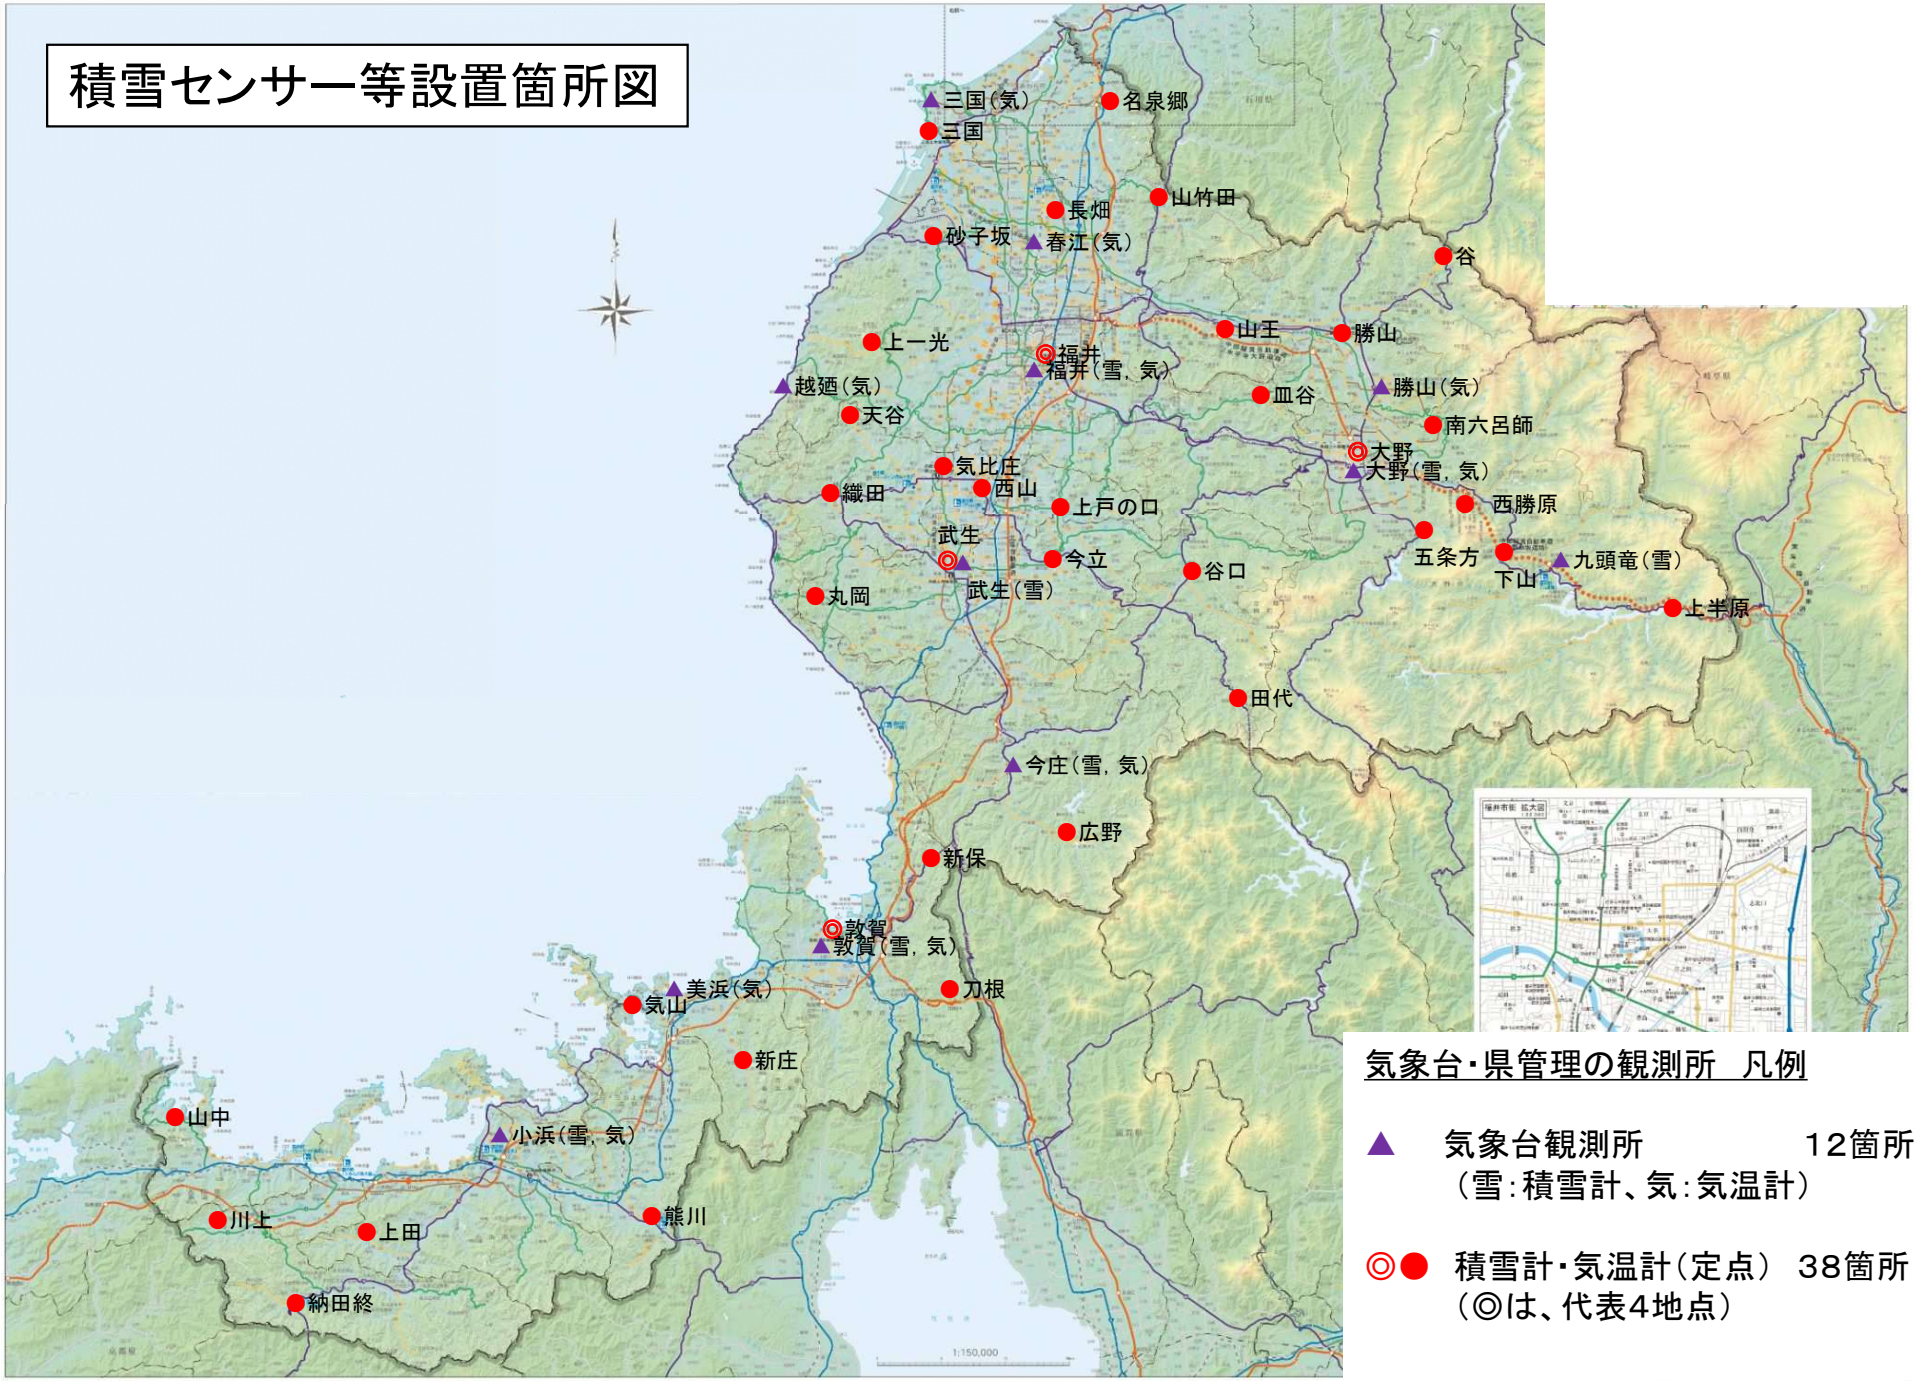

気象台・県管理の観測所　凡例

▲　気象台観測所　　12箇所
（雪：積雪計、気：気温計）

◎●　積雪計・気温計（定点）　38箇所
（◎は、代表4地点）

別表１７　　道路状況確認カメラ設置箇所表

土木事務所	番号	道路種別	路　線　名	設置箇所地先名	性能別	緯度	経度
福　井	1	一般国道	１５８号	福井市　和田東	カメラ	36.049456	136.247815
	2	一般国道	１５８号	福井市　和田中	カメラ	36.038695	136.255037
	3	一般国道	１５８号	福井市　栂野町（栂野アンダー）	カメラ	36.035743	136.257450
	4	一般国道	１５８号	福井市　篠尾町	カメラ	36.023389	136.291083
	5	一般国道	１５８号	福井市　小和清水町	カメラ	36.007466	136.351183
	6	一般国道	１５８号	福井市　薬師	カメラ	36.005797	136.384589
	7	一般国道	１５８号	福井市　縫原	カメラ 路温計	36.001317	136.406120
	8	一般国道	１５８号	福井市　川上（新道部）	カメラ 路温計	35.994995	136.442660
	9	一般国道	３０５号	福井市　両橋屋町	カメラ	36.142911	136.087019
	10	一般国道	３０５号	福井市　鮎川町	カメラ	36.103377	136.037246
	11	一般国道	３０５号	福井市　小丹生町	カメラ	36.070214	136.021420
	12	一般国道	３０５号	福井市　茱崎町	カメラ	36.045825	136.012276
	13	一般国道	３６４号	吉田郡永平寺町　宇坂大谷町	カメラ	36.048278	136.338278
	14	一般国道	３６４号	吉田郡永平寺町　志比	カメラ 路温計	36.060867	136.347210
	15	一般国道	４１６号	福井市　江上町	カメラ	36.126930	136.166204
	16	一般国道	４１６号	福井市　山室町（天菅生橋）	カメラ	36.118949	136.176225
	17	一般国道	４１６号	福井市　郡町（高屋橋）	カメラ	36.108228	136.188607
	18	一般国道	４１６号	福井市　三ツ屋町	カメラ	36.085692	136.197300
	19	一般国道	４１６号	福井市　大宮	カメラ	36.082685	136.209036
	20	一般国道	４１６号	福井市　二の宮２丁目	カメラ	36.083761	136.225828
	21	一般国道	４１６号	福井市　開発町１	カメラ	36.085119	136.239982
	22	一般国道	４１６号	福井市　開発町２	カメラ	36.085307	136.245475
	23	一般国道	４１６号	福井市　新保町	カメラ	36.085784	136.251229
	24	一般国道	４１６号	福井市　若栄町	カメラ	36.086070	136.262822
	25	一般国道	４１６号	福井市　間山町（重立アンダー）	カメラ	36.084251	136.279846
	26	一般国道	４１６号	吉田郡永平寺町　松岡吉野堺	カメラ	36.084575	136.287564
	27	一般国道	４１６号	吉田郡永平寺町　松岡春日（永平寺町役場前）	カメラ	36.091878	136.298472

別表１７　　道路状況確認カメラ設置箇所表

土木事務所	番号	道路種別	路　線　名	設置箇所地先名	性能別	緯度	経度
福　井	28	一般国道	４１６号	吉田郡永平寺町　花谷	カメラ	36.090826	136.340856
	29	一般国道	４１６号	吉田郡永平寺町　清水（道の駅禅の里）	カメラ	36.079854	136.399252
	30	一般国道	４７６号	福井市　西河原町（河原橋）	カメラ	35.959182	136.366377
	31	主要地方道	福井加賀	福井市　御幸３丁目	カメラ	36.054897	136.234068
	32	主要地方道	福井加賀	福井市　文京３丁目（福井大学北）	カメラ	36.077166	136.209840
	33	主要地方道	福井加賀	福井市　天池町	カメラ	36.108054	136.212013
	34	主要地方道	福井加賀	福井市　順化２丁目（九十九橋１）	カメラ	36.064555	136.212268
	35	主要地方道	福井加賀	福井市　順化２丁目（九十九橋２）	カメラ	36.064555	136.212268
	36	主要地方道	福井四ヶ浦	福井市　明里町	カメラ	36.060018	136.197431
	37	主要地方道	福井四ヶ浦	福井市　若杉４丁目	カメラ	36.056854	136.187612
	38	主要地方道	福井四ヶ浦	福井市　竹生町	カメラ 路温計	36.048705	136.157814
	39	主要地方道	勝山丸岡	吉田郡永平寺町　栃原（北島鮎大橋北）	カメラ	36.090091	136.376048
	40	主要地方道	鯖江美山	福井市　浄教寺町	カメラ	35.983929	136.291770
	41	主要地方道	福井今立	福井市　西大味町（戸口トンネル）	カメラ	35.984368	136.255288
	42	主要地方道	福井朝日武生	福井市　渕４丁目	カメラ	36.046749	136.186950
	43	主要地方道	福井朝日武生	福井市　島寺町	カメラ	36.024992	136.150303
	44	主要地方道	福井朝日武生	福井市　在田町	カメラ	35.992509	136.148024
	45	主要地方道	福井金津	福井市　石盛町	カメラ	36.114980	136.219516
	46	主要地方道	福井丸岡	福井市　田原１丁目	カメラ	36.073556	136.218466
	47	主要地方道	福井丸岡	福井市　春山１丁目	カメラ	36.070852	136.218298
	48	主要地方道	福井丸岡	福井市　高木町	カメラ	36.098862	136.227710
	49	主要地方道	福井丸岡	福井市　栗森町	カメラ	36.117387	136.243889
	50	一般県道	栃神谷鳴鹿森田	永平寺町　兼定島（兼定島アンダー）	カメラ	36.111878	136.281729
	51	主要地方道	福井大森河野線	福井市　大森町	カメラ	36.017858	136.118984
	52	主要地方道	清水美山線	福井市　大土呂町（文殊アンダー）	カメラ	36.008584	136.216087
	53	一般県道	殿下福井	福井市　白滝町	カメラ 路温計	36.032336	136.077690
	54	一般県道	殿下福井	福井市　光陽２丁目	カメラ	36.068754	136.197396

別表１７　　道路状況確認カメラ設置箇所表

土木事務所	番号	道路種別	路　線　名	設置箇所地先名	性能別	緯度	経度
福　井	55	一般県道	福井停車場米松	福井市　志比口２丁目（県立病院前）	カメラ	36.072366	136.240834
	56	一般県道	大畑松岡	吉田郡永平寺町　松岡兼定島（県立大学前）	カメラ	36.109508	136.279747
	57	一般県道	東郷福井	福井市　西木田（春日アンダー）	カメラ	36.052590	136.217273
	58	一般県道	三尾野別所	福井市　舞屋町	カメラ	36.034963	136.204263
	59	一般県道	上一光大丹生	福井市　上一光町	カメラ	36.067884	136.092466
	60	一般県道	鯖江浅水	福井市　三本木町（三本木アンダー）	カメラ	35.987578	136.205431
	61	一般県道	福井鯖江	福井市　西木田	カメラ	36.052371	136.214894
	62	一般県道	福井鯖江	福井市　みのり１丁目	カメラ	36.048412	136.215257
	63	一般県道	福井鯖江	福井市　花堂南１丁目	カメラ	36.034571	136.213495
	64	一般県道	福井鯖江	福井市　上江尻町	カメラ	35.990970	136.189803
	65	一般県道	福井森田丸岡	福井市　上野本町	カメラ	36.111277	136.244743
	66	一般県道	福井森田丸岡	福井市　高柳2丁目	カメラ	36.098309	136.245584
三　国	67	一般国道	３０５号	あわら市　吉崎	カメラ	36.288484	136.250497
	68	一般国道	３０５号	坂井市三国町　山岸	カメラ	36.191408	136.138488
	69	一般国道	３６４号	坂井市丸岡町　上久米田交差点	カメラ	36.109632	136.319565
	70	一般国道	３６４号	坂井市丸岡町　上久米田	カメラ 路温計	36.120604	136.316330
	71	一般国道	３６４号	坂井市丸岡町　山竹田	カメラ	36.176041	136.338849
	72	一般国道	３６４号	坂井市丸岡町　山竹田	カメラ 路温計	36.172454	136.332860
	73	一般国道	３６４号	坂井市丸岡町　上竹田	カメラ	36.149427	136.328594
	74	主要地方道	福井加賀	坂井市春江町　西長田１	カメラ	36.155818	136.202773
	75	主要地方道	福井加賀	坂井市春江町　西長田２	カメラ	36.155818	136.202773
	76	主要地方道	福井加賀	あわら市　下番	カメラ	36.206673	136.190767
	77	主要地方道	福井加賀	あわら市　田中々１（芦原小）	カメラ	36.219940	136.192304
	78	主要地方道	福井加賀	あわら市　田中々２（芦原小）	カメラ	36.219940	136.192304
	79	主要地方道	芦原丸岡	あわら市　東温泉二丁目（番田踏切）	カメラ	36.219194	136.201861
	80	主要地方道	芦原丸岡	坂井市坂井町　御油田	カメラ 路温計	36.170222	136.252500
	81	主要地方道	芦原丸岡	坂井市丸岡町　一本田福所	カメラ	36.159806	136.263168

別表１７　　道路状況確認カメラ設置箇所表

土木事務所	番号	道路種別	路　線　名	設置箇所地先名	性能別	緯度	経度
三　国	82	主要地方道	丸岡川西	坂井市丸岡町　山久保	カメラ	36.169213	136.292600
	83	主要地方道	丸岡川西	坂井市丸岡町　一本田（一本田交差点）	カメラ	36.146721	136.264390
	84	主要地方道	勝山丸岡	坂井市丸岡町　友末	カメラ	36.115571	136.298315
	85	主要地方道	三国春江	坂井市三国町　池見１	カメラ	36.178841	136.166989
	86	主要地方道	三国春江	坂井市三国町　池見２	カメラ	36.178841	136.166989
	87	主要地方道	福井金津	坂井市坂井町　東長田	カメラ 路温計	36.152705	136.219178
	88	主要地方道	福井金津	坂井市坂井町　下関（下関交差点）	カメラ	36.193094	136.222196
	89	主要地方道	福井金津	あわら市　花乃杜一丁目（坂ノ下南交差点）	カメラ	36.216837	136.220139
	90	主要地方道	福井金津	あわら市　山十楽（山十楽交差点）	カメラ	36.239509	136.229749
	91	主要地方道	福井金津	あわら市　吉崎（吉崎交差点）	カメラ	36.287590	136.255628
	92	主要地方道	福井丸岡	坂井市丸岡町　南横地（南横地交差点）	カメラ	36.125571	136.249886
	93	主要地方道	金津インター	あわら市　熊坂	カメラ	36.237040	136.286617
	94	主要地方道	金津インター	あわら市　下金屋（金津IC交差点）	カメラ	36.236778	136.283585
	95	主要地方道	丸岡インター	坂井市丸岡町　八ツ口	カメラ	36.142405	136.264829
	96	主要地方道	丸岡インター	坂井市丸岡町　猪爪	カメラ 路温計	36.141611	136.276722
	97	主要地方道	丸岡インター	坂井市丸岡町　猪爪（丸岡IC交差点）	カメラ	36.141662	136.276539
	98	一般県道	三国丸岡停車場	坂井市坂井町　上兵庫（上兵庫交差点）	カメラ	36.167004	136.220300
	99	一般県道	栃神谷鳴鹿森田	坂井市丸岡町　今市（磯部島交差点）	カメラ	36.115454	136.276034
	100	一般県道	芦原温泉停車場中川	あわら市菅野（菅野アンダー）	カメラ	36.211722	136.235321
	101	一般県道	牛ノ谷停車場	あわら市下金屋	カメラ	36.238099	136.280979
	102	一般県道	板倉高江	坂井市春江町中筋（中筋アンダー）	カメラ	36.126324	136.228045
	103	一般県道	金津丸岡	あわら市中川	カメラ	36.196333	136.273722
奥　越	104	一般国道	１５７号	勝山市　北谷町　谷	カメラ	36.128538	136.579988
	105	一般国道	１５７号	勝山市　北谷町　小原	カメラ 路温計	36.092041	136.587580
	106	一般国道	１５７号	勝山市　村岡町　暮見	カメラ	36.085037	136.524566
	107	一般国道	１５７号	勝山市　長山町	カメラ	36.069481	136.507539
	108	一般国道	１５７号	勝山市　遅羽町　下荒井	カメラ	36.022250	136.514194

別表１７　　道路状況確認カメラ設置箇所表

土木事務所	番号	道路種別	路　線　名	設置箇所地先名	性能別	緯度	経度
奥　越	109	一般国道	１５７号	大野市　南新在家	カメラ 路温計	36.015452	136.512392
	110	一般国道	１５７号	大野市　中据	カメラ	35.954315	136.514512
	111	一般国道	１５８号	大野市　牛ヶ原（西）	カメラ 路温計	35.996367	136.457330
	112	一般国道	１５８号	大野市　牛ヶ原（東）	カメラ	35.993500	136.469972
	113	一般国道	１５８号	大野市　犬山	カメラ	35.987111	136.475111
	114	一般国道	１５８号	大野市　蕨生	カメラ	35.973947	136.552683
	115	一般国道	１５８号	大野市　西勝原	カメラ 路温計	35.967899	136.592850
	116	一般国道	１５８号	大野市　勝原	カメラ	35.964980	136.600803
	117	一般国道	１５８号	大野市　下山	カメラ	35.922179	136.643933
	118	一般国道	１５８号	大野市　朝日	カメラ 路温計	35.905399	136.668232
	119	一般国道	１５８号	大野市　下半原	カメラ	35.878573	136.763180
	120	一般国道	４１６号	勝山市　荒土町松田	カメラ	36.077478	136.473190
	121	主要地方道	勝山丸岡	勝山市　北郷町坂東島	カメラ 路温計	36.081983	136.415510
	122	主要地方道	大野勝山	大野市　南六呂師	カメラ 路温計	36.016356	136.571493
	123	一般県道	五条方松原出勝山	大野市　上野	カメラ 路温計	35.990904	136.540704
	124	一般県道	皿谷大野線	大野市　陽明町3丁目	カメラ	35.990947	136.498505
	125	一般県道	勝山インター	勝山市　鹿谷町発坂	カメラ	36.063988	136.466789
丹　南 (鯖江丹生含む)	126	一般国道	３０５号	丹生郡越前町　梅浦１	カメラ	35.953184	135.984256
	127	一般国道	３０５号	丹生郡越前町　梅浦２	カメラ	35.956424	135.978990
	128	一般国道	３０５号	丹生郡越前町　午房ヶ平	カメラ	35.876330	136.006740
	129	一般国道	３０５号	南条郡南越前町　河野	カメラ	35.824787	136.070743
	130	一般国道	３０５号	南条郡　南越前町　赤萩	カメラ	35.823572	136.084690
	131	一般国道	３０５号	南条郡南越前町　河内	カメラ	35.817468	136.102376
	132	一般国道	３０５号	南条郡南越前町　奥野々	カメラ	35.810505	136.151090
	133	一般国道	３０５号	南条郡南越前町　大谷	カメラ	35.781265	136.098368
	134	一般国道	３０５号	南条郡南越前町　大谷２	カメラ	35.784691	136.095966
	135	一般国道	３６５号	丹生郡越前町　江波	カメラ	35.941694	136.075611

別表１７　　道路状況確認カメラ設置箇所表

土木事務所	番号	道路種別	路　線　名	設置箇所地先名	性能別	緯度	経度
丹　南	136	一般国道	３６５号	丹生郡越前町　上山中	カメラ 路温計	35.956634	136.017230
(鯖江丹生含む)	137	一般国道	３６５号	丹生郡越前町　八田	カメラ	35.921878	136.114019
	138	一般国道	３６５号	越前市　四郎丸町	カメラ	35.875715	136.165944
	139	一般国道	３６５号	南条郡南越前町　鯖波１	カメラ 路温計	35.816619	136.198590
	140	一般国道	３６５号	南条郡南越前町　鯖波２	カメラ	35.822563	136.200378
	141	一般国道	３６５号	南条郡南越前町　大門	カメラ 路温計	35.754741	136.201030
	142	一般国道	３６５号	南条郡　南越前町　孫谷	カメラ	35.744375	136.176405
	143	一般国道	３６５号	南条郡　南越前町　板取	カメラ	35.733564	136.160260
	144	一般国道	４１７号	今立郡池田町　板垣	カメラ 路温計	35.881525	136.331244
	145	一般国道	４１７号	越前市 南坂下町	カメラ	35.895035	136.291485
	146	一般国道	４１７号	鯖江市　北野町	カメラ	35.963917	136.175768
	147	一般国道	４１７号	鯖江市　川去町	カメラ 路温計	35.973476	136.145520
	148	一般国道	４１７号	岐阜県　揖斐郡　揖斐川　町塚	カメラ	35.765441	136.410813
	149	一般国道	４１７号	今立郡　池田町　田代	カメラ	35.812278	136.403306
	150	一般国道	４１７号	今立郡　池田町　河内	カメラ	35.840028	136.387611
	151	一般国道	４１７号	今立郡　池田町　河内	カメラ	35.825972	136.388889
	152	一般国道	４１７号	今立郡　池田町　志津原	カメラ	35.861778	136.363056
	153	一般国道	４７６号	今立郡池田町　白栗	カメラ 路温計	35.939824	136.360900
	154	一般国道	４７６号	南条郡　南越前町　上板取	カメラ	35.718109	136.153631
	155	主要地方道	武生美山	越前市　粟田部町	カメラ	35.911623	136.238703
	156	主要地方道	武生美山	今立郡池田町　清水谷	カメラ	35.916306	136.335285
	157	主要地方道	武生美山	越前市　相木町	カメラ	35.935166	136.305040
	158	主要地方道	福井大森河野	丹生郡越前町　下糸生（野田）	カメラ 路温計	35.988056	136.090444
	159	主要地方道	武生米ノ	越前市　広瀬町	カメラ 路温計	35.890610	136.143926
	160	主要地方道	武生米ノ	越前市　丸岡町	カメラ 路温計	35.880129	136.059450
	161	主要地方道	福井今立	鯖江市　中戸口町	カメラ 路温計	35.967083	136.249778
	162	主要地方道	福井朝日武生	丹生郡越前町　田中	カメラ	35.987056	136.148070
	163	主要地方道	福井朝日武生	鯖江市下野田町	カメラ	35.946862	136.147082

別表１７　　道路状況確認カメラ設置箇所表

土木事務所	番号	道路種別	路　線　名	設置箇所地先名	性能別	緯度	経度
丹　南（鯖江丹生含む）	164	主要地方道	鯖江インター	鯖江市　柳町	カメラ	35.949340	136.193189
	165	主要地方道	鯖江インター	鯖江市　横越町	カメラ	35.949598	136.200450
	166	主要地方道	武生インター	越前市　葛岡町	カメラ	35.902032	136.192132
	167	主要地方道	武生インター	越前市　庄町１（武生インター）	カメラ	35.902256	136.197778
	168	主要地方道	武生インター	越前市　庄町２（武生インター）	カメラ	35.901997	136.198605
	169	一般県道	鯖江織田	鯖江市　石生谷町	カメラ 路温計	35.943873	136.139860
	170	一般県道	別所朝日	福井市　宿堂町	カメラ	36.028353	136.062462
	171	一般県道	菅生武生線	今立郡池田町　魚見	カメラ 路温計	35.863268	136.286430
	172	一般県道	菅生武生線	越前市　入谷町	カメラ	35.876545	136.290410
	173	一般県道	福井鯖江	越前市　家久町	カメラ 路温計	35.932463	136.163925
敦　賀	174	一般国道	４７６号	敦賀市　新保	カメラ	35.705293	136.132490
	175	一般国道	４７６号	敦賀市　葉原	カメラ 路温計	35.692701	136.125190
	176	一般国道	４７６号	敦賀市　田尻	カメラ	35.684398	136.114679
	177	一般国道	４７６号	敦賀市　余座	カメラ	35.651320	136.089156
	178	主要地方道	佐田竹波敦賀	美浜町　竹波	カメラ	35.685926	135.978770
	179	主要地方道	佐田竹波敦賀	美浜町　菅浜（菅浜黒藤トンネル）	カメラ	35.663420	135.976601
	180	主要地方道	敦賀市停車場	敦賀市　白銀	カメラ	35.647306	136.072417
	181	一般県道	敦賀柳ヶ瀬	敦賀市　刀根	カメラ 路温計	35.602907	136.135950
	182	一般県道	竹波立石縄間	敦賀市　浦底	カメラ	35.740855	136.022612
	183	一般県道	大谷杉津	敦賀市　元比田	カメラ	35.752276	136.101048
	184	一般県道	大谷杉津	敦賀市　大比田	カメラ	35.744370	136.103500
	185	一般県道	松屋河原市	美浜町　新庄	カメラ	35.538449	135.980760
	186	一般県道	常神三方	三方上中郡　若狭町　小川	カメラ	35.607770	135.843160
	187	一般県道	常神三方	三方上中郡　若狭町　海山	カメラ	35.585601	135.866640
	188	一般県道	敦賀美浜	敦賀市　金山	カメラ	35.625131	136.033830
	189	一般県道	敦賀美浜	美浜町　佐田	カメラ 路温計	35.627370	136.001760
	190	一般県道	レインボーライン	美浜町　梅丈ヶ岳	カメラ	35.602087	135.870128

別表１７　　道路状況確認カメラ設置箇所表

土木事務所	番号	道路種別	路　線　名	設置箇所地先名	性能別	緯度	経度
敦　賀	191	一般県道	レインボーライン	美浜町　日向	カメラ	35.600695	135.896232
小　浜	192	一般国道	１６２号	大飯郡おおい町　名田庄納田終	カメラ 路温計	35.395964	135.584890
	193	一般国道	１６２号	小浜市　深野	カメラ	35.419390	135.683537
	194	一般国道	１６２号	小浜市　駅前町	カメラ	35.492183	135.745319
	195	一般国道	１６２号	小浜市　阿納	カメラ	35.532887	135.771498
	196	一般国道	１６２号	小浜市　矢代	カメラ	35.525942	135.808103
	197	一般国道	３０３号	三方上中郡若狭町　熊川	カメラ 路温計	35.437456	135.911898
	198	主要地方道	小浜綾部	大飯郡おおい町　岡田	カメラ	35.464333	135.614161
	199	主要地方道	小浜綾部	大飯郡おおい町　川上	カメラ	35.440889	135.519774
	200	主要地方道	坂本高浜	大飯郡おおい町　福谷	カメラ 路温計	35.452362	135.555665
	201	主要地方道	坂本高浜	大飯郡高浜町　薗部	カメラ	35.483634	135.556508
	202	主要地方道	舞鶴野原港高浜	大飯郡高浜町　鎌倉	カメラ	35.516746	135.458040
	203	主要地方道	上中田烏	三方上中郡若狭町　下吉田	カメラ	35.470645	135.866663
	204	主要地方道	上中田烏	三方上中郡若狭町　安賀里	カメラ	35.475885	135.872509
	205	主要地方道	上中田烏	三方上中郡若狭町　三田	カメラ	35.515653	135.866357
	206	主要地方道	上中田烏	三方上中郡若狭町　上黒田	カメラ 路温計	35.516258	135.865670
	207	主要地方道	小浜上中	小浜市　和久里	カメラ	35.491898	135.766686
	208	一般県道	音海中津海	大飯郡高浜町　音海	カメラ	35.521390	135.512100
	209	一般県道	音海中津海	大飯郡高浜町　田ノ浦（上り）	カメラ	35.521156	135.513405
	210	一般県道	音海中津海	大飯郡高浜町　田ノ浦（下り）	カメラ	35.521156	135.513405
	211	一般県道	赤礁埼公園	大飯郡おおい町　犬見	カメラ	35.488901	135.626023
	212	一般県道	赤礁埼公園	大飯郡おおい町　大島	カメラ	35.504920	135.635596
	213	一般県道	小浜インター線	小浜市　和久里	カメラ	35.486476	135.762968
	214	一般県道	赤礁埼公園	大飯郡おおい町　犬見（新大島トンネル）	カメラ	35.496491	135.620287
設置箇所数計			214　箇所	カメラ・路温計設置箇所数　38　箇所 カメラのみの設置箇所数　176　箇所			

道路状況確認カメラ設置箇所表(他機関)

機関	番号	路　線　名	設置箇所地先名	緯度	経度
福井河川	1	国道8号	牛ノ谷	36.2606	136.2875
	2	国道8号	熊坂除雪基地	36.2356	136.2867
	3	国道8号	熊坂南	36.2261	136.2821
	4	国道8号	東田中	36.1926	136.2679
	5	国道8号	下荒井	36.0244	136.2183
	6	国道8号	御幸	35.9806	136.1958
	7	国道8号	長泉寺	35.9554	136.1888
	8	国道8号	行松	35.8782	136.1700
	9	国道8号	白崎	35.8680	136.1527
	10	国道8号	河野	35.7961	136.0926
	11	国道8号	第1トンネル福井側	35.7925	136.0928
	12	国道8号	敦賀トンネル福井側	35.7714	136.1061
	13	国道8号	杉津除雪基地	35.7425	136.1023
	14	国道8号	赤崎	35.6891	136.0820
	15	国道8号	赤崎ﾁｪｰﾝ脱着場	35.6821	136.0857
	16	国道8号	岡山交差点	35.6315	136.0711
	17	国道8号	田結トンネル敦賀側	35.6654	136.0890
	18	国道8号	疋田	35.6027	136.1006
	19	国道8号	新道北	35.5900	136.1239
	20	国道27号	気山中山	35.5764	135.9094
	21	国道27号	倉見峠	35.4794	135.9022
	22	国道27号	三宅	35.4630	135.8631
	23	国道27号	湯の岡	35.4889	135.7564
	24	国道27号	関屋	35.4837	135.4897
	25	国道27号	六路谷	35.4810	135.4768
	26	国道27号	青葉	35.4850	135.4728
	27	国道158号	福井北IC	36.0861	136.2836
	28	国道158号	越坂トンネル福井側	36.0808	136.2997
	29	国道158号	諏訪間	36.0806	136.3136
	30	国道158号	永平寺IC	36.0878	136.3274
	31	国道158号	永平寺雪寒基地	36.0877	136.3282
	32	国道158号	浅見トンネル福井側	36.0794	136.3636
	33	国道158号	浅見トンネル大野側	36.0742	136.3753
	34	国道158号	上志比IC	36.0786	136.3847
	35	国道158号	栗住波第1高架	36.0714	136.3917
	36	国道158号	栗住波第2高架	36.0694	136.3969
	37	国道158号	石上	36.0683	136.4044
	38	国道158号	吉峰トンネル福井側	36.0678	136.4267

道路状況確認カメラ設置箇所表(他機関)

機関	番号	路　線　名	設置箇所地先名	緯度	経度
福井河川	39	国道158号	吉峰トンネル大野側	36.0625	136.4453
	40	国道158号	保田トンネル福井側	36.0603	136.4522
	41	国道158号	保田トンネル大野側	36.0611	136.4567
	42	国道158号	勝山IC	36.0644	136.4664
	43	国道158号	杉俣トンネル福井側	36.0594	136.4708
	44	国道158号	杉俣トンネル大野側	36.0547	136.4739
	45	国道158号	大袋トンネル福井側	36.0489	136.4772
	46	国道158号	大袋トンネル大野側	36.0364	136.4817
	47	国道158号	小矢戸トンネル福井側	36.0331	136.4828
	48	国道158号	小矢戸トンネル大野側	36.0183	136.4892
	49	国道158号	大野IC	36.0036	136.5058
	50	国道158号	中津川	36.0004	136.5029
	51	国道158号	横枕	35.9986	136.5075
	52	国道158号	堂本	35.9967	136.5127
	53	国道158号	下麻生嶋	35.9951	136.5181
	54	国道158号	川嶋	35.9923	136.5221
	55	国道158号	上麻生嶋	35.9895	136.5267
	56	国道158号	田野	35.9870	136.5315
	57	国道158号	新塚原1	35.9840	136.5354
	58	国道158号	新塚原2	35.9817	136.5402
	59	国道158号	蕨生	35.9794	136.5451
	60	国道158号	七坂	35.9770	136.5496
	61	国道158号	蕨生1	35.9745	136.5531
	62	国道158号	荒島IC	35.9738	136.5510
	63	国道158号	蕨生2	35.9718	136.5576
	64	国道158号	蕨生3	35.9695	136.5625
	65	国道158号	蕨生4	35.9695	136.5668
	66	国道158号	荒島第1トンネル福井側	35.9690	136.5698
	67	国道158号	荒島第1トンネル1	35.9677	136.5724
	68	国道158号	荒島第1トンネル2	35.9663	136.5749
	69	国道158号	荒島第1トンネル3	35.9648	136.5781
	70	国道158号	荒島第1トンネル4	35.9639	136.5826
	71	国道158号	荒島第1トンネル5	35.9637	136.5866
	72	国道158号	荒島第1トンネル6	35.9639	136.5915
	73	国道158号	荒島第1トンネル7	35.9649	136.5957
	74	国道158号	荒島第2トンネル福井側	35.9647	136.6006
	75	国道158号	勝原IC	35.9652	136.6029
	76	国道158号	荒島第2トンネル1	35.9616	136.6036
	77	国道158号	荒島第2トンネル2	35.9597	136.6047
	78	国道158号	荒島第2トンネル3	35.9578	136.6057
	79	国道158号	荒島第2トンネル4	35.9528	136.6079
	80	国道158号	荒島第2トンネル5	35.9466	136.6113

道路状況確認カメラ設置箇所表(他機関)

機関	番号	路　線　名	設置箇所地先名	緯度	経度
福井河川	81	国道158号	荒島第2トンネル6	35.9405	136.6146
	82	国道158号	荒島第2トンネル7	35.9337	136.6182
	83	国道158号	荒島第2トンネル8	35.9281	136.6214
	84	国道158号	荒島第2トンネル9	35.9252	136.6231
	85	国道158号	荒島第2岐阜側	35.9199	136.6276
	86	国道158号	下山福井側	35.9190	136.6294
	87	国道158号	下山IC	35.9188	136.6313
	88	国道158号	下山TN	35.9176	136.6340
	89	国道158号	九頭竜福井側	35.9171	136.6379
	90	国道158号	九頭竜トンネル1	35.9170	136.6421
	91	国道158号	九頭竜トンネル2	35.9160	136.6463
	92	国道158号	九頭竜トンネル3	35.9148	136.6541
	93	国道158号	九頭竜トンネル4	35.9133	136.6624
	94	国道158号	九頭竜岐阜側	35.9122	136.6685
	95	国道158号	九頭竜IC1	35.9128	136.6672
	96	国道158号	九頭竜IC2	35.9111	136.6668
	97	国道161号	疋田	35.5957	136.0991
	98	国道161号	駄口	35.5856	136.1033
	99	国道161号	山中	35.5406	136.0975
金沢河川	100	国道8号	牛ノ谷	36.2614	136.2877
岐阜国道	101	国道158号	東市布	35.8707	136.8189
	102	国道158号	向小駄良	35.8764	136.8299
中日本高速	1	北陸自動車道路	金津IC	36.2370	136.2802
	2	北陸自動車道路	福井北IC	36.0863	136.2790
	3	北陸自動車道路	北鯖江PA	35.9721	136.2037
	4	北陸自動車道路	南条SA	35.8257	136.2020
	5	北陸自動車道路	杉津PA下り	35.7324	136.1147
	6	北陸自動車道路	敦賀市北部	35.6855	136.1163
	7	北陸自動車道路	敦賀IC	35.6206	136.1040
	8	北陸自動車道路	刀根PA	35.6035	136.1514
	9	北陸自動車道路	滋賀県境	35.5429	136.2099
	10	北陸自動車道路	賤ヶ岳SA	35.5194	136.2174
西日本高速	1	舞鶴若狭自動車道	加斗PA	35.4802	135.6730
	2	舞鶴若狭自動車道	大飯高浜-小浜西間	35.4460	135.6012
	3	舞鶴若狭自動車道	大飯高浜IC付近	35.4499	135.5526
	4	舞鶴若狭自動車道	舞鶴東-大飯高浜間	35.4714	135.5017

道路状況確認カメラ設置箇所表(他機関)

機関	番号	路　線　名	設置箇所地先名	緯度	経度
市町	1	(主19)武生米ノ	越前町米ノ	35.8900	136.0006
	2	沖田笈松線	越前町笈松	35.9818	136.0423
	3	鯖江駅東線	鯖江市東鯖江3丁目	35.9429	136.1971
	4	鯖江河和田線	鯖江市川島町	35.9484	136.2409
	5	染南線	鯖江市下河端町	35.9686	136.1968
	6	片上落井線	鯖江市大野町	35.9709	136.2296
	7	丹南広域道西線	鯖江市二丁掛町	35.9558	136.1594
	8	染南線	鯖江市神中町	35.9709	136.1886
	9	北中戸口線	鯖江市河和田町	35.9495	136.2692
	10	瀬戸・芋ヶ平線	南越前町瀬戸	35.7993	136.2935
	11	長沢・中小屋線	南越前町長沢	35.7955	136.2380
	12	上新道・敦賀線	南越前町新道	35.7596	136.1662
	13	橋立道線	南越前町橋立	35.7244	136.2387
	14	町道下ノゾキ線	南越前町上平吹	35.8501	136.1800
	15	町道東塚線	南越前町牧谷	35.8334	136.2008
	16	舞鶴野原港高浜線	高浜町山中	35.5192	135.4684
	17	舞鶴野原港高浜線	高浜町鎌倉	35.5164	135.4582
	18	舞鶴野原港高浜線	高浜町小和田	35.4901	135.5087
	19	高浜港高浜停車場線	高浜町中央	35.4867	135.5474
	20	畑若狭和田停車場線	高浜町和田	35.4901	135.5807
	21	南山手線	高浜町畑	35.4877	135.5357
滋賀県	1	国道303号	八田部	35.5062	136.1423
	2	国道303号	黒山	35.4976	136.1067
	3	国道303号	野口	35.4973	136.0899
	4	国道303号	水坂TN東	35.4232	135.9484
	5	国道303号	杉山	35.4330	135.9326
	6	国道303号	寒風TN西	35.4358	135.9186

設置箇所集計

国土交通省	102
NEXCO中日本	10
NEXCO西日本	4
市町	21
他府県	6
合計	143

※画像提供箇所を記載

別表１８

除雪機械配備一覧表（平常時）

（単位:台）

機械 / 土木等	車道用除雪機械																	
	ロータリー除雪車			除雪トラック			グレーダ			除雪ドーザ			トラクター ショベル			小　計		
	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計
福井土木	10	4	14	19	3	22	8	17	25	8	24	32	0	30	30	45	78	123
三国土木	2	3	5	12	2	14	3	4	7	4	8	12	0	25	25	21	42	63
奥越土木	10	22	32	10	14	24	4	0	4	15	50	65	0	23	23	39	109	148
丹南土木	11	0	11	9	1	10	2	1	3	19	5	24	0	27	27	41	34	75
鯖江丹生	3	0	3	4	0	4	1	0	1	13	3	16	0	17	17	21	20	41
敦賀土木	4	0	4	11	0	11	0	1	1	8	0	8	0	9	9	23	10	33
小浜土木	4	1	5	10	2	12	1	3	4	5	3	8	0	9	9	20	18	38
合　計	44	30	74	75	22	97	19	26	45	72	93	165	0	140	140	210	311	521

（単位:台）

機械 / 土木等	歩道用除雪機械			薬剤散布機械			その他機械									合　計		
	小型除雪機械			凍結防止剤散布車			ダンプトラック			その他			小　計					
	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計
福井土木	10	10	20	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	91	153
三国土木	7	4	11	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	47	78
奥越土木	7	25	32	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	134	185
丹南土木	7	5	12	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	39	92
鯖江丹生	7	0	7	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	20	53
敦賀土木	5	2	7	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	12	43
小浜土木	2	2	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	20	46
合　計	45	48	93	32	4	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	363	650

別表１９

除雪機械配備一覧表（緊急時）

（単位:台）

機械／土木等	車道用除雪機械																	
	ロータリー除雪車			除雪トラック			グレーダ			除雪ドーザ			トラクター ショベル			小　計		
	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計
福井土木	10	7	17	19	4	23	8	20	28	8	50	58	0	105	105	45	186	231
三国土木	2	10	12	12	3	15	3	6	9	4	10	14	0	68	68	21	97	118
奥越土木	10	33	43	10	15	25	4	3	7	15	97	112	0	69	69	39	217	256
丹南土木	11	0	11	9	3	12	2	5	7	19	13	32	0	57	57	41	78	119
鯖江丹生	3	1	4	4	0	4	1	2	3	13	0	13	0	31	31	21	34	55
敦賀土木	4	0	4	11	0	11	0	1	1	8	3	11	0	86	86	23	90	113
小浜土木	4	1	5	10	7	17	1	1	2	5	1	6	0	24	24	20	34	54
合　計	44	52	96	75	32	107	19	38	57	72	174	246	0	440	440	210	736	946

（単位:台）

機／十木等	歩道用除雪機械			薬剤散布機械			その他機械									合　計		
	小型除雪機械			凍結防止剤散布車			ダンプトラック			その他			小　計					
	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計	県有車	委託車	計
福井土木	10	12	22	7	4	11	0	316	316	0	99	99	0	415	415	62	617	679
三国土木	7	7	14	3	1	4	0	78	78	0	110	110	0	188	188	31	293	324
奥越土木	7	40	47	5	0	5	0	250	250	0	118	118	0	368	368	51	625	676
丹南土木	7	5	12	5	0	5	0	100	100	0	43	43	0	143	143	53	226	279
鯖江丹生	8	2	10	6	0	6	0	60	60	0	43	43	0	103	103	35	139	174
敦賀土木	5	2	7	3	0	3	0	55	55	0	38	38	0	93	93	31	185	216
小浜土木	2	2	4	4	1	5	0	61	61	0	11	11	0	72	72	26	109	135
合　計	46	70	116	33	6	39	0	920	920	0	462	462	0	1382	1382	289	2194	2483

資料１

福井県除雪対策本部および福井県道路雪害対策本部の事務分担内容

◎「福井県冬期道路情報連絡室」の設置について

土木部長は、県内の主要幹線道路において、大雪により交通事故や立ち往生等が発生し、大規模な交通障害の発生が懸念される場合、「福井県冬期道路情報連絡室」の国の招集指示に従い、福井河川国道事務所へ連絡室員を１名以上派遣する。

◎　除雪対策本部（平常体制）

１）対策本部事務局（道路保全課）

（１）企画班

①　総務全般に関すること。
②　対策本部の運営に関すること。
③　予算経理に関すること。(実施部への予算執行の指導を含む)
④　部内および各関係機関との連絡調整。
⑤　報道関係機関との連絡調整。
⑥　その他、他の班の職務に属さない事項。

（２）実施指導班

①　実施部との連絡調整。
②　国土交通省（本省、近畿地方整備局）への報告および報告に関する情報の収集。
③　対策本部から実施部への伝達および指示に関すること。
④　実施部への作業（除雪・排雪・凍結防止）の指導。
⑤　気象情報の収集。
⑥　待機命令の指示。
⑦　実施部の作業内容および除雪機械の出動状況把握。
⑧　鉄道事業者との除雪作業に関する連絡調整。

（３）情報連絡班

①　実施部への通行規制の指導。
②　事故等交通状況に関する情報の把握。
（県管理道路のほか直轄道路、各高速道路(株)所管道路の情報把握を含む。）
③　交通確保計画に関すること。
④　除雪状況・交通状況の広報。
⑤　実施部への道路情報板掲示の指導。
⑥　県管理道路以外の除雪状況の把握。
⑦　交通管理者との連絡調整。
⑧　「福井県冬期道路情報連絡室」との連絡調整。

２）実施部事務局（各土木事務所等）

（１）企画班

①　除雪計画書の立案、作成。
②　除雪作業の指示。

③　情報報告、資料の収集記録。
④　除雪日誌の作成。
⑤　保有除雪車両の管理、除雪車両の借り上げ、調達に関すること。
⑥　他機関との連携に関すること。

（２）情報連絡班
①　通行規制に関すること。
②　除雪状況、事故等交通状況の収集、連絡、報告および広報。
③　道路情報板への掲示。
④　県管理道路以外の除雪および交通状況の把握、報告。
⑤　交通管理者との連絡調整。

（３）機動班
①　道路パトロールに関すること。
②　降積雪、凍結状況・除雪状況の調査、報告。
③　除雪・排雪作業、凍結防止剤散布作業の指導。
④　道路上における支障物件の処理等緊急作業に関すること。
⑤　除雪パトロール日誌の作成。

（４）庶務班
①　除雪経理に関すること。
②　超勤手続き、食料調達、衣服の貸与、宿泊手続き、職員の健康管理に関すること。
③　各班の連絡調整。
④　対策本部事務局との連絡調整。
⑤　その他、他の係の職務に属さない事項。

◎　除雪対策本部（警戒準備体制）・・・指定観測点５箇所のうち１箇所でも警戒準備積雪深を超えた場合に移行

１）企画部（対策本部事務局）（道路保全課）

（１）企画班
①　総務全般に関すること。
②　対策本部の運営に関すること。
③　予算経理に関すること。
（実施部への予算執行の指導を含む。）
④　部内および各関係機関との連絡調整。
⑤　報道関係機関との連絡調整。
⑥　その他、他の班の職務に属さない事項。

（２）実施指導班
①　実施部との連絡調整。
②　国土交通省（本省、近畿地方整備局）への報告および報告に関する情報の収集。
③　対策本部から実施部への伝達および指示に関すること。
④　実施部への作業（除雪・排雪・凍結防止）の指導。
⑤　気象情報の収集。

⑥　待機命令の指示。
⑦　実施部の作業内容および除雪機械の出動状況把握。
⑧　鉄道事業者との除雪作業に関する連絡調整。

（３）情報連絡班
①　実施部への通行規制の指導。
②　事故等交通状況に関する情報の把握。
（県管理道路のほか直轄道路、各高速道路(株)所管道路の情報把握を含む。）
③　交通確保計画に関すること。
④　除雪状況・交通状況の広報。
⑤　実施部への道路情報板掲示の指導。
⑥　県管理道路以外の除雪状況の把握。
⑦　交通管理者との連絡調整。
⑧　「福井県冬期道路情報連絡室」との連絡調整。

２）実施部事務局（各土木事務所等）

（１）企画班
①　除雪計画書の立案、作成。
②　除雪作業の指示。
③　情報報告、資料の収集記録。
④　除雪日誌の作成。
⑤　保有除雪車両の管理、除雪車両の借り上げ、調達に関すること。
⑥　他機関との連携に関すること。

（２）情報連絡班
①　通行規制に関すること。
②　除雪状況、事故等交通状況の収集、連絡、報告および広報。
③　道路情報板への掲示。
④　県管理道路以外の除雪および交通状況の把握、報告。
⑤　交通管理者との連絡調整。

（３）機動班
①　道路パトロールに関すること。
②　降積雪、凍結状況・除雪状況の調査、報告。
③　除雪・排雪作業、凍結防止剤散布作業の指導。
④　道路上における支障物件の処理等緊急作業に関すること。
⑤　除雪パトロール日誌の作成。

（４）庶務班
①　除雪経理に関すること。
②　超勤手続き、食料調達、衣服の貸与、宿泊手続き、職員の健康管理に関すること。
③　各班の連絡調整。
④　対策本部事務局との連絡調整。
⑤　その他、他の係の職務に属さない事項。

3）各課連絡責任者会議

警戒準備体制への移行時に設置する会議で、本部長、副本部長、企画部長、土木部各課長をもって構成する。業務内容は、警戒準備体制への移行、解散等指示事項に関して決定する。

（1）土木部政策推進Ｇ：予算、経理の指導および土木部内の連絡調整に関すること。

（2）道路建設課・高規格道路課：直轄道路、各高速道路(株)所管道路、市町道の除雪状況の把握に関すること。

（3）土木部各課：各課所管施設に対する雪害状況の把握に関すること。

◎道路雪害対策本部（警戒・緊急体制）・・・指定観測点５箇所のうち３箇所が警戒積雪深を超えた場合、知事が近畿地方整備局長と協議した上で移行

1）企画部（対策本部事務局）（道路保全課）

（1）企画班

① 総務全般に関すること。

② 対策本部の運営に関すること。

③ 予算経理に関すること。
（実施部への予算執行の指導を含む。）

④ 部内および各関係機関との連絡調整。

⑤ 報道関係機関との連絡調整。

⑥ 福井県災害対策連絡室との連絡調整。

⑦ その他、他の班の職務に属さない事項。

（2）実施指導班

① 実施部との連絡調整。

② 国土交通省（本省、近畿地方整備局）への報告および報告に関する情報の収集。

③ 対策本部から実施部への伝達および指示に関すること。

④ 実施部への作業（除雪・排雪・凍結防止）の指導。

⑤ 気象情報の収集。

⑥ 待機命令の指示。

⑦ 実施部の作業内容および除雪機械の出動状況把握。

⑧ 鉄道事業者との除雪作業に関する連絡調整。

⑨ 国土交通省視察団、調査団への要望資料（県管理道路分）の作成。

⑩ 国土交通省への要望資料（県管理道路分）の作成。

（3）情報連絡班

① 実施部への通行規制の指導。

② 災害および事故等交通状況に関する情報の把握。
（県管理道路のほか直轄道路、各高速道路(株)所管道路、市町道の情報集約を含む）

③ 災害復旧計画および交通確保計画に関すること。

④ 除雪状況・交通状況の広報。

⑤ 実施部への道路情報板掲示の指導。

⑥ 県管理道路以外の除雪状況の把握。

⑦ 災害広報資料の収集。

⑧　交通管理者との連絡調整。
⑨　「福井県冬期道路情報連絡室」との連絡調整。

2）実施部事務局（各土木事務所等）

（1）企画班

①　除雪計画書の立案、作成。
②　除雪作業の指示。
③　情報報告、資料の収集記録。
④　除雪日誌の作成。
⑤　保有除雪車両の管理、除雪車両の借り上げ、調達に関すること。
⑥　他機関との連携に関すること。
⑦　災害状況の取りまとめ。

（2）情報連絡班

①　通行規制に関すること。
②　除雪状況、事故等交通状況の収集、連絡、報告および広報。
③　道路情報板への掲示。
④　県管理道路以外の除雪および交通状況の把握、報告。
⑤　交通管理者との連絡調整。
⑥　対策本部への災害状況報告。

（3）機動班

①　道路パトロールに関すること。
②　降積雪、凍結状況・除雪状況の調査、報告。
③　除雪・排雪作業、凍結防止剤散布作業の指導。
④　道路上における支障物件の処理等緊急作業に関すること。
⑤　除雪パトロール日誌の作成。
⑥　災害状況の調査、報告。

（4）庶務班

①　除雪経理に関すること。
②　超勤手続き、食料調達、衣服の貸与、宿泊手続き、職員の健康管理に関すること。
③　各班の連絡調整。
④　対策本部事務局との連絡調整。
⑤　その他、他の係の職務に属さない事項。

3）総務部（土木部政策推進 G）

（1）総務班

①　災害関係費（除雪費含む）の予算措置に関すること。
②　国土交通省視察団、調査団の受入および要望資料の取りまとめ。
③　国土交通省、各高速道路(株)への要望および要望資料の取りまとめ。
④　部内および関係機関等との連絡調整の総括に関すること。

４）調整部（道路建設課、高規格道路課）

（１）調整班

① 国土交通省福井河川国道事務所、各高速道路(株)、市町との連絡調整。

② 国土交通省視察団、調査団の要望資料（直轄道路分）の作成。

③ 国土交通省（直轄道路分）および各高速道路(株)への要望資料の作成。

④ 市町道の被害情報収集。

⑤ 市町に対する国土交通省等への要望に関する指導。

⑥ 広域迂回発生時の県外道路に関する連絡調整。

５）関係課

（１）河川課

① 河川施設に関する道路雪害状況の把握

② その他（積雪に伴う河川施設の被害状況の把握）

（２）砂防防災課

① 災害に関する国土交通省等への連絡調整

② 砂防施設に起因する道路雪害状況の把握

③ その他（積雪に伴う砂防施設の被害状況の把握）

（３）都市計画課

① 都市施設に関する道路雪害状況の把握

② その他（積雪に伴う各関係施設の被害状況の把握）

（４）港湾空港課、建築住宅課、公共建築課

① その他（積雪に伴う各関係施設の被害状況の把握）

（５）土木管理課

① その他（資器材の調達、他の課の職務に属さない事項）

資料2

除 雪 情 報 連 絡 系 統 図



※ 除雪情報連絡系統は順不同です。

資料３

「福井県冬期道路情報連絡室」概要

１．福井県冬期道路情報連絡室の目的

福井県内の主要幹線道路において、大雪により交通事故や立ち往生等が発生し、大規模な交通障害の発生が懸念される場合に、国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所、福井県、福井県警察本部、中日本高速道路(株)金沢支社、西日本高速道路(株)関西支社、福井地方気象台、自衛隊福井地方協力本部の各機関が協力して道路交通の確保を図る。

福井県冬期道路情報連絡室（以下、情報連絡室という。）において検討する対象区間は以下の路線とする。

① 大雪警報時

道路管理者	対　象　路　線（大雪警報発表による以下①②のとおり区分けする）	
	①　嶺北北部・南部、奥越、嶺南東部へ発表	②　嶺南西部へ発表
福井河川国道事務所	国　道：8 号 国　道：158 号 E67 中部縦貫自動車道 福井北 JCT･IC～九頭竜 IC 国　道：161 号	国　道：27 号
福井県土木部	国　道：157 号、158 号、305 号、364 号 365 号、416 号、476 号 県　道：福井加賀線、福井金津線 金津インター線、牛ノ谷停車場線 武生美山線 越前・河野しおかぜライン	国　道：162 号、303 号
あわら市	フルーツライン（広域農道）	
中日本高速道路(株)	高速道路：E8 北陸自動車道	高速道路：E27 舞鶴若狭自動車道
西日本高速道路(株)	なし	高速道路：E27 舞鶴若狭自動車道

２．情報連絡室の役割

情報連絡室は、各機関が協力して道路交通の確保を図ることを目的とし、次の事業を行う。

（１）各機関が収集する降雪状況と気象予測の情報共有に関すること。

（２）通行規制、路面状況、交通状況、の情報共有に関すること。


（３）広報（需要抑制、広域迂回、通行規制予告等）に関すること。

（４）通行止め予定区間、除雪体制等の共有、相互除雪支援体制、広域通行止めに関すること。

（５）滞留者等への支援について、近畿地方整備局現地対策本部との調整に関すること。

（６）その他、本連絡室の目的を達成するために必要な事項。

３．情報連絡室の体制

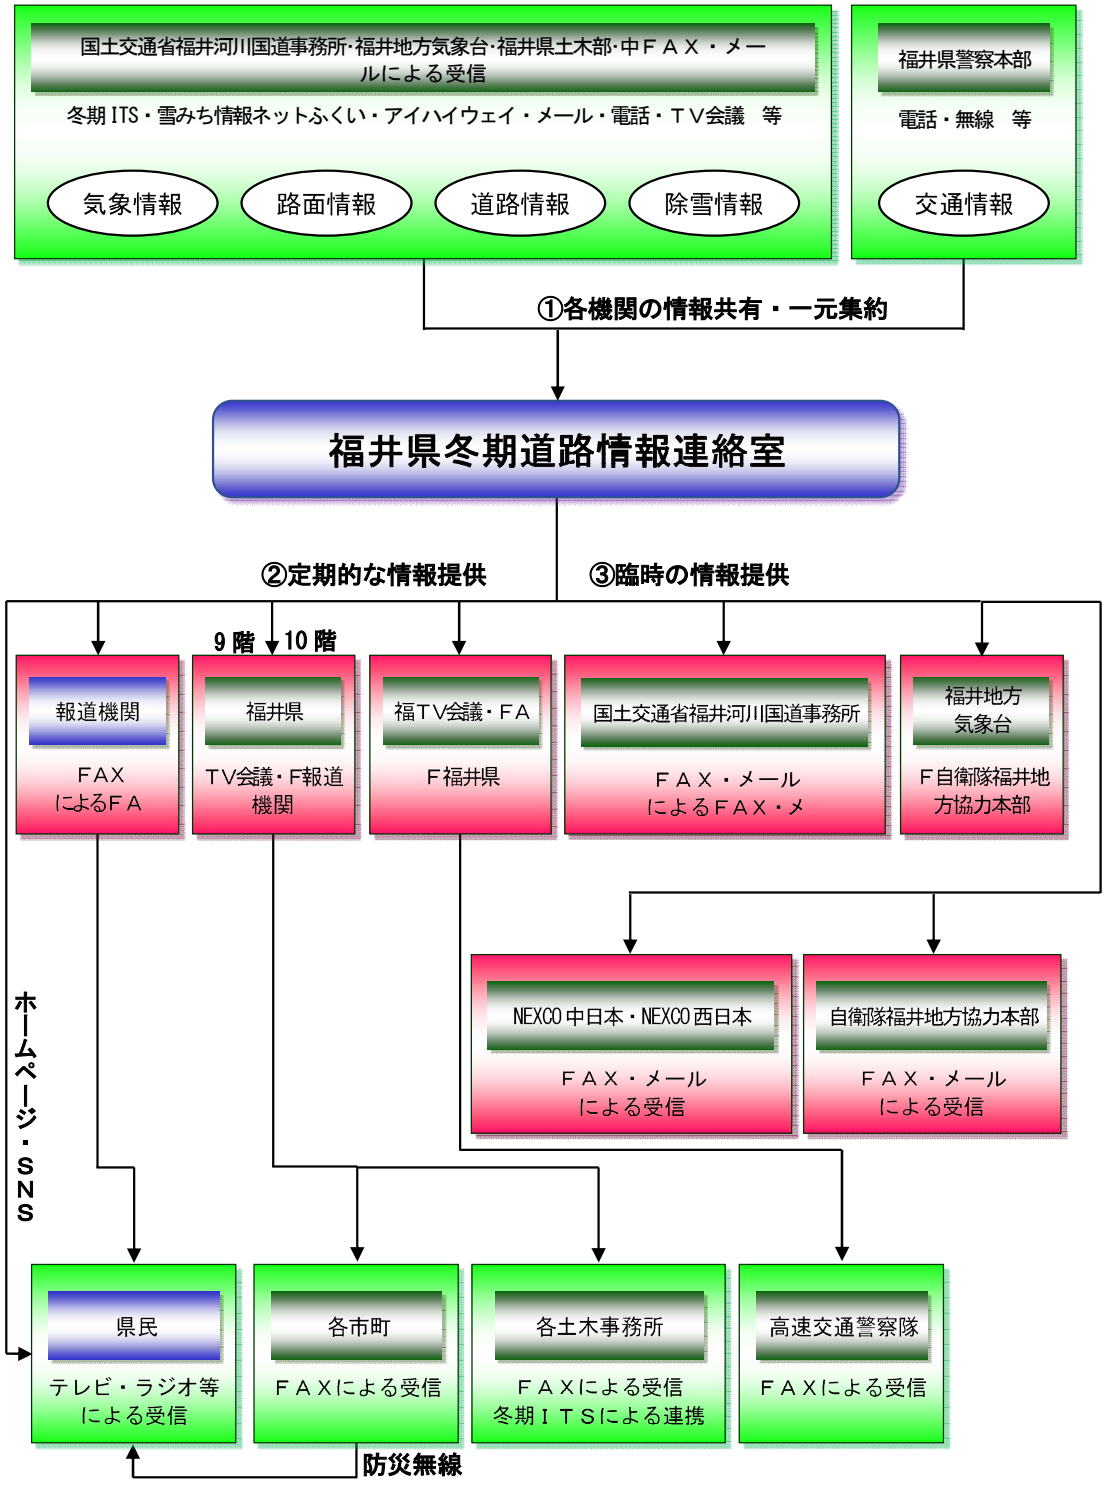

４．情報連絡室の開設

記録的な豪雪被害や大規模な交通障害が想定されるなど必要と判断した場合、連絡室を開設する。

５．構成機関一覧

機関	担当部・課
国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所	道路管理課
福井県	土木部 道路保全課 防災安全部 危機管理課
福井県警察本部	交通規制課
中日本高速道路(株)金沢支社	（開設時）道路管制センター （通常時）企画統括課
西日本高速道路(株)関西支社 福知山高速道路事務所	保全計画課
福井地方気象台	観測予報担当
自衛隊 福井地方協力本部	

６．開設場所

情報連絡室は、国土交通省近畿地方整備局福井河川国道事務所に開設する。

資料４

「福井県冬期道路情報連絡会」概要

１．目的

大雪により主要幹線道路で交通事故や除雪障害が発生し、大規模な交通障害発生が懸念される場合に、福井県除雪対策実施部（各土木事務所等）と管内市町が連携して道路交通の確保を図る。

２．情報連絡会の役割

① 各管理者の情報の共有・一元集約

・各道路管理者が収集している情報を面的に集約し、共有する

・迂回路は、路面・交通・気象状況などを確認し、適宜判断して設定する

② 報道機関等への情報提供・発信

・報道機関等へ県内の情報を迅速且つ一元的に発信する

３．情報連絡会の開設

寒波の到来前に各機関が連携して、道路交通の確保等を図るよう、速やかに情報連絡会の開設有無を判断し、その準備を行う。

４．開設の判断基準

以下の内容に該当する場合、情報連絡会を開設する。

- 大雪による注意報・警報・特別警報の発令または気象予報により異常降雪が見込まれる場合
- 福井地方気象台より寒波の到来が予想された場合

５．開設フロー

上記の開設基準に基づき、各実施部（各土木事務所等）の道路課長等が判断する。

６．構成機関一覧

機　　関	担当部・課
福井県除雪対策実施部（各土木事務所等）	道路課等（課長・GL）
管内各市町	除雪担当部局（課長・係長等）

７．開設場所

情報連絡会は、各実施部（各土木事務所等）の道路課長等が開設場所を指定する。

資料５

福井県道路管理情報システム概要

福井県道路管理情報システム（FRIS）は、福井県および関係機関（国交省、県警、NEXCO等）の道路状況や除雪状況を集約することで、刻々と変化する雪害状況をリアルタイムに把握し、道路管理者の迅速かつ効率的な除雪作業を支援するとともに、公開サイト「みち情報ネットふくい」(裏表紙参照)によって、県民に向けた道路状況を発信します。

トップページ

通行規制や除雪車位置、カメラなど全ての現況を地図上で確認




カメラ画像

福井県警、国交省、NEXCOとのﾃﾞｰﾀ連携により道路・河川カメラを集約




除雪車輌位置(GPS)

除雪車輌に設置されたGPSにより現在位置と走行軌跡を表示

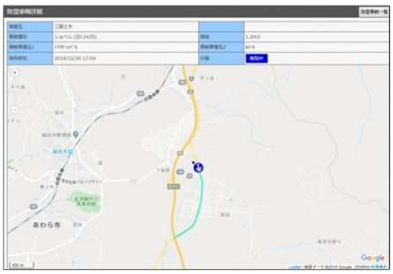


通行規制情報

福井県警、国交省、NEXCOとのﾃﾞｰﾀ連携により県内全ての規制情報を網羅

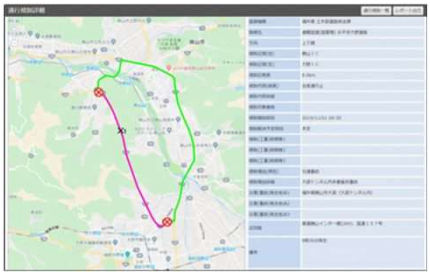

現場写真

ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｻｲﾄから登録された現場写真

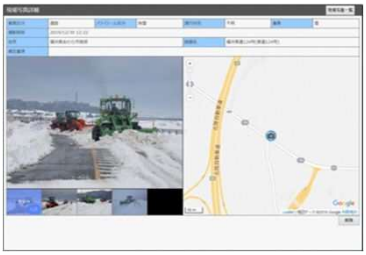

スマートフォンサイト

災害現場やパトロールで、内部システムと同等な閲覧が可能




メール通報

トンネル内で事故等が発生し押しボタンを押した場合や、非常警報設備が故障した場合に管理者へメール通報



積雪・気温グラフ

国交省、気象庁の気象情報を集約



令和８年度　道路雪対策について

〔計画期間：令和８年１１月６日～令和９年３月３１日〕

【ポイント】

■国土交通省・ＮＥＸＣＯ

○舞若道における通行止めの早期解除のため、ロータリ車およびトラクターショベルを増強

○交通処理対策として、エアー遮断機を活用した迅速な通行規制および高速道路の中央分離帯開口部を改良

■県・市町

○除雪機械の増強、除雪基地の移転、最重点除雪路線の拡充など除雪体制を強化

○上位路線通行止め時に、交通混雑や車両滞留を防ぐ目的で通行止めを行う可能性がある県管理道路を事前公表

Ⅰ．北陸自動車道・国道８号・中部縦貫自動車道等に関すること

１．主要幹線道路の雪対策の強化

北陸自動車道、国道８号等において、令和３年１月の大雪を踏まえたこれまでの対策に加え、除雪機械や道路カメラ増強を実施

路線名	区間	除雪機械			道路カメラ（基）			消雪施設等(km)			スタック車排除機械(台)			車両待避スペース(箇所)			チェーン着脱場(箇所)		
		H29	H30～R7	R8	H29	H30～R7	R8	H29	H30～R7	R8	H29	H30～R7	R8	H29	H30～R7	R8	H29	H30～R7	R8
北陸自動車道	加賀 IC～木之本 IC	14 梯団	17 梯団（3 増）応援 15 梯団	⇒ 同	99	202（103 増）	⇒ 同	5.3	12.5（7.2 増）	⇒ 同	10	16（6 増）	⇒ 同	各 SA・PA	⇒ 同	⇒ 同	24	⇒ 同	⇒ 同
国道８号	除雪優先 区間①（加賀市熊坂～坂井市丸岡町羽崎）	9 台	19 台(10 増)応援配備 17 台（皆増）	⇒ 同	11	31(20 増)	⇒ 同	3.5	4.7（1.2 増）	⇒ 同	－	6（皆増）	⇒ 同	4	9（5 増）	⇒ 同	－	5（皆増）	⇒ 同
	除雪優先 区間②（越前市塚原～敦賀市岡山）	17 台	21 台(4 増)	⇒ 同	41	56(15 増)	⇒ 同	16.2	17.0（0.8 増）	⇒ 同	2	4（2 増）	⇒ 同	2	⇒ 同	⇒ 同	1	2（1 増）	⇒ 同
中部縦貫自動車道	福井北 IC～九頭竜 IC	6 台	17 台(11 増)	⇒ 同	22	77（55 増）	⇒ 同	9.1	11.7（2.6 増）	⇒ 同	－	4（皆増）	⇒ 同	－	－	－	－	7（皆増）	⇒ 同

※ １梯団は原則３台の除雪車で編成される

〔北陸自動車道の対策（NEXCO）〕

□滞留車両を早期救出するため中央分離帯開口部を改良(20 箇所→21 箇所)

□エアー遮断機の整備による通行止め作業の迅速化（6 箇所→9 箇所）

□大雪時のＥＶ立ち往生を想定した可搬式充電器を用いた充電訓練の実施

〔舞鶴若狭自動車道の対策（NEXCO）〕

□ ロータリ車 2 台、小型トラクターショベル 3 台を増強

□ 隣接事務所の応援による集中除雪強化

□エアー遮断機の整備による通行止め作業の迅速化（1 箇所→6 箇所）

□ 通行止め端末ＩＣにおいてＵターン処理を実施（北陸道同様）

□ 中央分離帯ワイヤーロープを取外してのスタック車等対応の実地訓練

□ WEB カメラ（ウェアラブルカメラ）を巡回車両や除雪機械に設置し、路面状況確認を迅速化（北陸道同様）

〔国道８号等の対策（国土交通省）〕

□ 集中的な大雪時に通行規制して行う「除雪優先区間」を設定

□ 短期間の集中的な大雪に備え、監視カメラ（247 基）による監視を実施

□ AI 技術を活用した交通障害自動検知システムを運用（対応カメラ 76 基：過去にスタックが発生した箇所を中心に運用）

□ 過去にスタックが頻発した箇所において、ロードヒーティングを整備

□ スタック発生時などの対応車両として EV バイクを配備

□ 中部縦貫道にエアー遮断機を整備

□ 通行止め時の規制資材として可搬式標識を配備

□ 車載式塩分濃度計測システムの試験運用を実施

２．関係機関との連携強化〔国、NEXCO 等との連携〕

大雪時、国を主体とした「福井県冬期道路情報連絡室」を設置し、気象予測や各道路管理者の除雪状況等の情報共有、石川県等隣県における除雪状況などの把握、災害対策本部や市町との連携を推進

No.	項目	H30～R5	R6～R8
「福井県冬期道路情報連絡室」		① 過年度の予防的通行止めを踏まえたタイムラインの見直し ② 広範囲の予防的通行止めを実施する際には、関係機関の幹部が参加する連絡室合同調整会議を開催し、調整	①社会的影響を考慮し、各地点における降雪予測に応じて必要最小限の範囲を通行止め（R7～） ②同左
1	情報共有・連携	①広報の共有（ＳＮＳやＬアラートなど多様な手段を活用） ②近畿地整の現地対策本部との調整による滞留者等への支援 ③予防的通行止めに備えＵターン場所や広域迂回地点を設定 ④道路情報板等の連携・活用による交通誘導を実施 ⑤Teams を活用し、リアルタイムで市町等との情報共有を実施 ⑥近隣県と連携した県外への広域迂回等の呼びかけを強化、予防的同時通行止めを想定した除雪体制を構築	①～⑥同左 ⑦広域迂回ルートについて、広域情報板での情報発信など管轄エリアを超えた広域的な広報を実施（R6～） ⑧大雪が予想される際は、道路管理者と気象台による記者会見を実施し、出控え要請や予防的通行止の広報を実施（R6～）
2	合同訓練の実施	図上訓練（R2.11.24、R3.11.11、R4.11.11、R5.11.15 実施） 現地対応訓練（R2.11.11、R3.11.11、R4.11.11、R5.11.15 実施）	現地対応訓練（R6.11.20、R7.11.18 実施、R8.11.18 予定）

Ⅱ．県、市町管理道路に関すること

３．事前排雪・集中除雪体制の強化〔除排雪機械力の増強〕

排雪場の増設等による除排雪作業の効率化、担い手の確保・育成による地域防災力の強化を図るとともに、大雪に備えた広域応援の円滑な受援体制を構築

No.		項目	H30～R2	R3～R7	R8
増強	1	除雪機械台数	632 台 【 車道 526 台、歩道 106 台】	646 台　（14 台増） 【 車道 545 台(19 台増)、歩道 101 台（5 台減)】	650 台（4 台増） 【 車道 557 台(12 台増)、歩道 93 台（8 台減)】
	2	排雪場の増設	77 箇所	93 箇所　（16 箇所増）	93 箇所　（R7 同）
	3	消雪施設の増設	352km	371km　（19km 増）	373km　（2km 増）
効率化	4	除排雪機械（車道）にＧＰＳを装備し、位置情報を把握	・526 台(皆増)	・545 台　（19 台増）	・557 台　（12 台増）
	5	除雪業者の担当区間や除排雪機械の配備を見直し	・除雪契約業者　205 社（7 社増） ・嶺北北部の平野部にロータリ除雪車を配備	・除雪契約業者　207 社（2 社増）	・除雪契約業者　204 社（3 社減）
	6	大雪時の緊急待避所・一次堆雪所の設定	・アピタ大和田店、ピアゴ丸岡店、県立図書館、福井新聞社（民間企業等と協定締結）（計 4 箇所）	・サンドーム福井、福井県産業会館、道の駅越前たけふ、きらめきスタジアム、コメリパワー武生店、ムゼウム前駐車場を追加　（計 10 箇所）	・（計 10 箇所）（R7 同）
担い手確保	7	除雪オペレータ	・除雪機械運転技術講習会（国・県）年 2 回実施 待機中の賃金や休日割増賃金の見直し	・除雪オペレータの免許取得等の費用補助実施 （R3：135 名、R4：79 名、R5：55 名、R6：41 名、R7：44 名）	・同左 56 名（R8.10 時点）
広域応援	8	受け入れ体制の構築	―	・広域応援の円滑な受け入れ体制を事前に構築	・同左

４．最重点除雪路線の見直しや重点除雪路線の設定〔公共交通や物流関連路線の除雪を強化〕

大雪時の影響を最小限にとどめるため、バス路線や物流拠点等へのアクセス道路を重点除雪路線に設定し、除雪機械の応援を受け入れるなど市町と連携して重点的・効率的に除雪を実施

No.		項目	H30～R2	R3～R7	R8
除雪延長			車道　1,854km、歩道 286km	車道　1,866km（12 km増）、歩道 270km（16km 減）	車道　1,869km（3km 増）、歩道 266km（4km 減）
強化	1	最重点除雪路線	・最重点除雪路線 439km（県） ・最重点除雪路線 69km（市）	・最重点除雪路線 464km（県）（25 km増） ・最重点除雪路線 88km（市町）（19 km増）	・最重点除雪路線 463km（県）（1km 減） ・最重点除雪路線 88km（市町）（R7 同）
	2	除雪作業	・交通規制を伴う集中除雪（昼間除雪を含む）、 大雪予報に基づく事前排雪	・同左	・同左
市町連携	1	重点除雪路線	―	・重点除雪路線 617km（県：419km、市町：198km）（皆増）	・重点除雪路線 624km（県：426km、市町：198km）（6km 増）
	2	代替除雪路線	市町道 → 県　83km 県道　→ 市町 71km	市町道 → 県　104km（21km 増） 県道　→ 市町 91km（20km 増）	市町道 → 県　104km（R7 同） 県道　→ 市町　91km（R7 同）
	3	一斉除雪路線	359km	・360km（1km 増）	・同左
	4	市町の除雪機械（車道）にＧＰＳを装備	―	・17 市町（県内市町すべてに導入） →市町の幹線道路の除雪状況を併せて公開	・　みち情報ネットふくいで除雪状況を表示する敦賀市道 9 路線を 30 路線に増加（21 路線増）。

５．情報発信の強化〔県民の協力を得て除雪を効率化〕

県内・県外の企業への広域迂回や配送計画の見直し要請、県民への出控え要請など、渋滞やスタックにより除雪作業の効率が低下しないよう情報発信を強化

No.	項目	H30～R2	R3～R7	R8
1	道路状況確認カメラによる画像提供	・193 箇所 福井県 155 箇所、国交省など 38 箇所	・356 箇所（163 箇所増） 福井県 213 箇所、国交省など 143 箇所 ・みち情報ネットふくい上で除雪状況を表示（見える化） ・みち情報ネットふくいのスマホ対応および交通状況表示 ・市町道カメラの共有（鯖江市、南越前町、越前町、高浜町）	・　357 箇所（1 箇所増） 福井県 214 箇所 NEXCO・国・市町など　143 箇所（R7 同） ・市町道カメラの共有（鯖江市、南越前町、越前町、高浜町）
2	広報・注意喚起の強化	①みち情報ネットふくいによる道路情報の発信強化 ②多様な広報媒体を利用して、出控え、食料・燃料の 備蓄などを県民に呼びかけ ③冬用タイヤ装着率調査（R2.12.7）	①～③同左 ④県内企業や周辺府県の物流業者等に対し、広域迂回ルートの広報および配送計画見直しや出控え等を繰り返し要請 ⑤日本道路情報センターと連携し、ラジオ・テレビ等で福井県の通行止め情報や大雪情報を関西・中京・北陸圏に周知	・同左
3	ＤＸ技術の活用	・ＡＩを活用した音声による自動対応サービスによる道路情報案内（県管理道路）	・ＡＩを活用した音声による自動対応サービスによる道路情報案内の本格運用 ・除雪作業支援システムの実証実験、本格導入を実施 ・大雪時に、コネクティッドカーのデータを活用した路面凸凹情報の提供 ・５Ｇタブレットを活用した除雪状況等の情報発信、現場対応の迅速化（消雪施設の制御にも対応）	・同左

最重点・重点除雪路線網図


資料７

平成二十九年五月作成

高規格道路網図







凡例

- 最重点除雪路線
- 重点除雪路線
- 北陸自動車道 舞鶴若狭自動車道
- 国道8号・27号・161号 中部縦貫自動車道

福井県土木部道路建設課

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（空間データ基盤）、数値地図250mメッシュ（標高）及び数値地図50mを使用した。（承認番号　平27情使、第1684号）

みち情報ネットふくい

福井県のホームページにて、県内の道路状況画像や通行規制情報を提供しています。

冬期間は、除雪状況や路面温度、積雪観測などの情報が確認できます。冬の道路は、転倒、スリップ事故など事前の心構えが大切です。

お出かけ前にインターネットができるパソコンや携帯電話にてご確認ください。

○ 提供期間 ： 令和８年１１月６日 ～ 令和９年３月３１日（冬期バージョン）

○ ＵＲＬ ： https://www.hozen.pref.fukui.lg.jp/hozen/yuki/　QRコード→





スマートフォン対応

除雪に関する問い合わせ先

除雪担当事務所（課）	連絡先	担当市町
福井土木事務所道路第一課	0776(24)5111	福井市、永平寺町
三国土木事務所道路課	0776(82)1111	あわら市、坂井市
奥越土木事務所道路課	0779(66)1221	大野市、勝山市
丹南土木事務所道路課	0778(23)4966	越前市、南越前町、池田町
丹南土木事務所 鯖江丹生土木部道路課	0778(34)0464	鯖江市、越前町
敦賀土木事務所道路課	0770(22)4661	敦賀市、美浜町、若狭町(旧三方町)
小浜土木事務所道路課	0770(56)2103	若狭町(旧上中町)、小浜市、おおい町、高浜町

〒910-8580　福井県福井市大手3丁目17番1号
福井県土木部　道路保全課 雪・安全対策グループ
TEL　：0776(20)0514　FAX ： 0776(20)0478
E-mail：dourohoz@pref.fukui.lg.jp



ふくい SDGs
