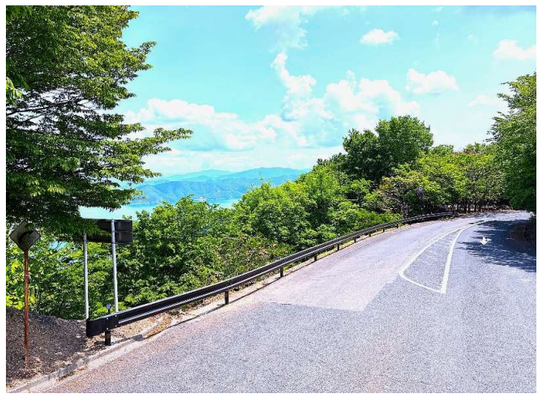
令和８年度 福井県優良工事 小浜土木事務所長表彰 受賞者

工　事　名	河川・路線名	工事場所	事業者	全景写真	評価内容（工夫や特筆すべき効果等）
交通安全施設補修工事 宇久他6単-17工事	一般県道 泊小浜停車場線	小浜市宇久 他	(株)光陽		本工事は、一般県道 泊小浜停車場線（エンゼルライン）の防護柵交換工事である。観光道路であるため、行楽シーズンを避ける必要があり、さら標高が高いため雪解けが遅く、施工期間の制約が厳しいうえに、施工範囲が約5kmに及ぶ工事であった。1日当たりの施工量を増やす必要があり、バックホウに特殊アタッチメントを付けて支柱設置を行う等の工夫をこらしたことで工期内完成を実現した。また、地域貢献として、落葉や法面から流出した土砂により埋塞した側溝を清掃することで、観光道路の安全性維持にも貢献した。
道路改良工事 難波江7-2工事	主要地方道 舞鶴野原港高浜線	大飯郡高浜町難波江	(株)セイコウ		本工事は、主要地方道 舞鶴野原港高浜線のバイパス工事として、切土および小段排水工の整備を行った。県のエネルギー課が推奨する「SDGSパートナー」登録制度に登録し、燃料使用料を前年度から5%削減するなど、実効性のある環境対策に取り組んだ。地域貢献としては、工事で発生した伐木を薪として地元の希望者に配布した。また、ICTの内製化により、3次元起工測量、3次元設計データの作成、ICT建機の操作、出来形管理といった一連のプロセスを、外部業者に頼らず自社の技術者だけで完結させた。
橋梁下部工事 城内6-3工事	一般国道　１６２号	小浜市城内1丁目	(株)フクセン、 (株)アシュワ、 橋梁下部工事 城内6-3工事 特定JV		本工事は、国道162号の3橋同時架替え事業における城内橋の橋脚工事である。河口からの距離が約500mしかなく、塩害の影響を強く受ける環境であるため、温度応力解析に基づくセメント種類の変更や補強鉄筋の追加を行い、クラックの防止および耐久性の向上を図った。また、土工時の濁水対策として、沈殿ピット3基とシルトフェンスを設置し、濁水の流出を防止した。地域貢献としては、近隣小学校の伐木や駐車場、通学路となる仮設歩道橋の除雪、インターンシップの受入れを行った。
