令和８年度 優良工事 福井県嶺南振興局長賞

全　景




【施工業者　株式会社 アシュワ】
工 事 名　令和６年度　森林基幹道開設工事
（農山漁村地域整備交付金）若狭遠敷線２工区
施工場所　小浜市 下根来
工事概要　橋梁下部工（１号橋）
工　　期　令和6年5月31日～令和7年11月28日
請負金額　82,472,570円

《事業概要》
若狭遠敷線は、小浜市下根来とおおい町名田庄の森林地帯を結び、林業の生産基盤となる全体計画　L=19.8kmの森林基幹道開設工事です。

施工性の向上

コンクリート温度解析

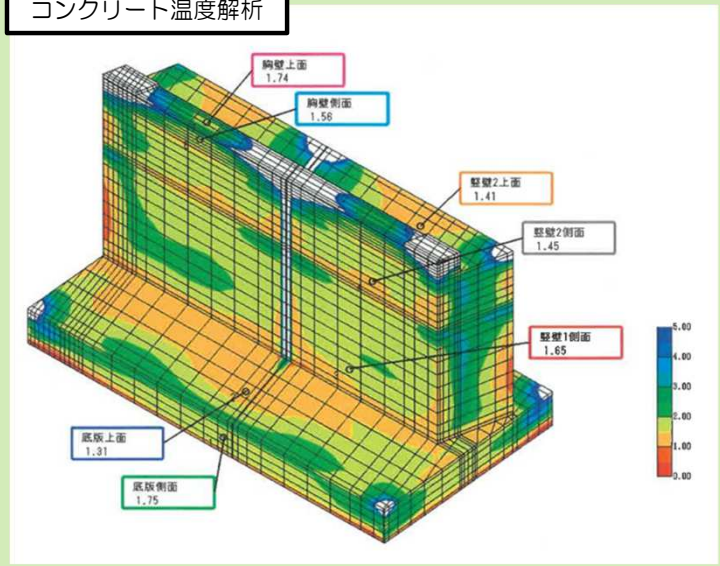

コンクリート温度解析を行い、補強鉄筋や誘発目地を設置することでひび割れ防止対策を図った。

誘発目地設置



補強鉄筋設置



施工性の向上



活力魅力ある建設業向けて、現場見学会やインターンシップ受け入れを実施し、担い手の確保および技術の向上を図った。

環境への配慮



河川内で既設橋撤去工事を実施するにあたり、希少生物の有無を調査するこことともに生物の保護活動を行い、生態系の保護に努めた。
