令和８年度 優良工事 福井県嶺南振興局長賞

全　景



掘削状況




【施工業者　八峯建設 株式会社】
工 事 名　令和６年度　森林基幹道開設工事
（農山漁村地域整備交付金）若狭遠敷線４工区
施工場所　大飯郡おおい町名田庄木谷
工事概要　切土工（高所無人掘削機）884m³
法面保護工（防草マルチング）1,278.0m²
工　　期　令和6年11月29日～令和7年8月29日
請負金額　37,200,000円

《事業概要》
若狭遠敷線は、小浜市下根来とおおい町名田庄の森林地帯を結び、林業の生産基盤となる全体計画　L=19.8kmの森林基幹道開設工事です。

施工性の向上

３次元測量データ

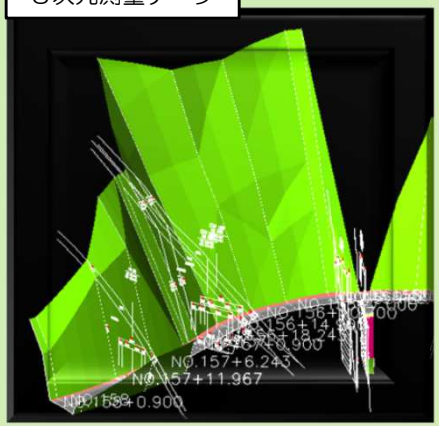

自動追尾式トータルステーション



3次元測量データを作成し、自動追尾式トータルステーションで測量、施工管理、出来形管理を行い施工性の向上を図った。

安全性の向上

地山点検



土砂崩れ感知センサー



地山掘削点検の徹底や土砂崩れ感知センサーを設置し、安全性の向上を図った。
